


Option R : basilaire est, tour face par face, basilaires sud, nord et ouest ; durées du plan clé placées dans la fenêtre de travail GLCRM

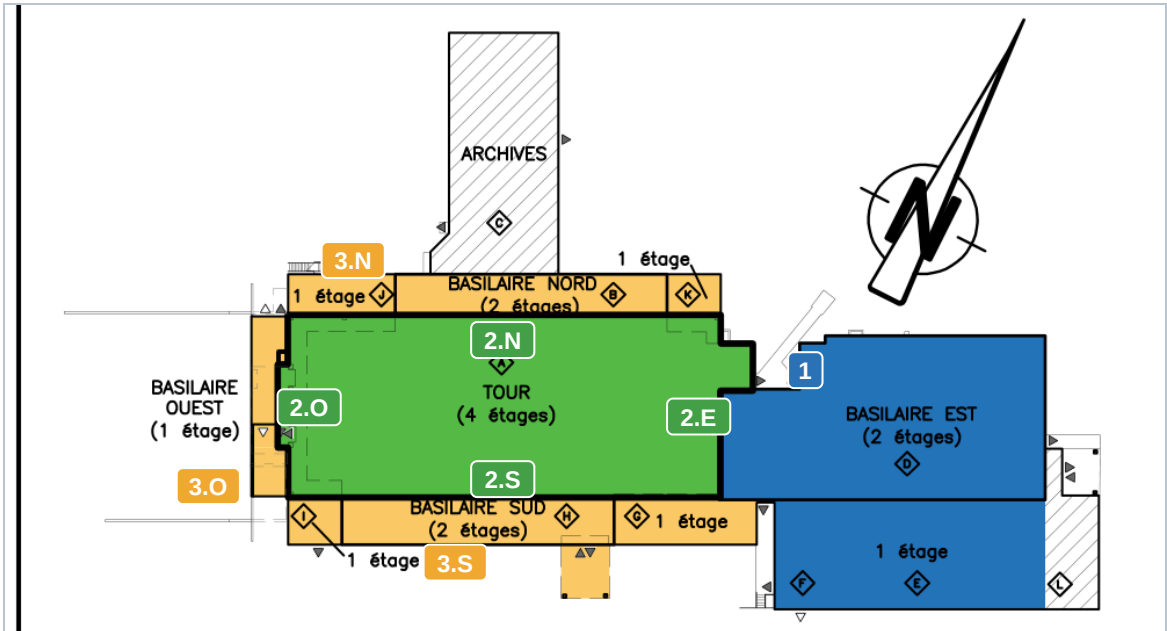

Plan clé de la feuille 010, couleurs des architectes. Pastilles : sous-phases par face proposées [choix].

Le plan en une page

Ce que propose ce plan. L'ordre est celui du plan clé des architectes — basilaire est, tour, basilaires nord, ouest et sud —, retenu comme option de référence dans le cahier en plan. Ce plan y ajoute ce qui manquait : un calendrier dans la période de travail GLCRM, les zones de chantier et les clôtures phase par phase, et, pour chaque phase, les murs travaillés avec les appareils qu'il faut couper, déplacer ou maintenir.

D'où viennent les dates. Aucun document ne fixe de durée. Les durées sont celles qu'indique le plan clé (±5, ±8 et ±4 mois) ; la fenêtre est celle de GLCRM — installation en novembre 2026, travaux de janvier 2027 à décembre 2028 — et la période estivale va du 24 juin au 15 août. Tout ce qui est daté sur ce cahier est donc un [choix], à confirmer avec le CISSS.

Ce qui place les phases. Huit lignes du tableau de WSP sont bornées par une saison. L'enchaînement proposé les fait toutes tomber du bon côté de l'été, sauf une dont le sens est à trancher (O-B-V-004). Il impose en contrepartie environ sept mois de travaux d'enveloppe sous enceintes chauffées : c'est inévitable, puisque 17 mois de travaux doivent tenir dans une fenêtre qui ne compte que 12 mois hors de novembre à avril.



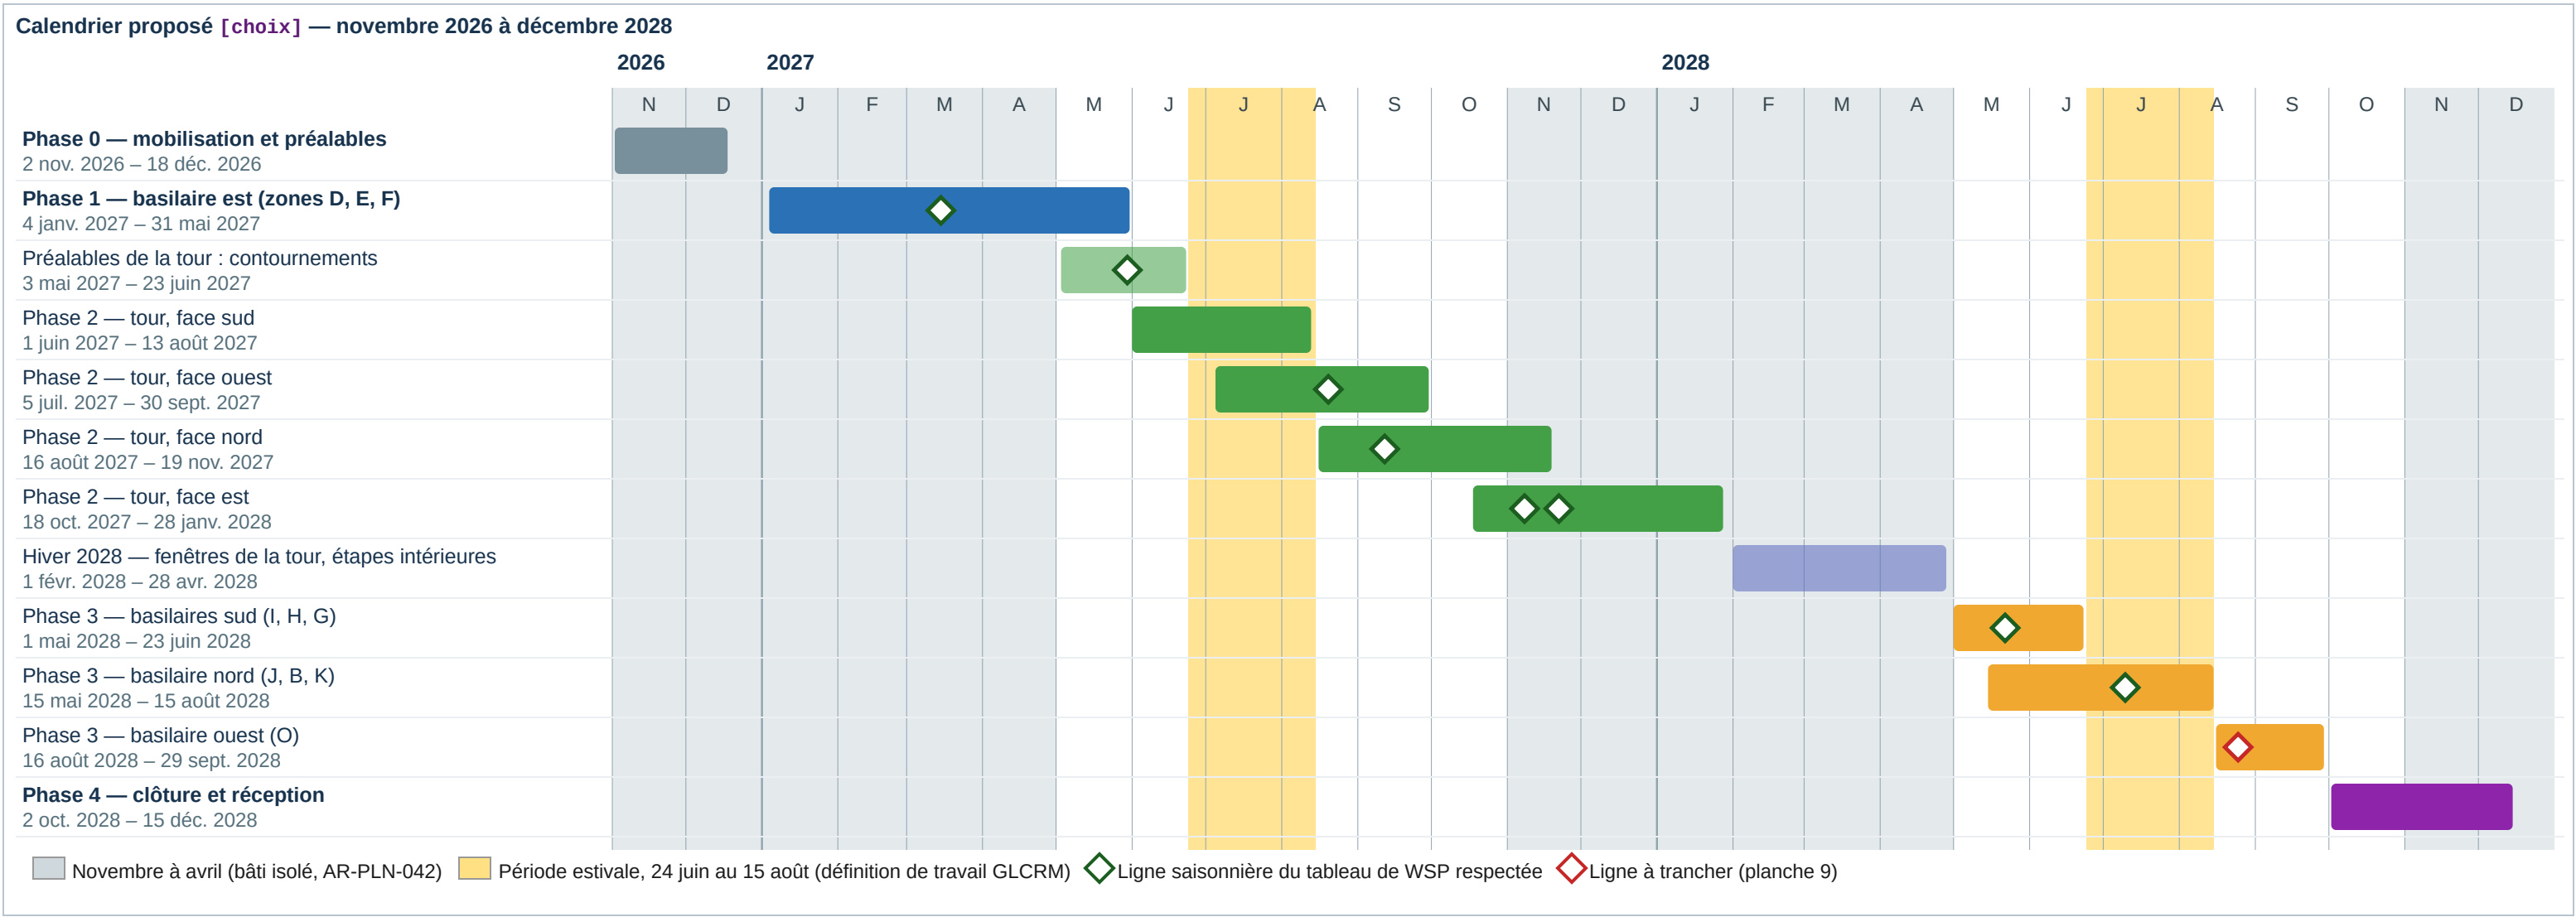


Planche 2 / 9 — Les phases sur les quatre élévations


Chaque façade est partagée entre deux ou trois phases ; bandes reportées depuis le plan clé, axe par axe

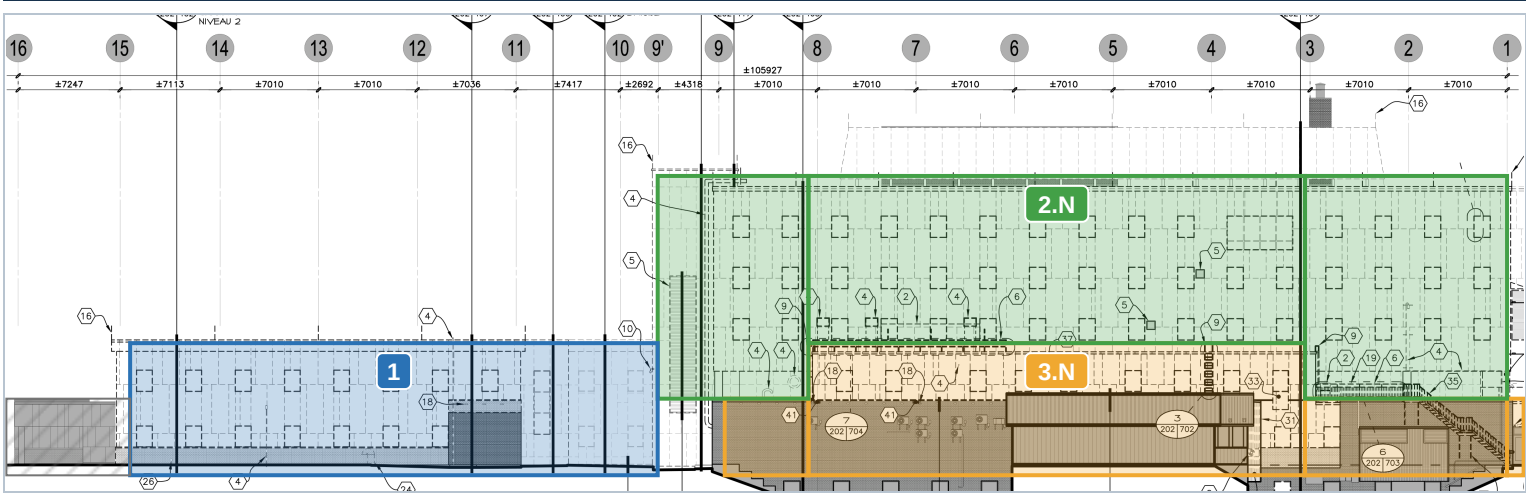


Élévation nord (F) — l'est à gauche, l'ouest à droite.

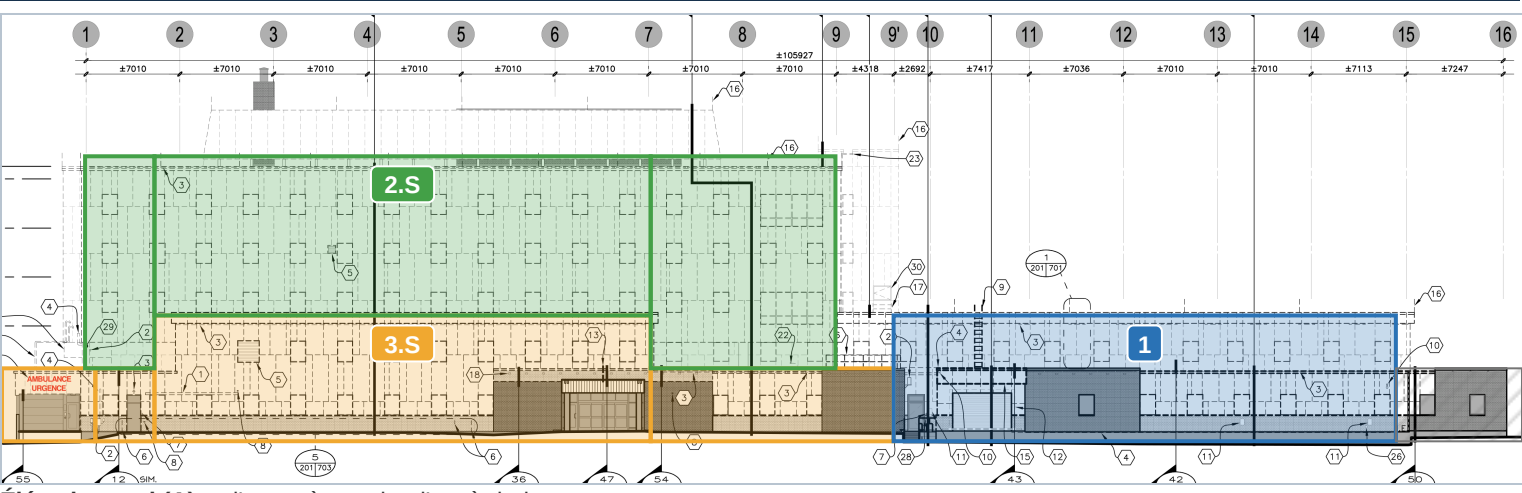

Élévation sud (A) — l'ouest à gauche, l'est à droite.

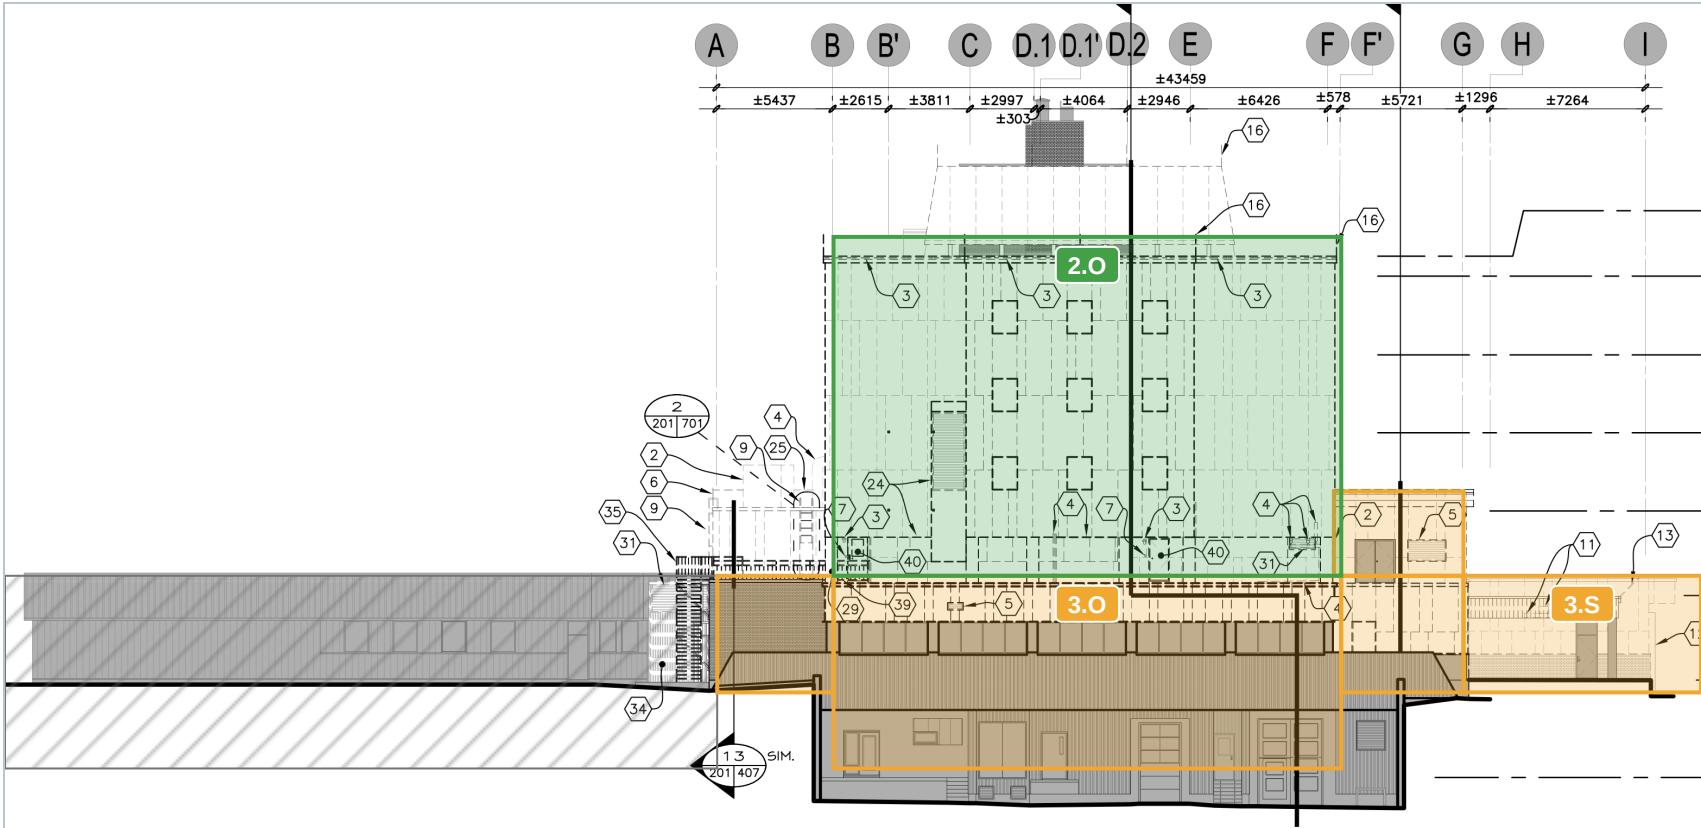

Élévation ouest (B) — le nord à gauche, le sud à droite.

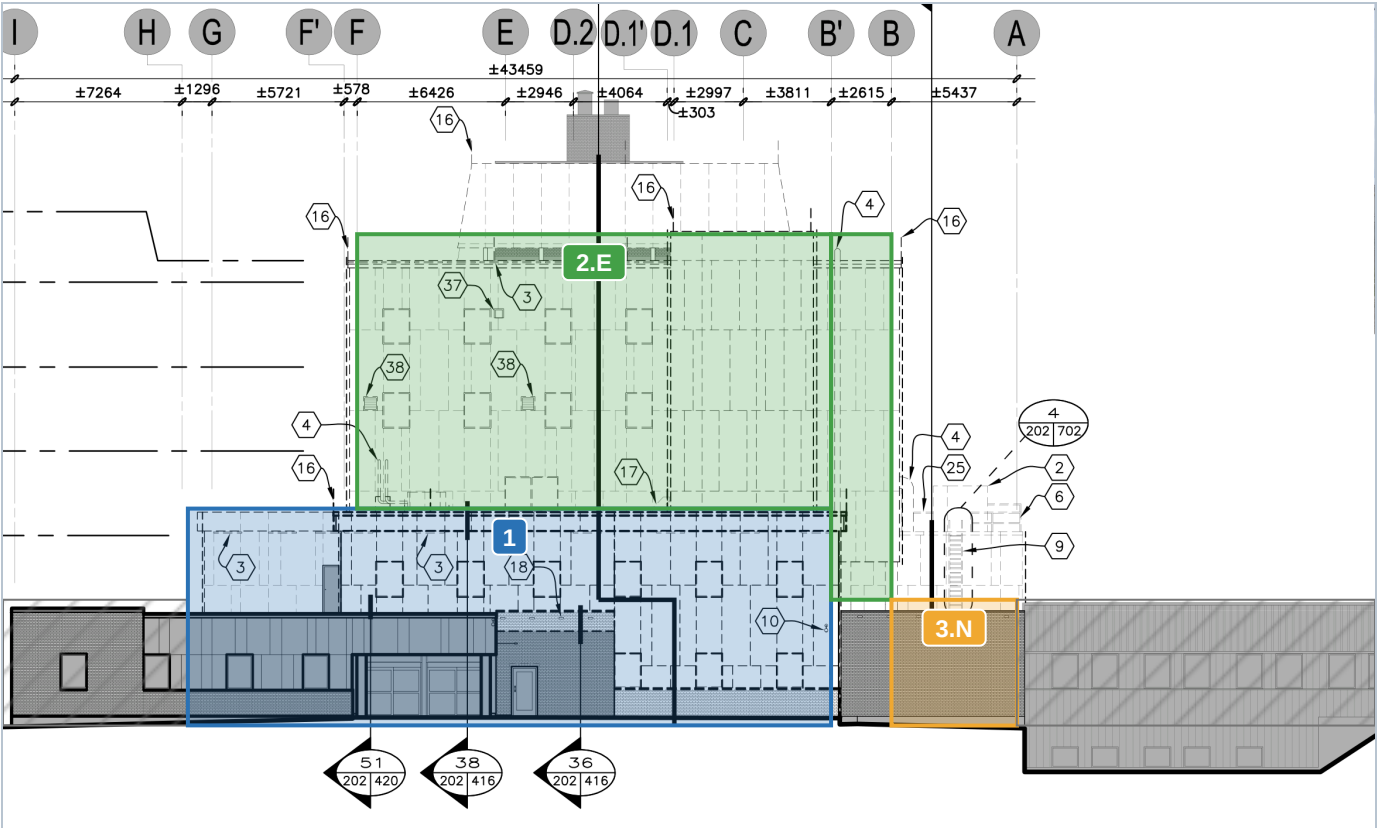

Élévation est (G) — le sud à gauche, le nord à droite.

Les phases reportées sur les élévations
[lecture]

Comment lire. Les élévations de la feuille 011 ne portent pas de couleurs de phase ; seul le plan clé en porte. Les bandes ci-dessus reportent chaque zone du plan clé sur les quatre élévations, axe par axe : c'est une [lecture], à faire confirmer par les architectes. La tour est verte au-dessus des toits des basilaires ; chaque basilaire prend la couleur de sa phase jusqu'à son parapet.

Ce que le report fait voir. Chaque façade est partagée entre deux ou trois phases. La façade nord, par exemple, est travaillée en phase 1 à l'est (basilaire est), en phase 2 en hauteur (tour) et en phase 3 au pied de la tour (laboratoire et garage des ambulances). C'est pourquoi le conflit saisonnier de la façade nord se règle de lui-même dans l'option R : ses trois lignes saisonnières tombent dans trois phases différentes.

Les élévations partielles. Le tableau de WSP code l'orientation du mur, pas sa place dans le bâtiment. Les appareils de l'élévation partielle C (roulotte d'IRM mobile) sont sur le mur ouest du volume de l'IRM, et ceux de l'élévation I (porte de l'escalier no 6) sur le mur ouest de la cour nord-est : ils appartiennent tous les deux au basilaire est, donc à la phase 1, même s'ils sont codés « ouest ».

Phase 1

Phase 2 (tour)



Phase 3

Non touché

Plan de phasage complet, option R — document de travail ; dates [choix] à confirmer



À obtenir avant janvier 2027. Confirmation des dates et de la période estivale ; régime PCI applicable à Chandler (C-01) ; plage horaire de travail (Z-01) ; approbation du calendrier d'exécution et du calendrier d'arrêt des installations (AR-DEV-026, AR-DEV-032) ; ascenseur no 1 et escalier désigné (CI-TAB-002).

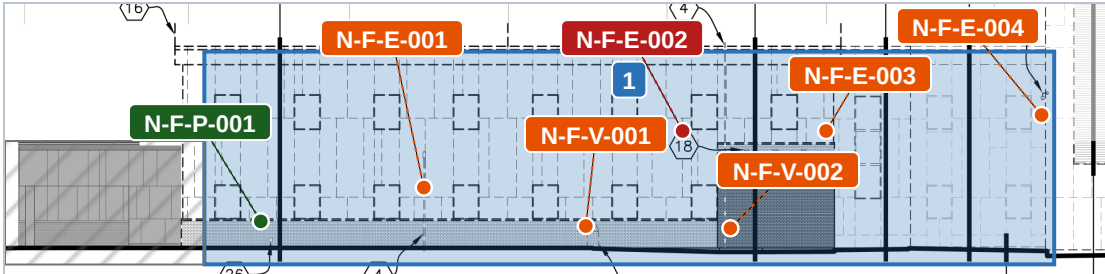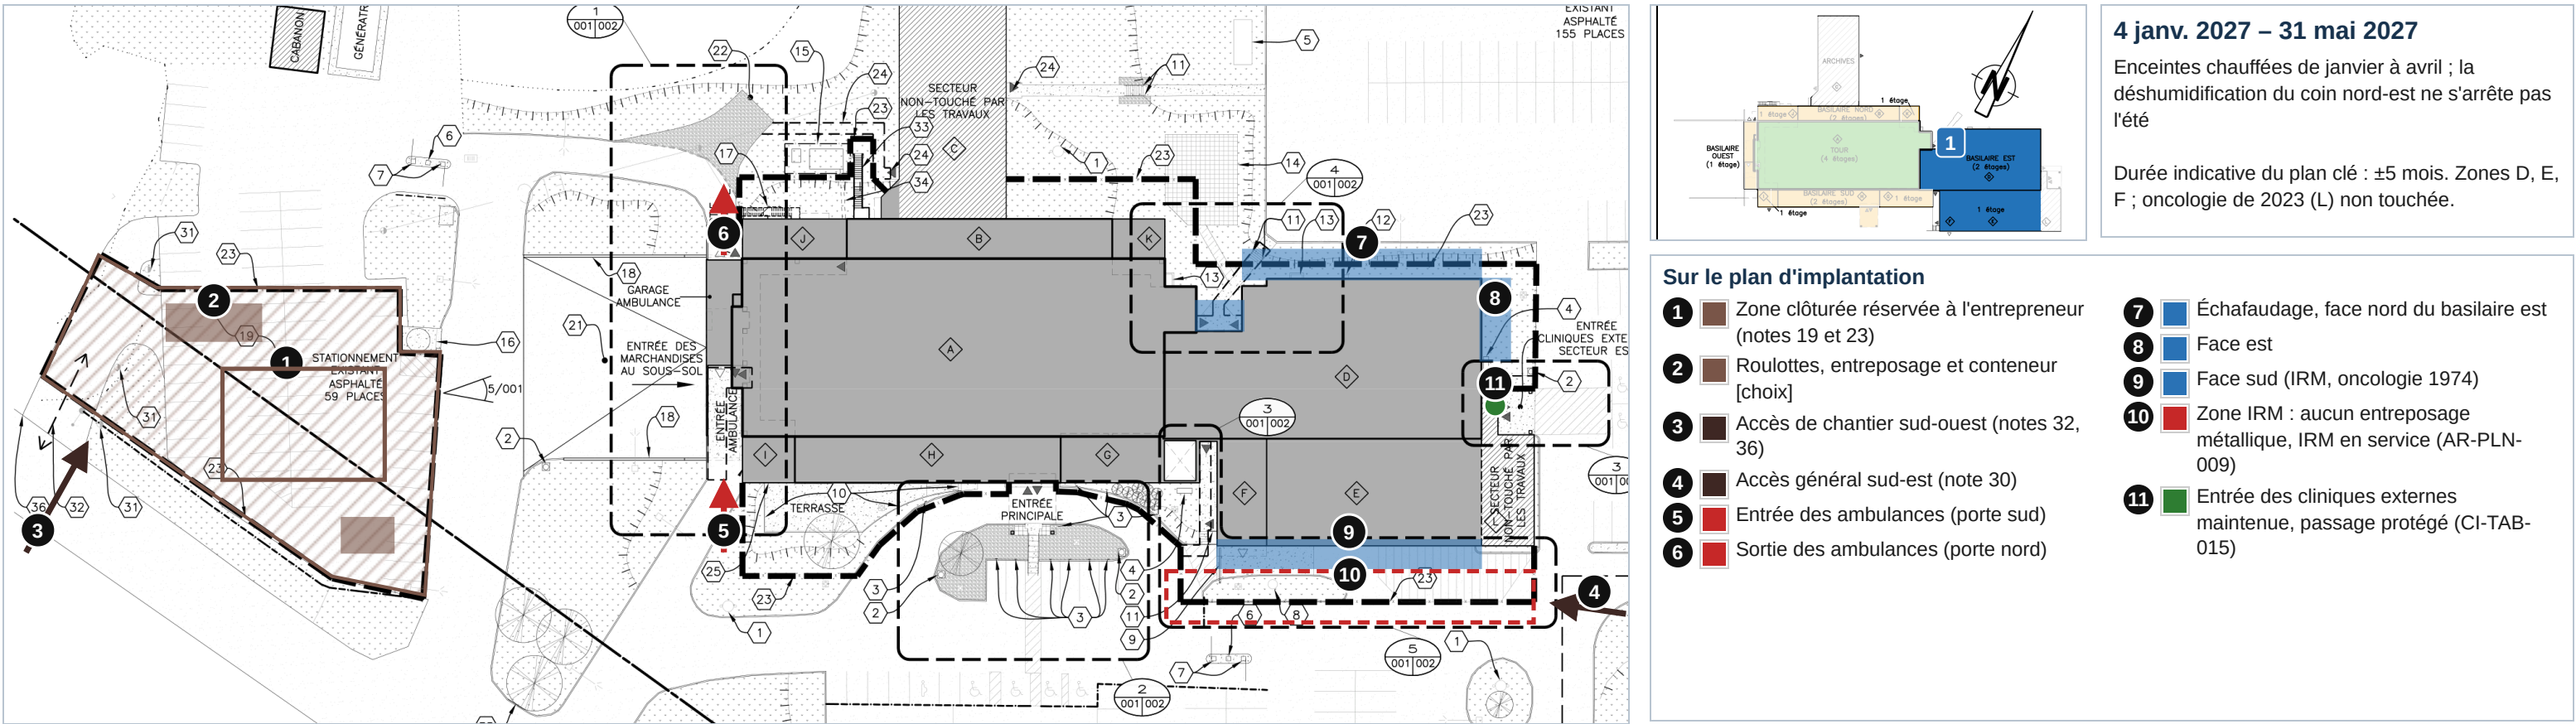

28 appareils rattachés à cette période : 20 interrompus, 4 déplacés, 2 maintenus sans interruption, 2 retirés. Sur les élévations partielles, non dessinés ici : O-I-E-001, O-I-E-002, O-C-E-003, O-C-V-001, O-C-E-004, O-C-E-002, O-C-E-001. Sans repère sur les dessins : N-F-P-002.

- Interrompus (20) : N-F-P-002, N-F-E-001, N-F-V-001, N-F-E-003, N-F-V-002, N-F-E-004, E-G-E-002, E-G-E-003, E-G-E-004, E-G-E-005, S-A-E-024, S-A-E-019, S-A-E-016, S-A-E-018, S-A-P-001, S-A-E-023, O-I-E-001, O-I-E-002, O-C-E-003, O-C-E-002

●
Retirés (2) : N-F-E-002, S-A-E-022

●
Déplacés puis réinstallés (4) : S-A-E-020, S-A-V-004, O-C-V-001, O-C-E-001



●
Maintenus sans interruption (2) : N-F-P-001, O-C-E-004

Le basilaire est — administration et cliniques externes (D), oncologie de 1974 (E), IRM (F) — sur ses faces nord, est et sud ; l'oncologie de 2023 (L) n'est pas touchée. Fenêtres en trois étapes au rez-de-chaussée en blocs, en deux pour l'IRM et le niveau 100 (AR-PLN-047, AR-PLN-048) ; prototype en début de phase (AR-PLN-050) ; volets coupe-feu des locaux R16, R34 et R36 (ME-109, ME-110) ; renforts de colonnes dans l'entreplafond du local R-22, après relocalisation des conduits électriques (ME-108, ME-111).

Avant de démolir. La roulotte d'IRM mobile reste servie quand elle est en place : ses raccords sont enlevés puis remis au même endroit et les persiennes de son échangeur réinstallées après le revêtement (O-C-E-001, O-C-V-001). Le bandeau lumineux de la façade est est déposé avec son conduit (E-G-E-002 à 004) : la longueur du tronçon attaqué d'un coup fixe l'étendue laissée sans éclairage la nuit. La caméra du coin de l'escalier no 3 est relocalisée en gardant son champ (N-F-E-004). La sortie d'arrosage du coin nord-est est un verrou inverse : l'architecture doit lui livrer une alcôve (N-F-P-001).

Coupures. La déshumidification du coin nord-est peut s'arrêter sauf l'été (N-F-P-002) : la phase tombe de janvier à mai. L'évacuation de l'atelier de menuiserie est arrêtée pendant les travaux du secteur (N-F-V-002). Les lampadaires du stationnement sont remis en fonction tous les soirs (N-F-E-001). Les portes de l'escalier no 4 et de l'escalier no 6 perdent leur lecteur pendant le secteur (S-A-E-019, O-I-E-002) : plan d'action pour les issues avant de commencer (AR-PLN-011).

Chantier et PCI. Enceintes chauffées de janvier à avril (10 °C dans les zones de travaux, AR-DEV-144 ; béton à 10 °C ou plus, ST-034). Entrée des cliniques externes maintenue avec un passage protégé (CI-TAB-015). Aucun entreposage métallique dans la zone de l'IRM quand l'appareil est en service (AR-PLN-009). Classes écrites au tableau du CISSS : plexiglas classe I, thermos et cadrage II ou III, volets IV, local R-22 IV « J/S » (CI-TAB-006 à 010) — sous réserve du régime PCI (C-02).

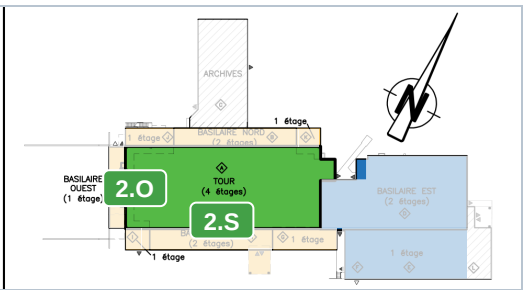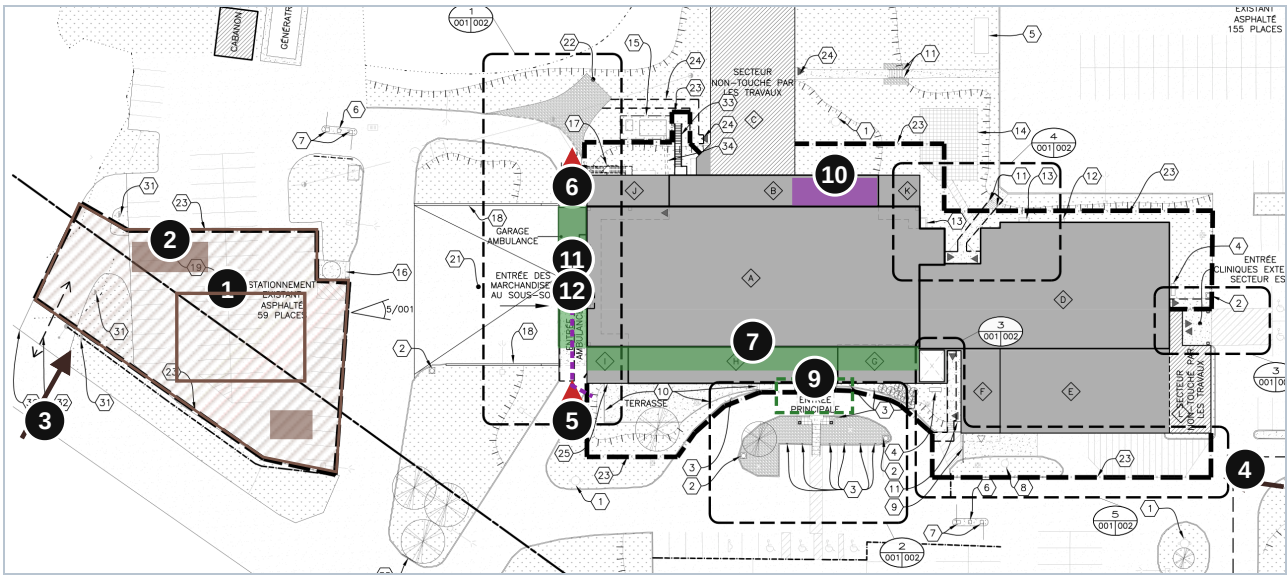

Contournements de la tour
 3 mai 2027 – 23 juin 2027

Face sud
 1 juin 2027 – 13 août 2027

Face ouest
 5 juil. 2027 – 30 sept. 2027

Sur le plan d'implantation

- 1** Zone clôturée réservée à l'entrepreneur (notes 19 et 23)

2 Roulotte, entreposage et conteneur [choix]

3 Accès de chantier sud-ouest (notes 32, 36)

4 Accès général sud-est (note 30)

5 Entrée des ambulances (porte sud)
- 6** Sortie des ambulances (porte nord)

7 Échafaudage, face sud de la tour, sur la toiture du basilaire [lecture]

8 Échafaudage, face ouest, sur la toiture du garage [lecture]

9 Passage abrité à l'entrée principale (AR-DEV-191) [choix]
- 10** Hémodialyse (bassin 16) : conduits temporaires, passerelle enlevée


11 Conduits temporaires 2 × 900 × 900 du bloc opératoire

12 Événements des autoclaves : tuyauterie temporaire en toiture (ME-075)



Élévation sud, axes 1 à 9

16 appareils rattachés à cette période : 8 déplacés, 8 interrompus.

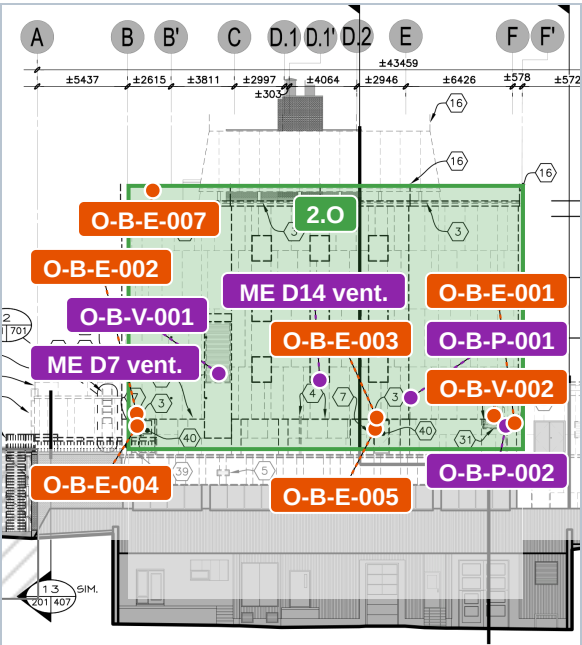

Ouest, axes A à F'

Ligne	Appareil	Fenêtre écrite
—	Événements de vapeur de l'autoclave (2x)	—
—	Thermostat des câbles chauffants	—
S-A-V-003	Persienne RAV P-14, chambre 307	Toute
S-A-E-015	Bandeau lumineux, tour, sous parapet	Toute la durée des travaux
—	Unité de vent. de l'hémodialyse et passerelle	—
O-B-E-002	Luminaire, porte labo. [à confirmer]	Toute la durée des travaux
O-B-E-004	Lecteur de carte, porte labo. [à confirmer]	Toute la durée des travaux
O-B-E-007	Bandeau lumineux sous parapet, tour ouest	Toute la durée des travaux
O-B-V-001	Conduit PAF du bloc opératoire, en surface	Nuit ou week- end À valider si garde ...
—	Conduits PAF temporaires, bloc opératoire	—
O-B-E-005	Lecteur de carte, bloc op. [à confirmer]	Toute la durée des travaux



... et 5 autres : voir le cahier de phasage par élévation.

Mai à juin 2027 : les contournements de la tour. Trois installations temporaires doivent être en place avant le premier travail sur la tour : les conduits temporaires de l'unité d'hémodialyse, posés le dimanche et avant le 24 juin (ME-049 à 051) ; les deux conduits de 900 × 900 mm qui gardent le bloc opératoire alimenté (ME-042, ME-043, ME-047) ; et la relocalisation des événements des autoclaves, de nuit ou avant 10 h, « avant le début des travaux de la façade ouest » (ME-075, ME-077). Dans l'option R, ce début est la face ouest de la tour, en juillet 2027 : les événements restent donc sur leurs supports temporaires en toiture pendant quinze mois, jusqu'à leur réinstallation à la fin de la phase 3 (ME-076).

Face sud, juin à août. La chambre à pression négative 307 n'est démantelée qu'inoccupée, avec un conduit prolongé hors des échafaudages (S-A-V-003, ME-056). L'entrée principale est sous cette face : un passage abrité est à prévoir sous l'échafaudage (AR-DEV-191) [choix].
Face ouest, juillet à septembre. Le revêtement se refait derrière le conduit existant du bloc opératoire une fois les temporaires en service (O-B-V-001). Le thermostat des câbles chauffants tombe hors de l'hiver, comme l'exige sa ligne (O-B-E-001). Les portes du laboratoire et du bloc opératoire perdent luminaire et lecteur pendant le secteur (O-B-E-002 à 005).

Coupures. Hémodialyse : une journée, un conduit à la fois, le dimanche, hors été — d'où la pose des temporaires en mai-juin. Bloc opératoire : nuit ou fin de semaine, sous réserve des gardes (ME-048). Persienne de l'unité UT-2 : nuit ou fin de semaine. Autoclaves : nuit ou le matin avant 10 h.

Chantier. Les échafaudages de la tour s'appuient sur les toitures des basilaires [lecture] : attestation scellée, capacités des toitures respectées, aucune charge ponctuelle sur les toitures ventilées (ST-023 à 026). La voie des ambulances passe sous l'échafaudage de la face ouest : protection en surplomb [choix]. L'aire de levage n'est implantée sur aucun plan (Z-27) ; plan de levage cinq jours d'avance.

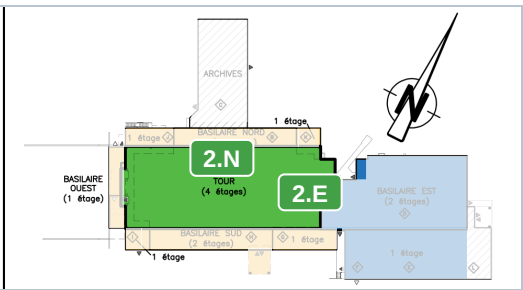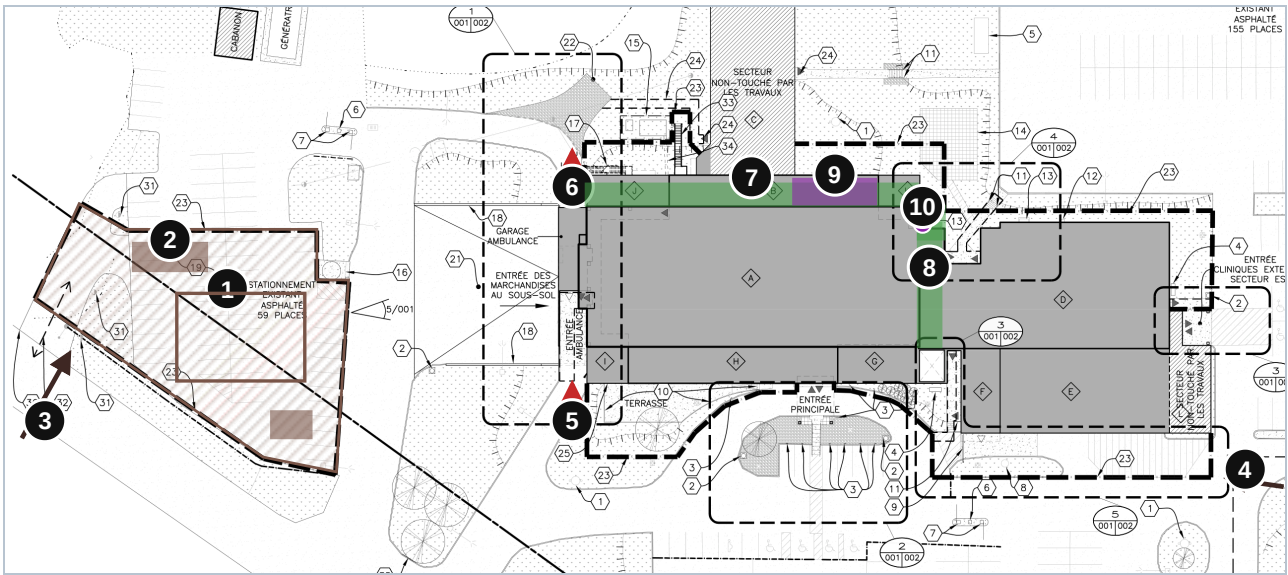

Face nord
 16 août 2027 – 19 nov. 2027
 Face est
 18 oct. 2027 – 28 janv. 2028
 Fenêtres de la tour par l'intérieur
 1 févr. 2028 – 28 avr. 2028

Sur le plan d'implantation

- 1

Zone clôturée réservée à l'entrepreneur (notes 19 et 23)
- 2

Roulottes, entreposage et conteneur [choix]
- 3

Accès de chantier sud-ouest (notes 32, 36)
- 4

Accès général sud-est (note 30)
- 5

Entrée des ambulances (porte sud)
- 6


Sortie des ambulances (porte nord)
- 7

Échafaudage, face nord de la tour, sur la toiture du basilaire [lecture]
- 8


Échafaudage, face est, sur la toiture du basilaire est [lecture]
- 9

Hémodialyse : rebranchement des conduits, passerelle réinstallée
- 10

Conduit de la hotte de médecine nucléaire (arrêt vendredi-dimanche)

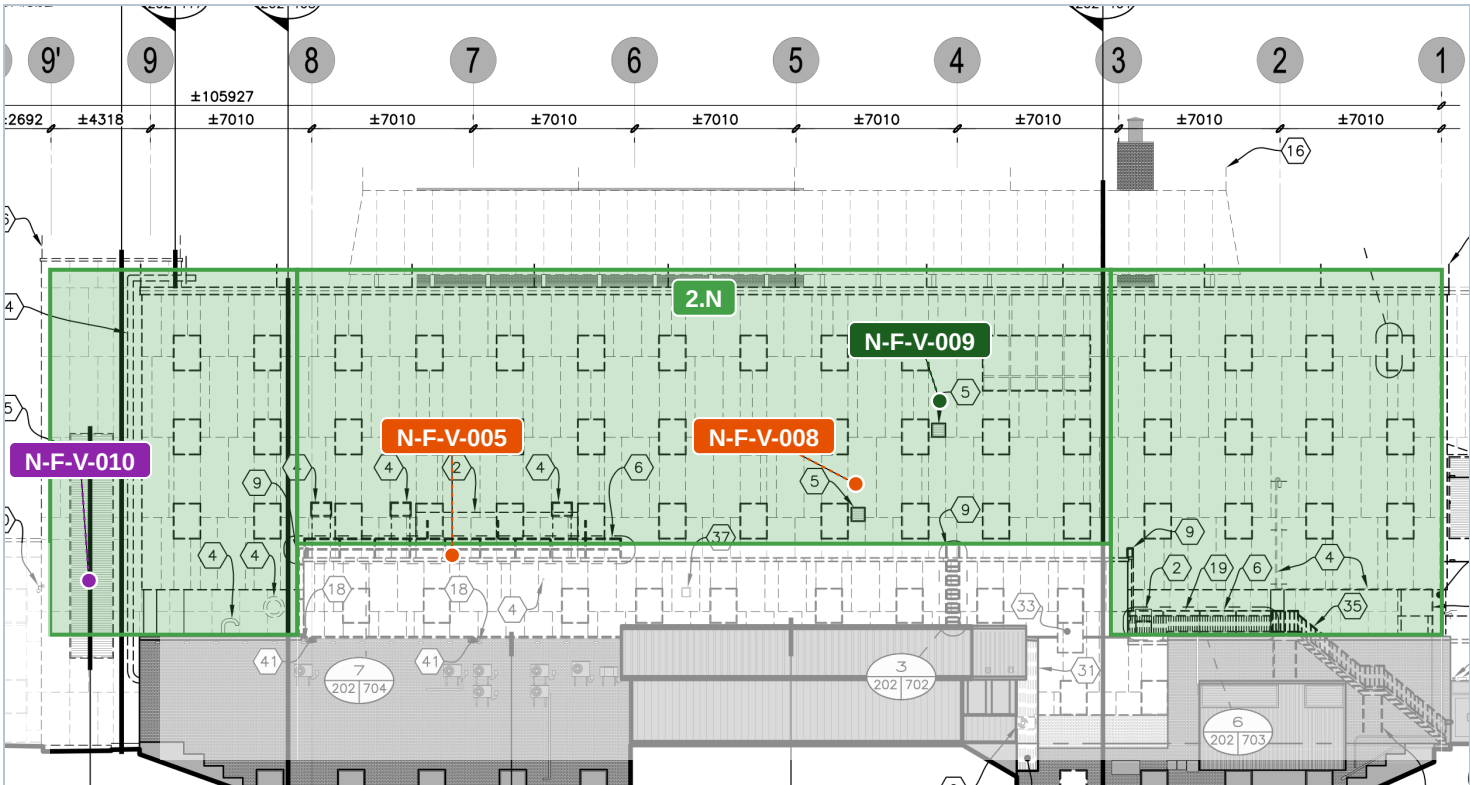

Élévation nord, axes 9 à 1

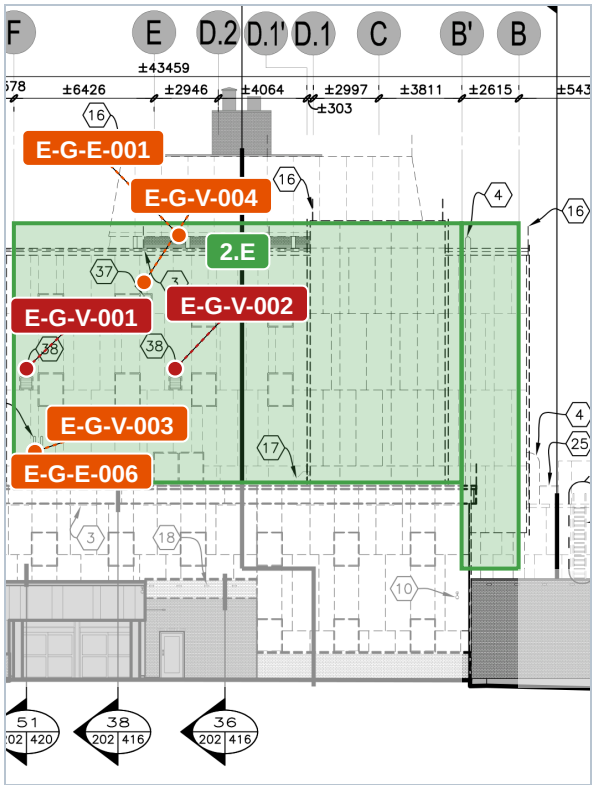

Élévation est, axes F à A

Ligne	Appareil	Fenêtre écrite
N-F-V-010	Persienne PAF P-05	?
N-F-V-005	Unité hémodialyse : 3 conduits + passerelle	Dimanche seulement, en dehors de la période ...
N-F-V-008	Persienne RAV P-06, chambre 216	Toute
N-F-V-009	Persienne PAF P-07, soins intensifs 315	Nuit/Jour si aucune chambre occupée
E-G-V-004	Capotin de la hotte de cuisine, salle communautaire	?
E-G-E-001	Luminaire linéaire sous parapet, tour est	Toute la durée des travaux
E-G-V-001	Persienne P-11 du fumoir, à démanteler	À enlever
E-G-V-002	Persienne P-12, usage non écrit	À enlever
E-H-V-001	Conduit de la hotte de médecine nucléaire	Vendredi au dimanche
E-G-V-003	Bi-bloc thermopompe, traitement d'eau 203	Semaine, en dehors de la période estivale



... et 3 autres : voir le cahier de phasage par élévation.

Face nord, 16 août à novembre 2027. Les conduits de l'hémodialyse sont rebranchés le dimanche, après le 15 août, puis la passerelle d'aluminium est réinstallée, modifiée (N-F-V-005 ; ME-050, ME-054). Le conduit de la chambre 216 est prolongé hors des échafaudages (N-F-V-008) ; la prise d'air des soins intensifs, chambre 315, ne se touche que la nuit ou le jour quand aucune chambre n'est occupée (N-F-V-009, ME-058).


Face est, mi-octobre 2027 à janvier 2028. Le conduit de la hotte de médecine nucléaire est modifié sur toute la hauteur, avec un arrêt du vendredi au dimanche (E-H-V-001 ; ME-118, ME-119). Les bi-blocs du traitement d'eau de l'hémodialyse et de la salle des serveurs se coupent en semaine, hors été, au même endroit : une seule fenêtre peut servir aux deux (E-G-V-003, E-G-E-006). La porte de l'escalier no 3, une issue, perd luminaire et lecteur pendant le secteur (E-H-E-001, E-H-E-002).

Hiver 2028, février à avril : les fenêtres de la tour par l'intérieur. Une fois les quatre faces refaites, les fenêtres se remplacent par l'intérieur derrière un bâti isolé, comme l'exigent les plans de novembre à avril (AR-PLN-042) ; thermos et finition le même jour que le retrait du plexiglas (AR-PLN-044). Le tableau du CISSS classe ces étapes III, horaire « J », aux niveaux 2, 3 et 4 (CI-TAB-024, 027, 029). Les fenêtres de la cage d'escalier no 3 sont obturées (feuille 504 ; Z-26).

Chantier. Enceintes chauffées sur l'échafaudage de la face est de novembre à janvier. Les persiennes P-11 et P-12 sont « à relocaliser » au tableau et « à démanteler complètement » sur le dessin : à faire trancher par WSP avant la face est.

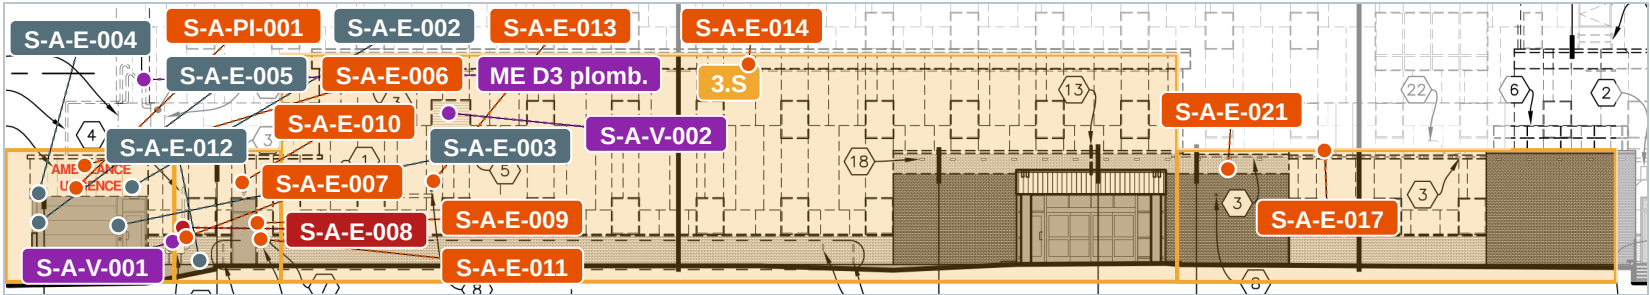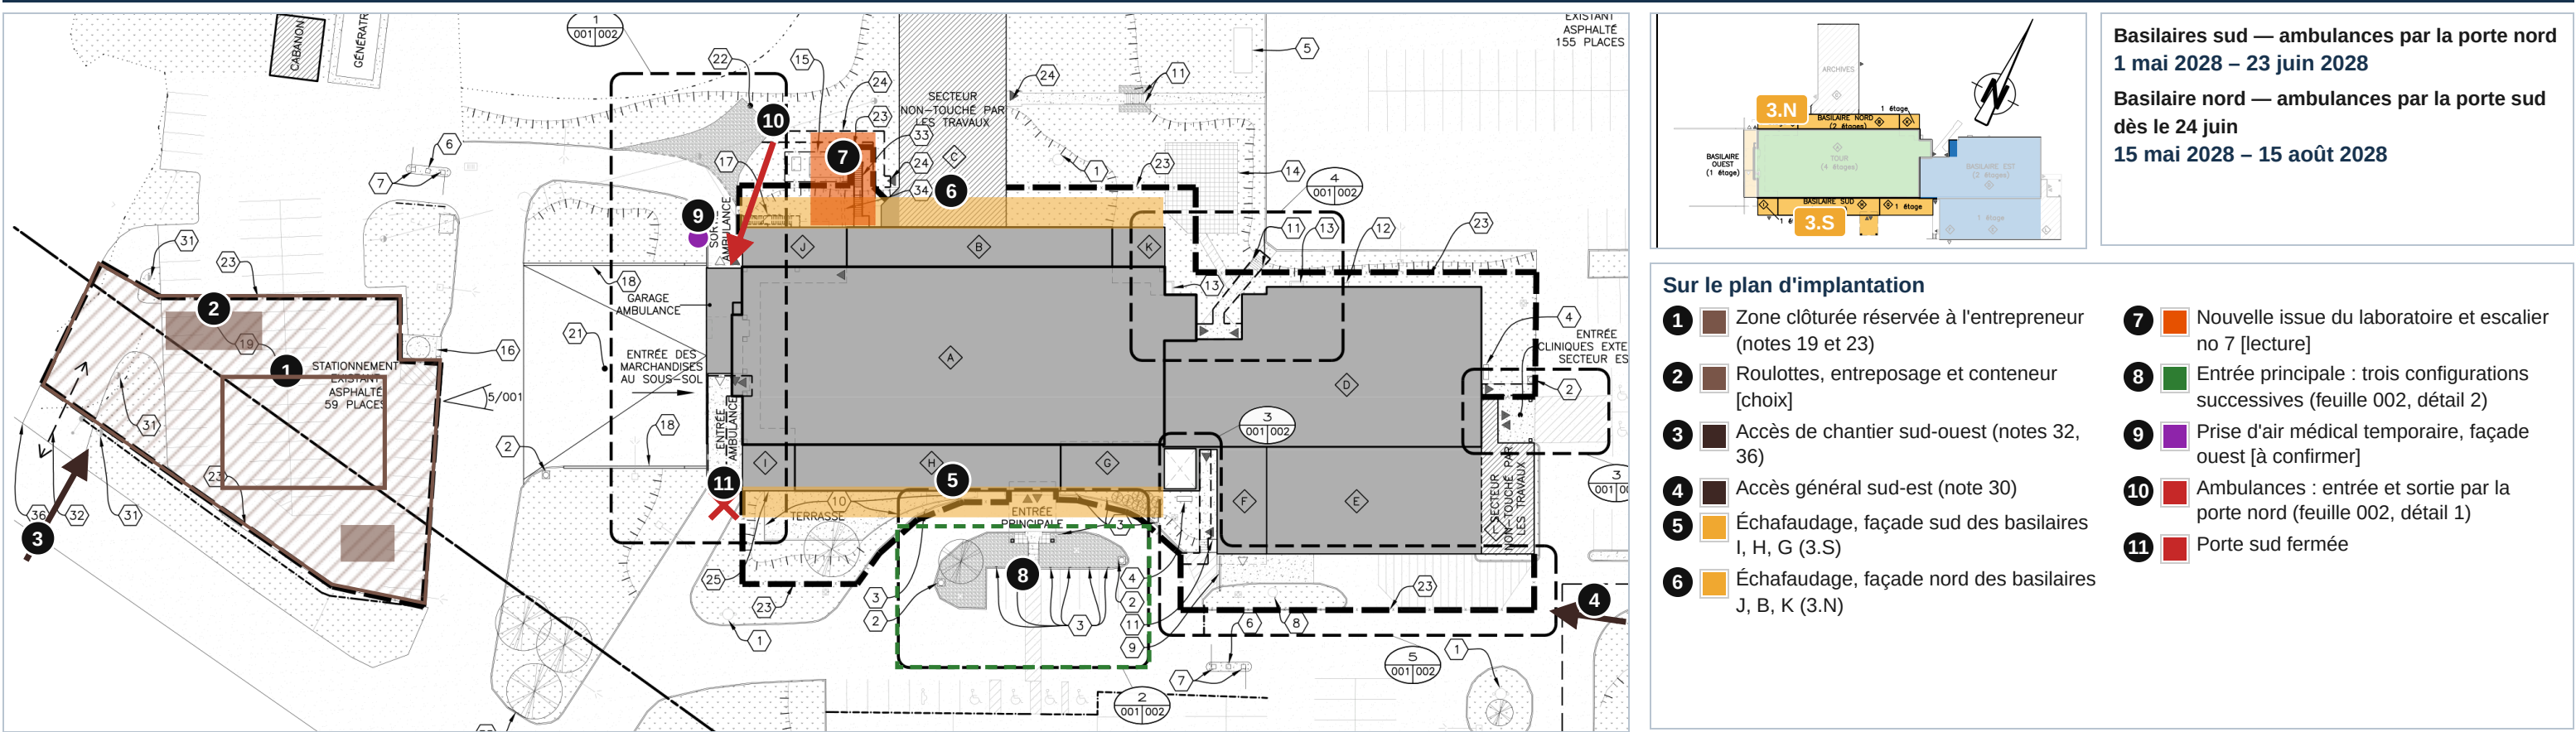

Élévation sud, axes 1 à 9

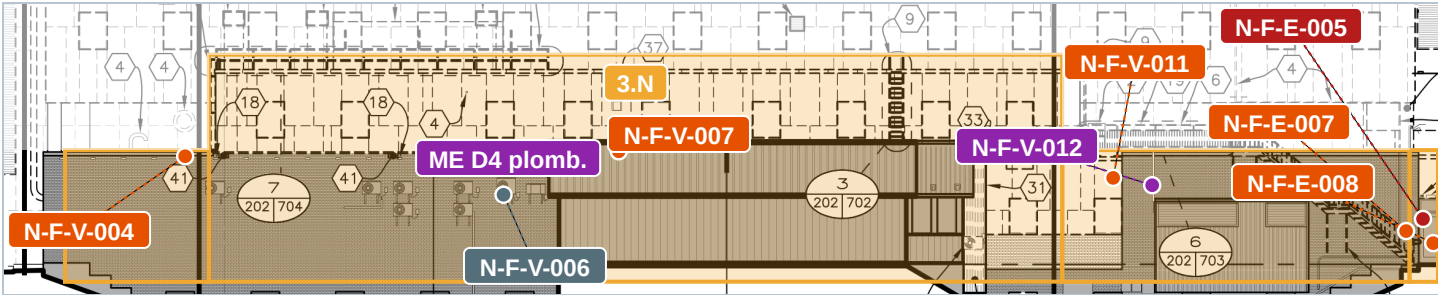


Élévation nord, axes 9 à 1

33 appareils rattachés à cette période : 17 interrompus, 8 non touchés, 5 déplacés, 2 retirés, 1 maintenus sans interruption. Sur les élévations partielles, non dessinés ici : E-H-V-002. Sans repère sur les dessins : S-A-E-001, N-F-V-003, N-F-GM-001.

Interrompus (17) : S-A-PI-001, S-A-E-006, S-A-E-007, S-A-E-010, S-A-E-009, S-A-E-011, S-A-E-013, S-A-E-014, S-A-E-021, S-A-E-017, N-F-V-004, N-F-V-007, N-F-V-003, N-F-V-011, N-F-E-006, N-F-E-007, N-F-E-008 Déplacés puis réinstallés (5) : hors tableau : Évents de vapeur de la chaufferie (3 annoncés), S-A-V-001, S-A-V-002, hors tableau : Sortie d'évent murale de laboratoire, N-F-V-012	Retirés (2) : S-A-E-008, N-F-E-005 Maintenus sans interruption (1) : N-F-GM-001 Non touchés (8) : S-A-E-004, S-A-E-005, S-A-E-003, S-A-E-002, S-A-E-012, S-A-E-001, N-F-V-006, E-H-V-002
---	--

Basiliares sud, mai au 23 juin 2028. La seule ligne de protection incendie du tableau tombe ici : gicleurs du toit de l'entrée des ambulances mis hors service par zone, deux coupures de 2 h, glycol récupéré (S-A-PI-001 ; ME-006 à 008). Le bi-bloc du prélèvement d'urgence se démantèle hors été (S-A-V-001), la persienne de l'unité UT-2 lors d'une coupure rapide (S-A-V-002). L'entrée principale passe par trois configurations (AR-PLN-019).	Basilaire nord, mi-mai au 15 août 2028. Laboratoire : sortie d'air et évacuation V-53 maintenues par conduits temporaires (N-F-V-007, N-F-V-003), trappes d'accès refaites à l'identique, verrou inverse (N-F-V-011). Nouvelle issue extérieure du laboratoire, classe IV « J », et escalier no 7 [à confirmer] : l'été pour l'excavation. Air médical : prise d'air temporaire posée sur la façade ouest au niveau du basilaire, encore à refaire, avec boîtier HEPA, bonbonnes et première certification (N-F-GM-001 ; ME-064 à 069).	Les ambulances. La feuille 001 place le garage des ambulances dans le basilaire ouest, entrée par la porte sud et sortie par la porte nord : les documents qui écrivaient « sud » et « nord » parlaient des deux portes du même garage. Pendant les travaux au sud, les ambulances entrent et sortent par le nord ; à partir du 24 juin, par le sud (feuille 002, détail 1). Le clavier de la porte nord est écrit « en période estivale » : il tombe du 24 juin au 15 août (N-F-E-008).	Chantier. Préavis de trois semaines avant chaque changement de configuration d'accès (AR-DEV-139) ; un panneau d'ambulance par configuration (AR-PLN-014), alors que l'enseigne AMBULANCE est hors service pendant le secteur (S-A-E-006). Plan de sécurité incendie couvrant la mise hors service des gicleurs (Z-08).
---	---	--	---

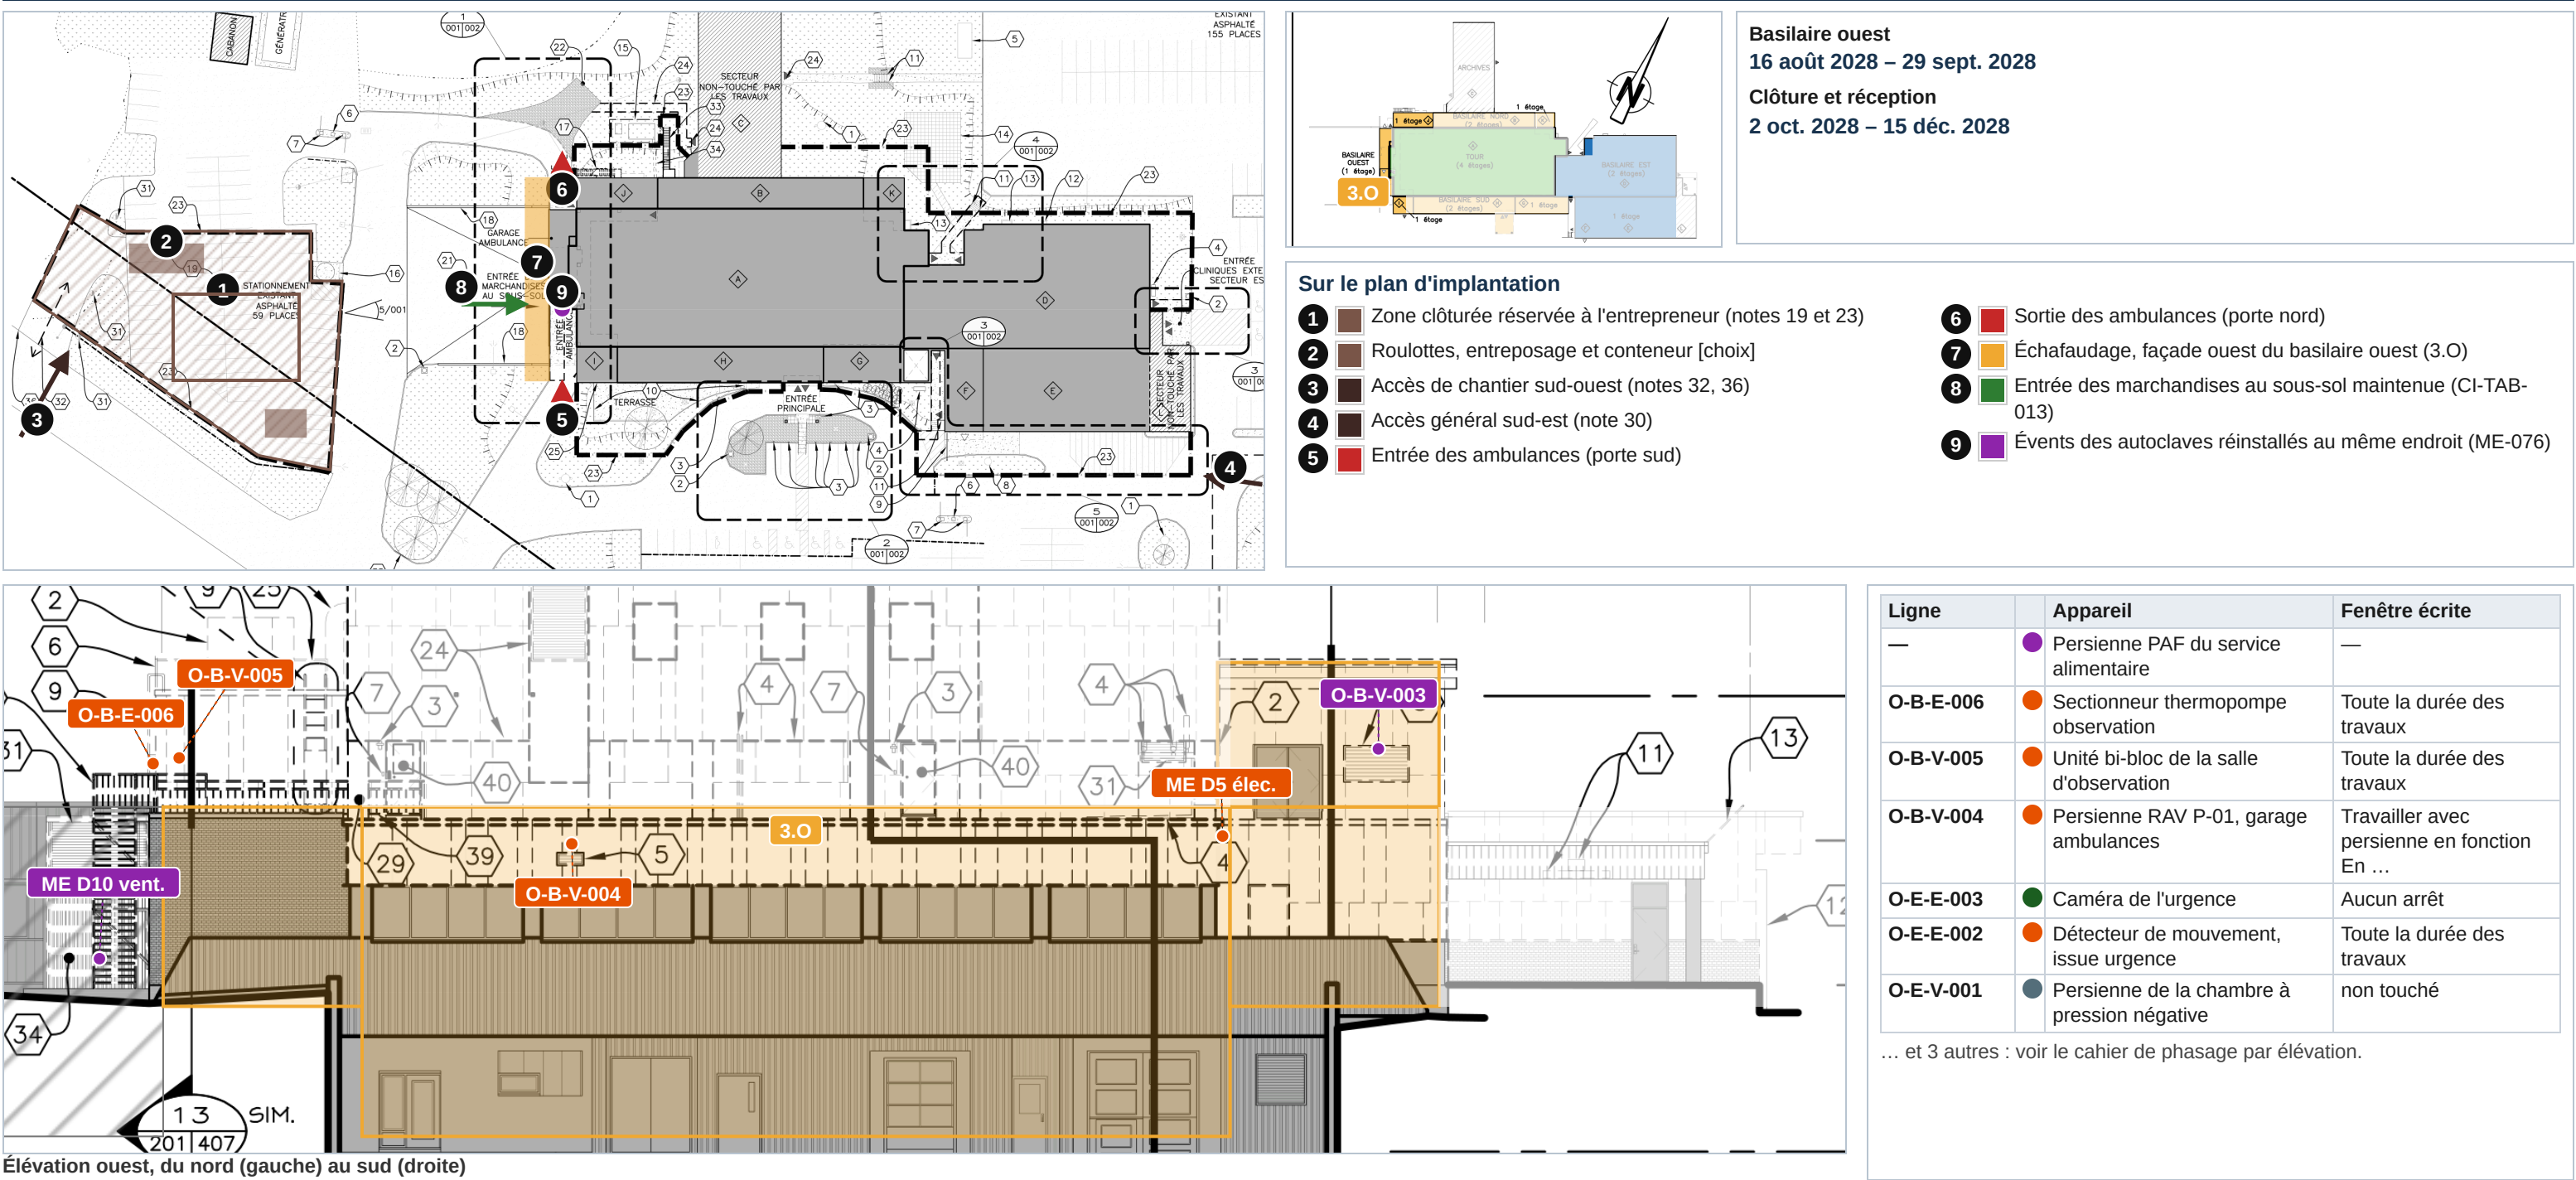

Élévation ouest, du nord (gauche) au sud (droite)

10 appareils rattachés à cette période : 5 interrompus, 2 déplacés, 2 non touchés, 1 maintenus sans interruption. Sur les élévations partielles, non dessinés ici : O-E-E-003, O-E-E-002, O-E-V-001, O-E-E-001.

Basilaire ouest, 16 août à septembre 2028. Après le revêtement nord, la prise d'air médical est réinstallée et les temporaires retirés (ME-067), puis la façade ouest du basilaire est refaite. Les événements des autoclaves reviennent à leur place d'origine (ME-076). Le bi-bloc de la salle d'observation est sur ce côté-ci, posé sur le garde-corps G-02 de la feuille 703, et non au sud comme l'écrivait le plan de phasage : il se réinstalle sur le garde-corps modifié, qui doit donc être posé avant lui (O-B-V-005 ; AR-PLN-070).

Ce qui se maintient. La caméra de l'issue de l'urgence ne tolère « aucun arrêt » : relocalisée et vérifiée avant la dépose (O-E-E-003). L'entrée des marchandises au sous-sol reste ouverte (CI-TAB-013). La persienne de prise d'air du service alimentaire, sans ligne au tableau, reçoit un registre coupe-feu [à confirmer].

À trancher. La persienne du garage des ambulances est écrite « travailler avec persienne en fonction. En période estivale » (O-B-V-004). Si cela veut dire « garder la persienne en fonction l'été », septembre convient ; si cela veut dire « faire ce travail l'été », il faut commencer la phase 3.O par ce tronçon avant le 15 août, hors de l'emplacement de la prise d'air médical temporaire.

Phase 4, octobre à mi-décembre 2028. Essais intégrés de l'alarme incendie (AR-DEV-006, ME-098), équilibrage (ME-134 à 138), filtres remplacés avant la réception provisoire (ME-139), mise en service avec préavis de 21 et 14 jours (AR-DEV-274, AR-DEV-276), deuxième certification de l'air médical (ME-069), nettoyage final et contrôle de la qualité de l'air avant de rouvrir un service (AR-DEV-243 à 245 ; CI-PCI-023, 024), remise en état du site (AR-DEV-298), avis de fermeture (CI-CTR-022) et réception (CI-CTR-026).

Planche 9 / 9 — Calendrier et décisions

Ce qui commande le calendrier, ce qui peut le faire bouger, et qui doit trancher quoi avant quand

Ce qui commande le calendrier

La contrainte qui commande tout. Les durées du plan clé totalisent 17 mois de travaux d'enveloppe. La fenêtre de janvier 2027 à décembre 2028 compte 24 mois, dont 12 seulement hors de la période de novembre à avril — la seule saison froide que les plans nomment (AR-PLN-042). Au moins cinq mois d'enveloppe tombent donc l'hiver, quel que soit l'ordre ; l'enchaînement proposé en place environ sept, de janvier à avril 2027 sur le basilaire est et de novembre 2027 à janvier 2028 sur la face est de la tour, parce que le basilaire nord doit attendre l'été 2028. Les enceintes chauffées ne sont pas une variante : elles sont au prix.

Pourquoi l'hiver tombe sur le basilaire est et non sur la tour. Un basilaire de deux étages se ferme et se chauffe plus facilement qu'un échafaudage de tour. Mettre la tour dans l'hiver 2027-2028 en entier aurait placé six mois de travaux en hauteur sous enceinte.

Le chemin critique est électromécanique. Si les conduits temporaires de l'hémodialyse ne sont pas posés avant le 24 juin 2027, la tour attend l'automne : leurs coupures ne se font que le dimanche, hors été. WSP doit donc avoir écrit leur tracé au printemps 2027 au plus tard (Z-29).

Ce qui peut changer	Ce que ça déplace
Le CISSS ne confirme pas le calendrier de janvier 2027 à décembre 2028	Tout le calendrier ; l'ordre et les verrous restent valides
La période estivale n'est pas du 24 juin au 15 août	Les bornes de 2.N, 2.E, 3.S et 3.N ; le rebranchement de l'hémodialyse
WSP n'a pas écrit les conduits temporaires de l'hémodialyse en avril 2027	Le début de la tour, repoussé à la fin d'août 2027 ; la face est glisse dans l'hiver
O-B-V-004 veut dire « faire l'été »	Le début de 3.O, avancé avant le 15 août sur le tronçon du garage
La centrale d'air médical est sur la tour, pas sur le basilaire	La prise d'air temporaire percerait la face ouest de la tour refaite en 2027 : à replacer avec WSP
L'escalier no 7 doit remplacer une issue condamnée	La nouvelle issue passe en phase 0 ou 1 (variante V-K4a du plan de phasage)
Les enceintes chauffées sont refusées	L'enveloppe s'arrête de novembre à avril : les 17 mois de travaux ne tiennent plus dans la fenêtre, il en manque au moins cinq

Date	Jalon
2 nov. 2026	Mobilisation et installation de chantier (phase 0)
4 janv. 2027	Début des travaux : basilaire est (phase 1)
avril 2027	Tracé des conduits temporaires de l'hémodialyse écrit par WSP (Z-29)
3 mai 2027	Début des contournements électromécaniques de la tour
1 juin 2027	Début de la tour, face sud
23 juin 2027	Conduits temporaires posés, avant la période estivale
28 janv. 2028	Tour fermée : fin de la face est
24 juin 2028	Ambulances : entrée et sortie par la porte sud jusqu'au 15 août
29 sept. 2028	Fin des travaux d'enveloppe (basilaire ouest)
15 déc. 2028	Fin de la clôture : mise en service et réception

Ligne	Phase	Ce que le tableau écrit	Dans le calendrier proposé
N-F-P-002	1	arrêt « sauf en période estivale »	respecté — phase 1 de janvier à mai
N-F-V-005	avant 2	« dimanche seulement, en dehors de la période estivale »	respecté — basculement en mai-juin, rebranchement après le 15 août
N-F-V-005	2.N	« dimanche seulement, en dehors de la période estivale »	respecté
O-B-E-001	2.O	« en dehors de la période hivernale », durée « mois »	respecté — juillet à septembre
E-G-V-003	2.E	« semaine, en dehors de la période estivale »	respecté
E-G-E-006	2.E	« semaine, en dehors de la période estivale »	respecté — même fenêtre que E-G-V-003
S-A-V-001	3.S	« en dehors de la période estivale (quelques jours en été) »	respecté pour la première partie de la phrase
N-F-E-008	3.N	« en période estivale »	respecté — porte nord traitée du 24 juin au 15 août
O-B-V-004	3.O	« travailler avec persienne en fonction. En période estivale »	à trancher : respecté si « l'été, garder la persienne en fonction » ; non respecté si « faire l'été »

Décision	De qui	Avant	Ce qu'elle débloque
Confirmer le calendrier (installation en novembre 2026, travaux de janvier 2027 à décembre 2028) et la période estivale du 24 juin au 15 août	CISSS	novembre 2026	Toutes les dates du plan
Régime PCI applicable à Chandler et classes du tableau (C-01, C-02)	CISSS	novembre 2026	Les cloisons, sas et pressions de chaque phase
Plage horaire de travail et sens des codes « J », « S », « J/S » (Z-01)	CISSS	novembre 2026	Les horaires de toutes les étapes classées
Plans émis pour construction (ST-005, ME-160)	Architectes et WSP	décembre 2026	Le début de la phase 1
Tracé et forme des conduits temporaires de l'hémodialyse, séquence de basculement, fenêtres (Z-29) ; rattachement de l'unité côté ouest	WSP	avril 2027	La pose des temporaires en mai-juin 2027, donc le début de la tour
Report des phases sur les élévations et rattachement des élévations partielles C, I, H, E	Architectes	décembre 2026	Les bandes de phase de la planche 2 et la phase de chaque appareil
Portée de « travaux par l'extérieur » sur la feuille 505 (AR-PLN-040)	Architectes	décembre 2026	Le moment du retrait des fenêtres dans chaque phase
Divergences du tableau et des dessins : E-G-V-001, 002 ; E-G-V-003 ; E-G-E-006 ; O-B-V-002	WSP	mai 2027	Les faces est et ouest de la tour
Emplacement de la centrale d'air médical (tour ou basilaire) et de sa prise d'air temporaire	WSP	janvier 2028	La phase 3.N sans percer un revêtement neuf
Escalier no 7 = nouvelle issue, et ordre avec la condamnation d'une issue existante (Z-12)	Architectes et structure	janvier 2027	Le moment de la nouvelle issue (phase 0, 1 ou 3.N)
Sens de O-B-V-004 et de S-A-V-001	CISSS et WSP	mars 2028	Le début de 3.O ; la phase 3.S
Correspondance des trois numérotations « phase 1, 2, 3 » (C-34)	Architectes et CISSS	novembre 2026	La lecture contractuelle des zones de chantier par phase
Aire de levage, grue et entreposage par phase (Z-27, AR-DEV-171)	Entrepreneur	phase 0	Le plan de chantier définitif, que ce cahier esquisse
« Avant » : date à laquelle la décision doit être prise pour que le calendrier proposé tienne. Les seize défauts documentaires relevés en lisant les élévations sont détaillés dans le cahier de phasage par élévation, planche 14.			
