


Planche 0 — Lecture du site

Zones A à L et O, repères d'élévation A à I, points fixes 24/7 et accès à maintenir — planche commune à toutes les options

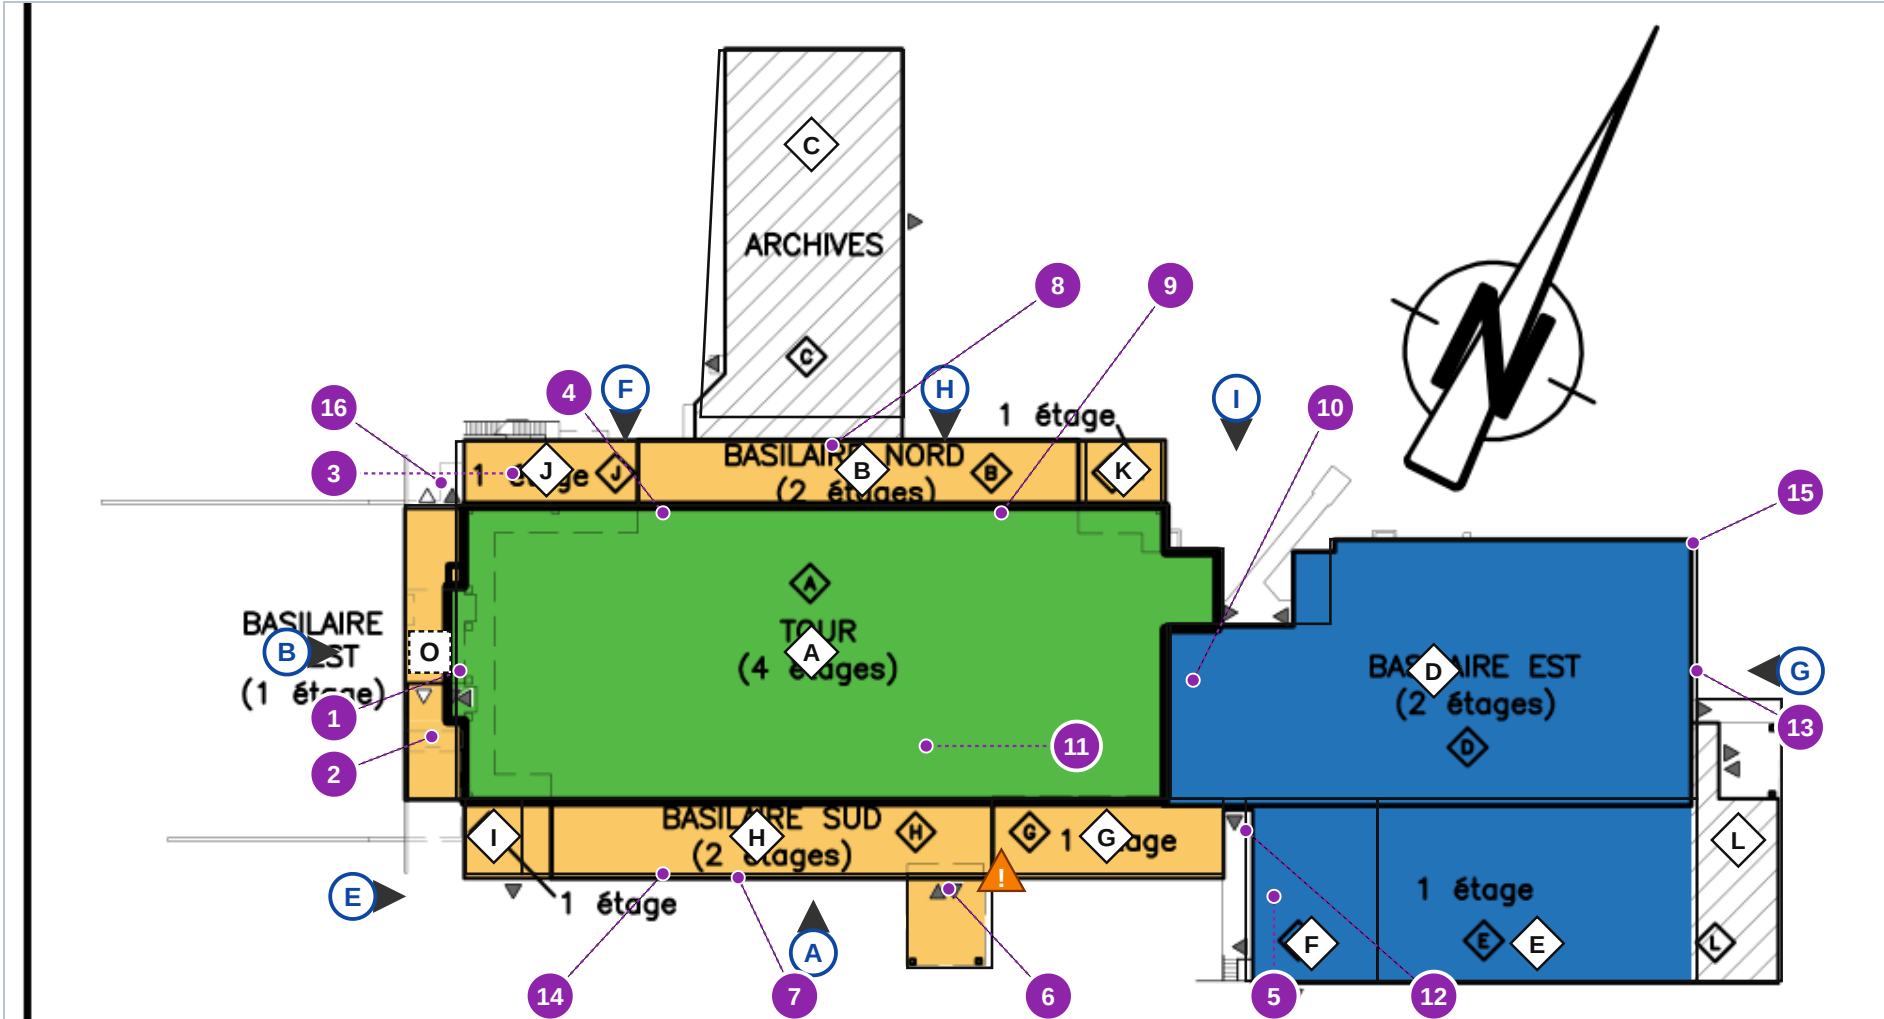


Fond : feuille 010 (D2), plan clé « Zones des travaux », couleurs des architectes (bleu phase 1, vert phase 2, orange phase 3, hachures « secteur non touché ») ; nord en haut à droite. Contours des zones, lettre O du basilaire ouest, repères d'élévation A à I (feuille 011) et points fixes 1 à 16 : superposés [lecture] ; le numéro pointe l'emplacement écrit ou lu, le tableau de droite donne la ligne du registre.

Zones A à L et parties de bâtiment		
Zone	Fonction (légende 010, via 01 §8.5)	Phase du plan clé [lecture]
A	Tour des chambres, niveaux 200 à 400 (1974)	Phase 2
B	Laboratoire, niveau 100 (1990) — basilaire nord	Phase 3
C	Archives, RC (2001)	Secteur non touché
D	Administration niv. 100 et cliniques externes RC — basilaire est	Phase 1
E	Oncologie, RC (1974)	Phase 1
F	IRM, RC (2007)	Phase 1
G	Basilaire sud-est, 1 étage	Phase 3
H	Chirurgie d'un jour niv. 100 et urgence RC — basilaire sud	Phase 3
I	Basilaire sud-ouest, 1 étage	Phase 3
J	Basilaire nord-ouest, 1 étage	Phase 3
K	Basilaire nord-est, 1 étage	Phase 3
L	Oncologie, RC (2023)	Secteur non touché
O	Basilaire ouest, 1 étage — lettre attribuée ici [lecture]	Phase 3 [lecture]
—	Saillie sud, portes de garage ▲ ▼ : quai des ambulances [lecture]	Phase 3 [lecture]

Repères d'élévation A à I (plan clé de la 011)		
Élév.	Titre (feuille 011)	Face vue [lecture]
A	Élévation sud	sud (basilaire sud et tour)
B	Élévation ouest	ouest (basilaire ouest et tour)
C	Élévation ouest partielle	ouest, partielle — jonction est / saillie : ?
D	Élévation est partielle	est, partielle — saillie sud (G) : ?
E	Élévation ouest partielle	ouest, partielle — angle sud-ouest (I)
F	Élévation nord	nord (basilaire nord, tour, archives)
G	Élévation est	est (basilaire est et tour)
H	Élévation nord partielle	nord, partielle — près des archives / K
I	Élévation ouest partielle	ouest, partielle — près des archives / K
« ? » : à trancher par les architectes (planche 13).		

Implantation existante (feuille 001) : issues et accès repérés par les architectes

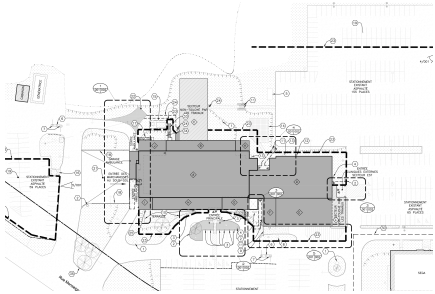

Légende 001/002 : ▲ issue ou accès au bâtiment protégé durant le chantier (AR-PLN-016) ; △ porte de garage ; borne-fontaine accessible en tout temps (AR-PLN-001) ; issues et chemins d'évacuation maintenus à 1650 mm (AR-PLN-006) ; portes hors service repérées (AR-PLN-007) ; plan d'action avant tout travail près d'une issue (AR-PLN-011).

Points fixes 24/7, unités critiques et accès (registre 02)


No	Point fixe ou accès à maintenir	Localisation écrite et marque	Registre
1	Prise d'air frais du bloc opératoire — 24/7, conduits temporaires	« Façade ouest (tour) », « toiture ouest » — [à confirmer] tour ou basilaire	ME-042 à 048
2	Événements des autoclaves (sous-sol) — 24/7, relocalisés avant la façade ouest	« Façade ouest », toiture ; temporaires jusqu'au coin sud-ouest	ME-075 à 079
3	Centrale d'air médical — 24/7 ; prise temporaire sur la façade ouest	« Toiture nord-ouest » — [à confirmer] tour ou basilaire	ME-064 à 068
4	Ventilation hémodialyse / laboratoire, niveau 200 — conduits temporaires	« Façades nord/ouest » de la tour — [à confirmer] locaux 202-237	ME-049 à 054
5	IRM — métal interdit quand l'IRM est en service ; volets coupe-feu	Zone F (RC)	AR-PLN-009 ; ME-010, 109, 110
6	Urgence (RC, zone H) et quai des ambulances — gicleurs 2 × 2 h	« Entrée ambulance sud » (D4, D5) contre « zone ambulance (nord) » (D2) — [lecture] garage ▲ ▼	ME-006 à 008, 145 à 147 ; AR-PLN-004, 018
7	Entrée principale et marquise — accès maintenu, trois configurations	Zone H ; détail 2 de la feuille 002 — [lecture] marquise au sud	AR-PLN-008, 019 ; CI-TAB-014
8	Nouvelle issue du laboratoire (niveau 100) — jalon ; escalier no 7	Zone B ; « basilaire nord-ouest » — [à confirmer] escalier no 7 = issue (Z-12)	AR-DEV-058, 198 ; AR-PLN-064 ; ST-039
9	Chambres 216 (nord) et 307 (sud) ; soins intensifs 315	Façade nord ; façade sud ; ligne D5 N-F-V-009	ME-056 à 058
10	Hotte de médecine nucléaire — conduit modifié sur toute la hauteur	« Tour est »	ME-117 à 119
11	Prises d'air et registres du service alimentaire, sous-sol — classe IV « S »	Niveau SS, « zone A » — [à confirmer] sous-sol non zoné	CI-TAB-005 ; ME-025, 029
12	Local R-22 — renforts des colonnes A4, A5, A6 (classe IV, J/S)	« Secteur IRM / local R-22 (RC) » ; zone C au tableau CISSS — [à confirmer]	ME-108, 111 ; CI-TAB-010 ; C-40
13	Salle des serveurs RC ; bi-bloc LG 18 MBH	« Façade est »	ME-086, 088
14	Persienne UT-2 (chirurgie d'un jour) — coupure rapide	« Façade sud »	ME-055
15	Stationnement de l'IRM mobile — sorties d'arrosage	« Coin nord-est » (D4) ; lignes D5 sud et nord — [à confirmer]	ME-116 ; CI-TAB-017
16	Événements de la chaufferie (porte-à-faux) — 24/7 ; soffite du coin nord-ouest	« Porte-à-faux », « coin nord-ouest » — [à confirmer] face (C-28)	ME-080, 096, 120 à 123

Sources : D2 feuilles 001, 002, 010, 011 (rendus 200 ppp) ; analyse/01-inventaire.md §8.5 ; analyse/02-contraintes.md ; analyse/03-phasage.md §2.1, §6.

Conventions : [lecture] = lu sur un plan, non écrit ; [à confirmer] = non fixé par les documents ; ! = localisation divergente entre documents ; AR-DEV-, AR-PLN-, ME-, ST-, CI- = lignes du registre 02 ; C-, Z-, R-, K- = contradictions, zones d'ombre, renvois, conflits de 03.

Planche 1 — Option R — référence — ordre des phases

Plan clé recoloré par phase et sous-phase, numéros d'ordre, configurations des accès, issues

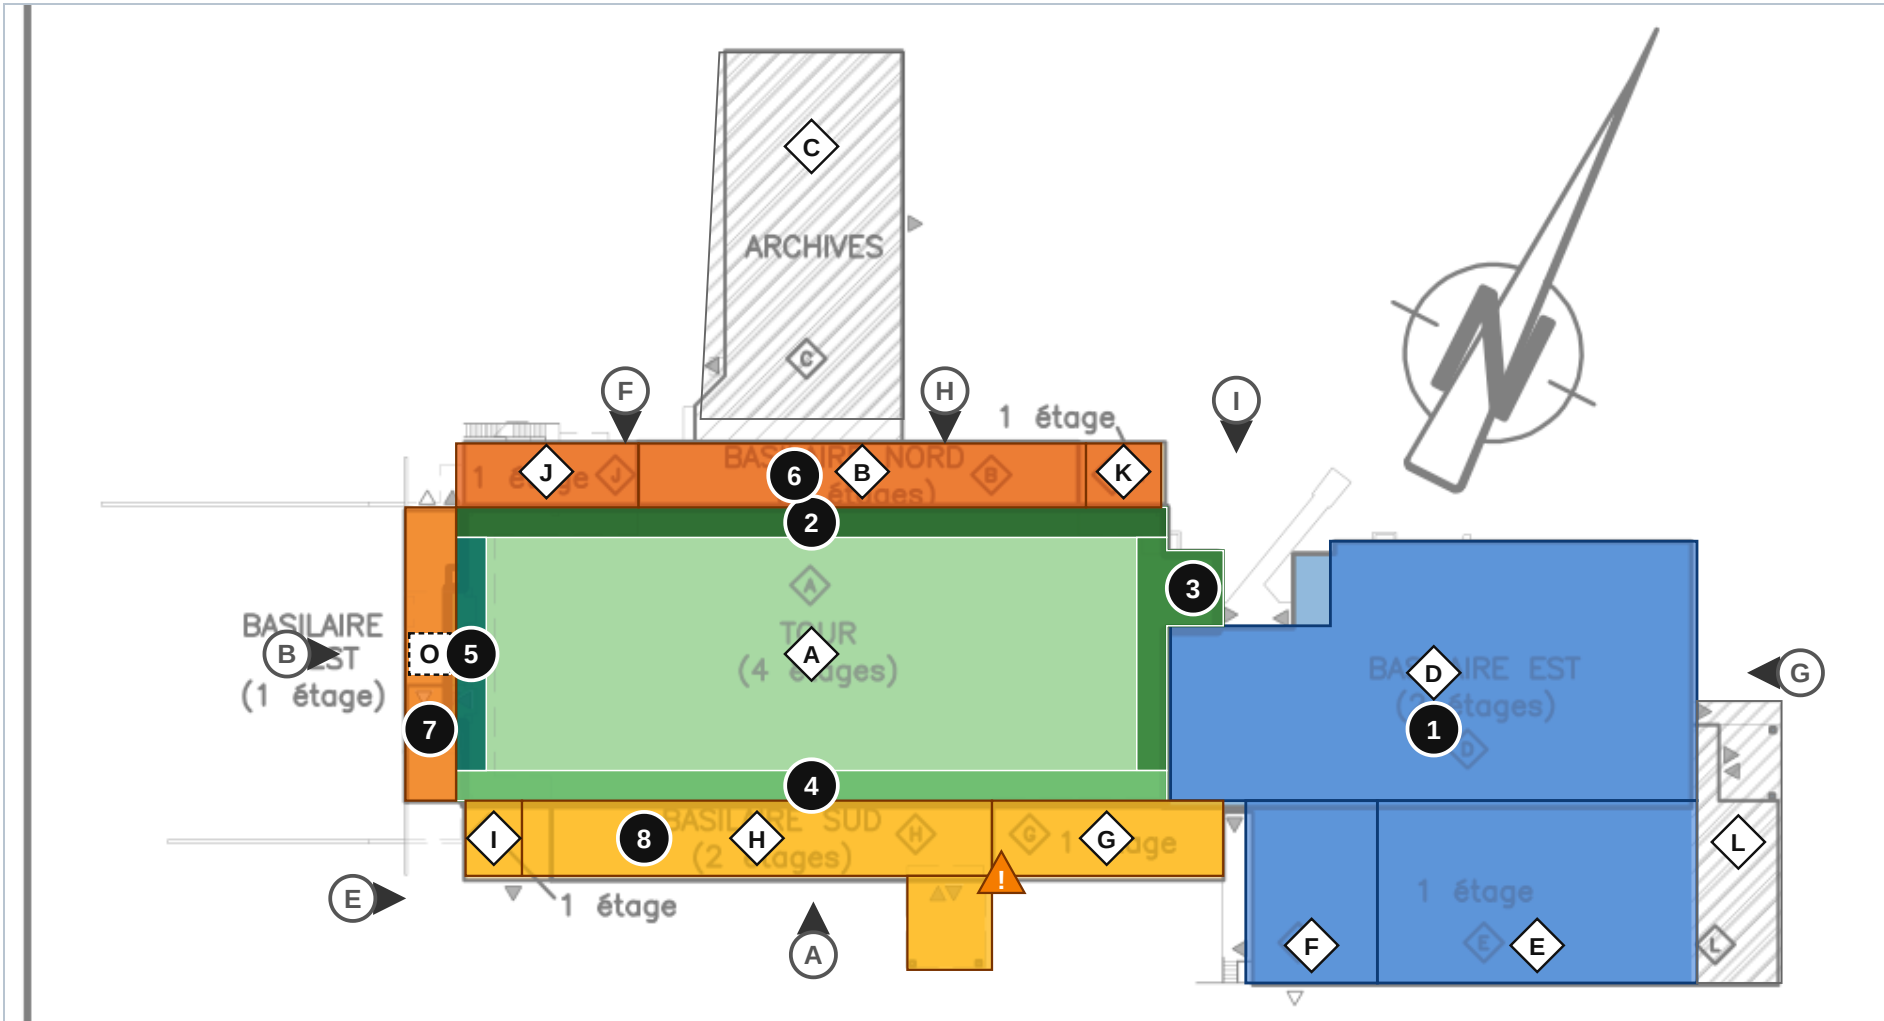

Bleu = phase 1 ; vert clair = tour, ses faces 2.N, 2.E, 2.S, 2.O en bandes vertes ; oranges = 3.N, 3.O, 3.S ; gris hachuré = secteur non touché. Numéros noirs = ordre des phases et sous-phases de cette option. Pictogramme orange : localisation divergente (zone d'ambulance « sud » selon D4/D5, « nord » selon D2).

0 Préalables → 1 Basilaire est → 2 Tour : N → E → S → O → 3 Basilaires : nord → ouest ; sud en parallèle → 4 Clôture

Fondement : Numérotation du plan clé 010 [lecture] ; nord avant ouest déduit de ME-065/067 [lecture] ; ordre des faces de la tour [choix] (seules règles écrites : ME-049, ME-118). Correction des anomalies après chaque phase, avant la suivante (AR-DEV-275). Repères des architectes sur la feuille 010 : phase 1 « ±5 mois », phase 2 « ±8 mois », phase 3 « ±4 mois » (C-34) — aucun calendrier n'en est déduit.

Issues : nouvelle issue, issues touchées et compensation


Nouvelle issue permanente au laboratoire (zone B, niveau 100) : jalon du calendrier (AR-DEV-058), classe IV horaire « J » (CI-TAB-019), percements hors des heures d'occupation (ME-020). Escalier no 7 des plans de structure présumé être cette issue [à confirmer] (Z-12 ; ST-039 : « basilaire nord-ouest »). Ordre nouvelle issue / condamnation d'une issue existante : non écrit (Z-12, K4) ; variantes sur la planche de séquence.

Issues touchées. Deux issues minimum et capacité d'évacuation maintenue dans les secteurs occupés (AR-DEV-198). Aucune issue condamnée n'est écrite : à chaque issue touchée par une sous-phase, plan d'action préalable (AR-PLN-011), chemin d'évacuation maintenu à 1650 mm (AR-PLN-006) ou escalier d'issue temporaire modulaire incombustible (AR-DEV-311, 195), portes hors service repérées (AR-PLN-007), renvoi à la feuille 002 pour le maintien des issues (AR-PLN-039). Sous-phases qui touchent des issues repérées sur 001/002 [lecture] : porte d'issue de l'urgence et escalier no 1 (ME-146) en 3.S ; portes du laboratoire, du bloc opératoire, de la salle du personnel, escaliers 3, 4, 6 et quai des ambulances (lecteurs de carte déposés, ME-104) selon la face ; issue no 3 vers la toiture 2 (CI-TAB-026).


Ce que l'ordre implique

- Prototype de la première fenêtre et du premier mur-rideau en phase 1, en présence de l'architecte (AR-PLN-050).
- Nord avant ouest : la prise d'air médical temporaire est « sur la façade ouest pour permettre les travaux de la façade nord » (ME-065) et réinstallée « après le revêtement nord » (ME-067) — ordre déduit [lecture], simultanéité non exclue (Z-02).
- Faces de la tour : conduits temporaires hémodialyse avant démolition nord/ouest (ME-049) ; conduit de médecine nucléaire modifié pour permettre la façade est (ME-118) ; sinon [choix].
- Repère des architectes : le plan clé numérote 1, 2, 3 dans cet ordre (C-34).

Configurations des accès portées par 3.S (feuille 002) : ambulances, deux configurations (AR-PLN-018) ; entrée principale, trois (AR-PLN-019) ; « phase 1/2/3 » = numéros propres à la 002 (C-34)

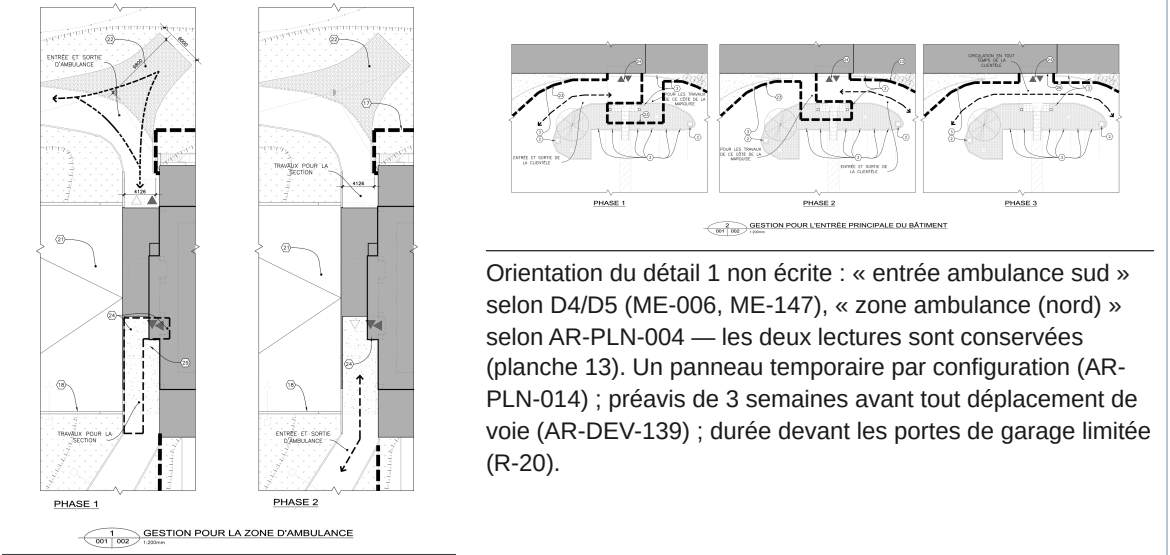

Orientation du détail 1 non écrite : « entrée ambulance sud » selon D4/D5 (ME-006, ME-147), « zone ambulance (nord) » selon AR-PLN-004 — les deux lectures sont conservées (planche 13). Un panneau temporaire par configuration (AR-PLN-014) ; préavis de 3 semaines avant tout déplacement de voie (AR-DEV-139) ; durée devant les portes de garage limitée (R-20).

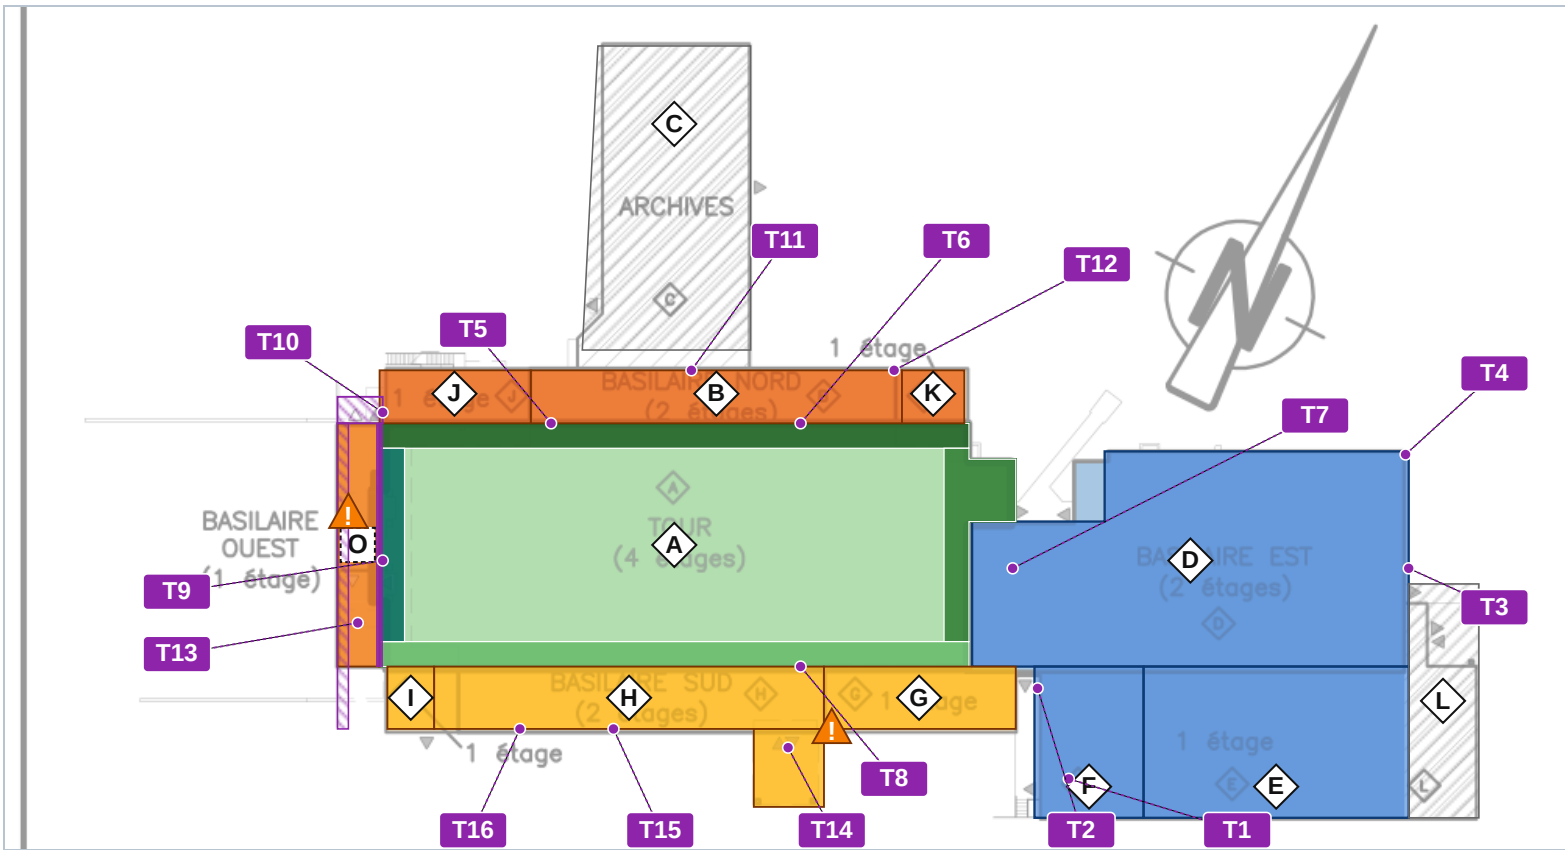

Étiquettes T1 à T16 (magenta) : installations et mesures temporaires ; le point marque la face écrite au registre ; identifiants au tableau de droite. Hachures magenta : façade ouest, où le registre place l'air médical temporaire (ME-065), les conduits du bloc opératoire (ME-047) et les événements d'autoclaves (ME-075). Pictogramme près de T9 : tour ou basilaire non écrit.

Installations temporaires électromécaniques et mesures propres aux sous-phases (fiches de 03 §2.2 à §2.4 ou §3.2 à §3.4)


Code	Sous-phase	Installation ou mesure temporaire	Registre
T1	1	IRM : volets coupe-feu de fenêtre, gicleur R-34 remplacé ; métal interdit quand l'IRM est en service	ME-010, 109, 110 ; AR-PLN-009 ; CI-TAB-009
T2	1	Local R-22 : conduits EMT relocalisés avant les renforts A4-A6 (classe IV, J/S)	ME-108, 111 ; CI-TAB-010
T3	1	Salle des serveurs RC : arrêt court, semaine, hors été ; bi-bloc LG remis en marche	ME-088, 086
T4	1	IRM mobile : sorties d'arrosage protégées, alcôve dans le revêtement	ME-116
T5	2.N	Hémodialyse / labo niv. 200 : conduits temporaires AVANT démolition ; coupures dimanche hors été	ME-049 à 051
T6	2.N	Chambre 216 : conduit RAV prolongé hors échafaudages	ME-057
T7	2.E	Hotte de médecine nucléaire : conduit modifié sur toute la hauteur ; arrêt vendredi-dimanche	ME-118, 119
T8	2.S	Chambre 307 : démantèlement si inoccupée, conduit prolongé, grillage ; sectionneurs de thermopompes déposés	ME-056, 107
T9	2.O	PAF bloc opératoire : 2 conduits temporaires AVANT démantèlement ; nouveau conduit APRÈS revêtement ; glycol déposé	ME-042 à 048, 084
T10	3.N	Air médical : prise et HEPA temporaires SUR LA FAÇADE OUEST pendant la façade nord ; bonbonnes ; 1re certification	ME-064 à 069, 072, 073
T11	3.N	Nouvelle issue du laboratoire, escalier no 7 : jalon ; classe IV « J » ; deux issues minimum maintenues	AR-DEV-058, 198 ; AR-PLN-064 ; ST-039 ; CI-TAB-019
T12	3.N	Laboratoire : sortie d'air par conduit temporaire hors échafaudages ; filtration V-53	ME-059 à 061
T13	3.O	Événements d'autoclaves relocalisés AVANT la façade ouest, temporaires en toiture jusqu'au coin sud-ouest ; nuit ou avant 10 h	ME-075 à 083
T14	3.S	Quai des ambulances : gicleurs hors service 2 x 2 h, glycol ; enseigne ; caméra	ME-006 à 008, 145 à 147
T15	3.S	Entrée principale : trois configurations autour de la marquise ; plan d'action d'évacuation	AR-PLN-008, 019 ; CI-TAB-014
T16	3.S	Persienne UT-2 : coupure rapide nuit ou fin de semaine ; bi-bloc GREE de l'urgence	ME-055, 085, 090

Les sous-phases du découpage B sont celles de l'affectation de 03 (annexe A) ; « B » et « C » sans numéro : niveau écrit, sous-phase non écrite.

Matrice phase × système électromécanique — colonnes dans l'ordre de l'option

Système (registre)	0	1	2.N	2.E	2.S	2.O	3.N	3.O	3.S	4
Gicleurs du quai des ambulances (ME-006 à 008)	M	M	M	M	M	M	M	M	C 2x2 h	M
Gicleurs des zones de plafond (ME-009 à 012)	M	I R-34	M	M	M	M	M	M	P	M
Alarme incendie (ME-091 à 095, 097)	M	M	M	M	M	M	M+issue	M	P détect.	cert.
PAF bloc opératoire, glycol (ME-042 à 048, 084)	M	M	M	M	M	P? C nuit	M	P?	M	mise en serv.
Événements d'autoclaves, câbles chauffants (ME-075 à 083)	M	M	M	M	M	P?	M	C → P → M	M	M
Air médical (ME-064 à 074)	M	M	M?	M	M	M?	P+cert.	P → M	M	cert.
Hémodialyse / labo niv. 200 (ME-049 à 054)	M	M	P ; C dim.	M	M	P ; C dim.	M	M	M	M
Chambres 216 et 307 (ME-057, 056)	M	M	P (216)	M	C → P (307)	M	M	M	M	M
Tour, face non écrite : bi-bloc 203 (ME-087), chambre 315 (ME-058), service alimentaire SS (CI-TAB-005)	M	M	C? I?	C? I?	C? I?	C? I?	M	M	M	M
Hotte de médecine nucléaire (ME-117 à 119)	M	M	M	C → P	M	M	M	M	M	M
UT-2 et bi-bloc GREE de l'urgence (ME-055, 085, 090)	M	M	M	M	M	M	M	M	C → P	M
Évacuations du laboratoire, V-53 (ME-059 à 061)	M	M	M	M	M	M	P	M	M	M
Bi-blocs est : serveurs RC, LG (ME-086, 088)	M	C ; C → P	M	M?	M	M	M	M	M	M
Caméra, détecteur, contrôle d'accès, enseigne (ME-099, 145 à 147)	M	M	M	M	M	M	M+KT-1	M	P ; C	M
Lecteurs, luminaires, persiennes non touchées (ME-063, 104 à 106)	M	P → M	P → M	P → M	P → M	P → M	P → M	P → M	P → M	M

C coupure (fenêtre : tableau de droite) · P provisoire · I intervention classée · M maintenu · ? localisation non écrite · → états successifs · cert. certification. Source : 03 §2.8 (A) ou §3.6 (B).

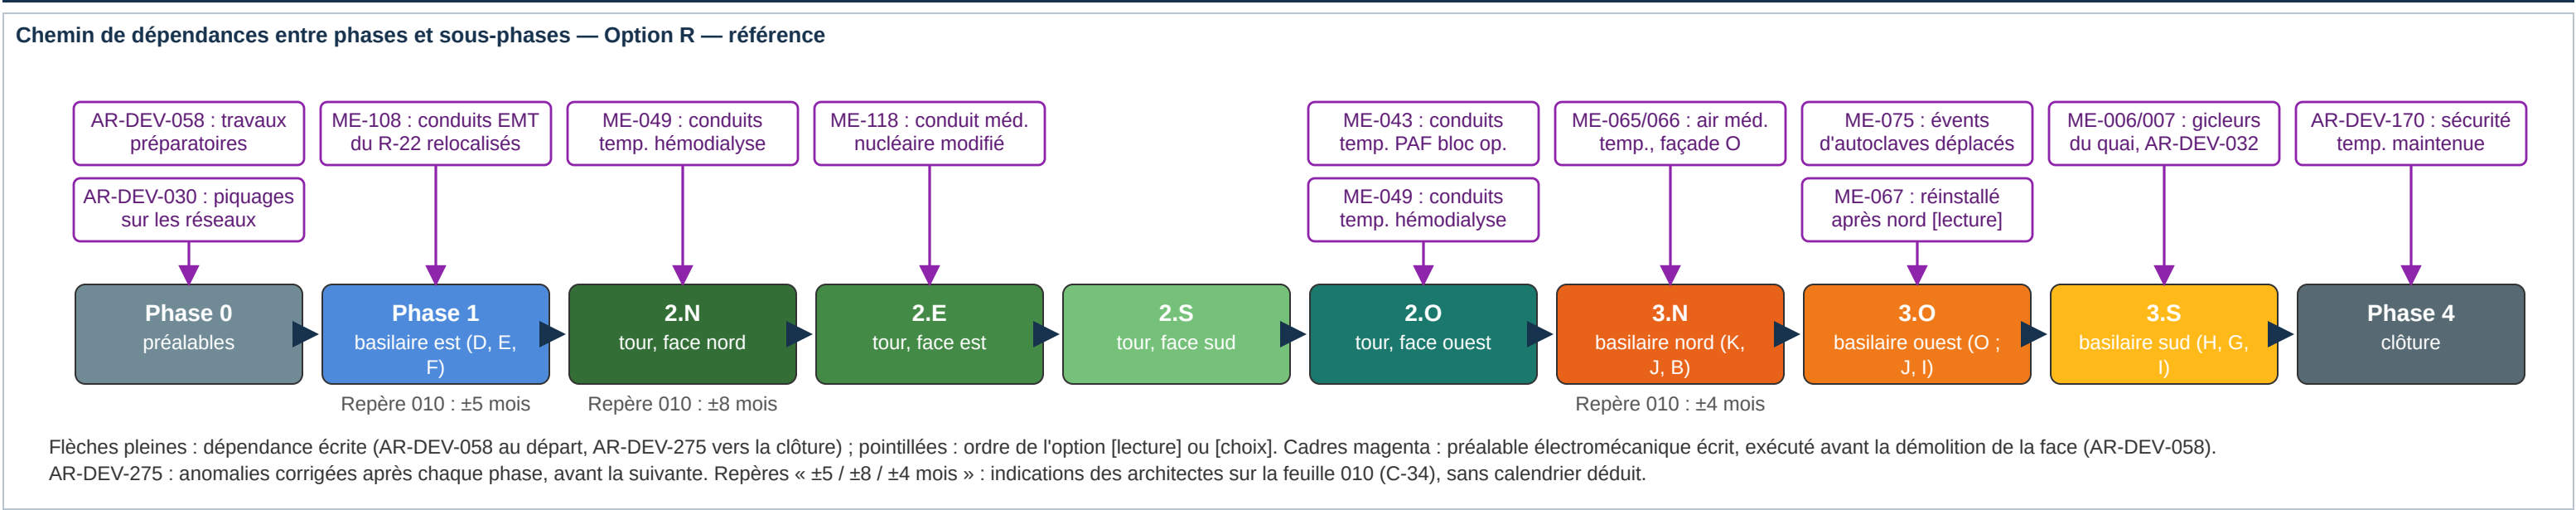


Couche K3 — fenêtres saisonnières applicables			
Fenêtre	Contrainte	Registre	Sous-phases concernées
Novembre à avril	Bâti isolé au lieu du plexiglas pendant les travaux par l'extérieur	AR-PLN-042	toutes les étapes de fenêtres
Hors période estivale	Coupures de l'unité hémodialyse / labo : dimanche seulement	ME-051	2.N, 2.O
Hors période estivale	Bi-bloc traitement d'eau 203 : arrêt court, semaine	ME-087	2 (face ?)
Hors période estivale	Bi-bloc salle des serveurs RC : arrêt court, semaine	ME-088	1
Hors période hivernale	Réinstallation des câbles chauffants des événements	ME-082	3.O (2.O ?)
Béton ≥ 10 °C ; mortiers ≥ 10 °C ; maçonnerie 5 à 50 °C	Réparations de béton, maçonnerie par temps froid (préchauffage, enceintes)	ST-034, 035 ; AR-DEV-304, 309	chaque façade
Couverture ≥ 18 °C (bitume) ou 10 °C (soudé) ; solins > 2 °C	Bandes de toiture périmétriques	AR-DEV-320, 329	chaque toiture
Pare-air > -10 °C ; membrane d'hiver 5 à 40 °C	Pose du pare-air	AR-DEV-316, 317	chaque façade
10 °C dans les zones de travaux ; vitrage : minimum prescrit 24 h	Chauffage temporaire surveillé hors heures	AR-DEV-144, 343, 112	toutes
Contrat : 31 août 2026 – 31 décembre 2027 (CI-CTR-001 ; dates jugées inapplicables en l'état, C-14), soit deux périodes novembre–avril. « Période estivale » non définie (Z-10). K3 : coupures des unités critiques interdites l'été, enveloppe contrainte l'hiver ; sans durée, la répartition n'est pas tranchée.			

Couche K4 — nouvelle issue et issues condamnées	
Nouvelle issue en amont (K4). Le jalon « construction d'une nouvelle issue et protection des issues » (AR-DEV-058) ne dit pas si la nouvelle issue précède la mise hors service d'une issue existante (Z-12). Deux issues minimum et capacité maintenue (AR-DEV-198). V-K4a — nouvelle issue et escalier no 7 exécutés dès la phase 0, avant toute façade : classe IV « J » (CI-TAB-019), câblage souterrain protégé (AR-PLN-013), percements hors heures d'occupation (ME-020). V-K4b — nouvelle issue en séquence dans 3.N ; admissible si aucune issue existante n'est condamnée avant. V-K4c — escalier d'issue temporaire modulaire (AR-DEV-311, 195) à chaque issue condamnée, indépendamment du nouvel escalier. Risque non sourcé : AR-DEV-170 interdit de passer des installations temporaires de sécurité aux permanentes avant l'achèvement substantiel ; le registre ne dit pas si un escalier d'issue temporaire en est une — à confirmer par les professionnels.	

Points de validation CISSS (registre consolidé de 03 §5)		
Point de validation du CISSS	Moment	Registre
Calendrier d'exécution et calendrier d'arrêt des installations approuvés ; tout changement d'horaire	Phase 0, puis à chaque mise à jour	AR-DEV-026, 032, 286 ; CI-CTR-003, 004
Préavis 48 h et approbation avant toute coupure ; calendrier hebdomadaire du jeudi	Avant chaque coupure	AR-DEV-024, 031, 032, 062
Plan de sécurité incendie approuvé (CISSSGA, Établissement, service incendie) ; mise hors service de gicleurs couverte	Avant le démarrage ; quai des ambulances	AR-DEV-197 ; ME-006, 007 ; Z-08
Méthodologie PCI, cloisons par phase, classification et fiche synthèse (classes III-IV), équipe pluridisciplinaire	Phase 0 ; avant chaque enceinte	AR-DEV-124, 148, 203 ; CI-PCI-001 à 003, 005
Approbation de la préparation des lieux avant de débiter ; du nettoyage avant démantèlement ; réouverture	Début et fin de chaque zone	AR-DEV-204, 245 ; CI-PCI-023, 024
Travaux bruyants et vibrations : coordination par secteur ; seuils à établir	Avant les travaux des secteurs listés	CI-TAB-011, 012, 022, 025, 028 ; Z-04
Horaires « J », « S », « J/S » des activités classées ; délai de 2 jours ouvrables	Chaque activité du tableau CISSS	CI-TAB-001, 005 à 010, 019 à 021, 024, 027, 029
Configurations des accès : entrée principale, ambulances, cliniques externes, marchandises, roulotte IRM ; préavis 3 semaines par voie déplacée	Avant chaque changement de configuration	AR-PLN-008, 018, 019 ; CI-TAB-013 à 018 ; AR-DEV-139
Fenêtres des unités critiques (hémodialyse, UT-2, autoclaves, médecine nucléaire, PAF BO, bi-blocs, chambre 315) ; inoccupation des chambres 307 et 216 ; gaz médicaux : attestation, présence, deux certifications	Avant chaque coupure ; avant les faces nord et sud de la tour	ME-048, 050, 051, 055, 056, 058, 068, 069, 072, 073, 077, 087, 088, 119

Planche 4 — Option A2 — basiliares avant la tour — ordre des phases

Plan clé recoloré par phase et sous-phase, numéros d'ordre, configurations des accès, issues

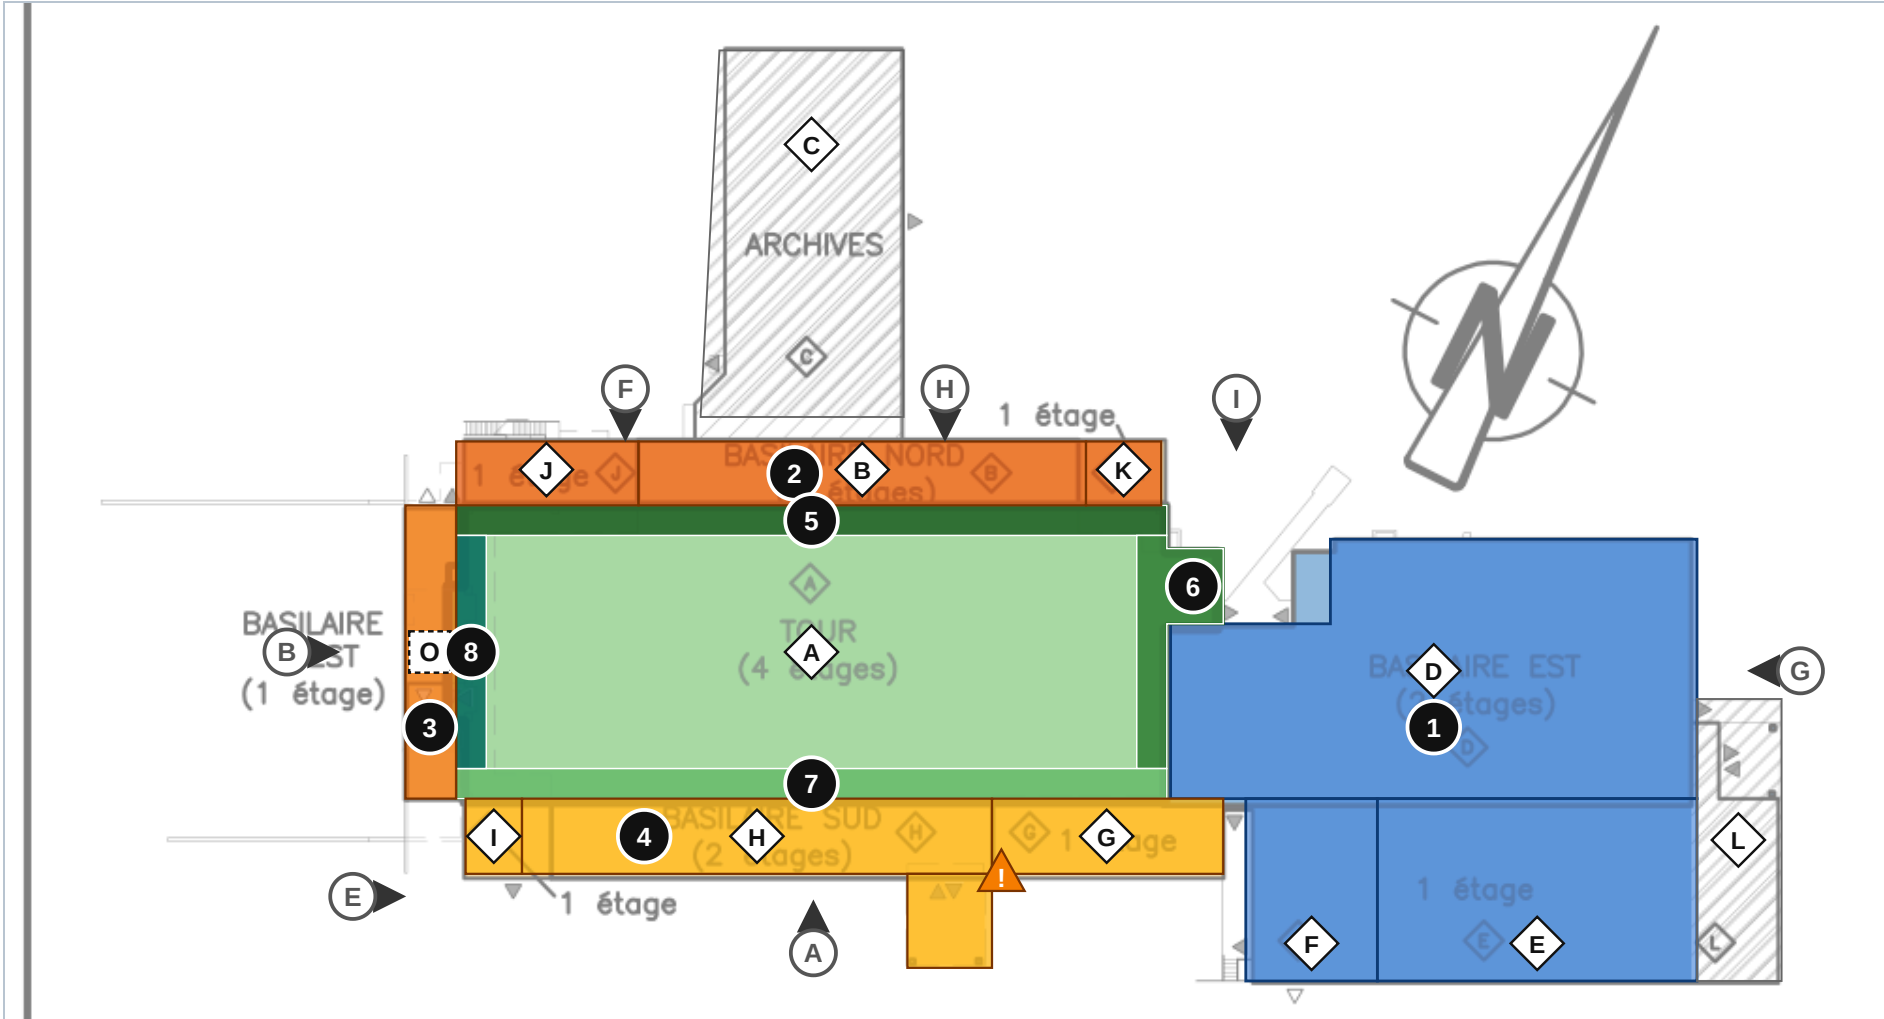

Bleu = phase 1 ; vert clair = tour, ses faces 2.N, 2.E, 2.S, 2.O en bandes vertes ; oranges = 3.N, 3.O, 3.S ; gris hachuré = secteur non touché. Numéros noirs = ordre des phases et sous-phases de cette option. Pictogramme orange : localisation divergente (zone d'ambulance « sud » selon D4/D5, « nord » selon D2).

0 Préalables → 1 Basilaire est → 3 Basiliares : nord → ouest ; sud → 2 Tour : N → E → S → O → 4 Clôture

Fondement : Regrouper les deux basiliares avant la tour [choix] ; aucun texte ne lie la tour aux basiliares ; nord avant ouest [lecture] de ME-065/067. Correction des anomalies après chaque phase, avant la suivante (AR-DEV-275). Repères des architectes sur la feuille 010 : phase 1 « ±5 mois », phase 2 « ±8 mois », phase 3 « ±4 mois » (C-34) — aucun calendrier n'en est déduit.

Issues : nouvelle issue, issues touchées et compensation


Nouvelle issue permanente au laboratoire (zone B, niveau 100) : jalon du calendrier (AR-DEV-058), classe IV horaire « J » (CI-TAB-019), percements hors des heures d'occupation (ME-020). Escalier no 7 des plans de structure présumé être cette issue [à confirmer] (Z-12 ; ST-039 : « basilaire nord-ouest »). Ordre nouvelle issue / condamnation d'une issue existante : non écrit (Z-12, K4) ; variantes sur la planche de séquence.

Issues touchées. Deux issues minimum et capacité d'évacuation maintenue dans les secteurs occupés (AR-DEV-198). Aucune issue condamnée n'est écrite : à chaque issue touchée par une sous-phase, plan d'action préalable (AR-PLN-011), chemin d'évacuation maintenu à 1650 mm (AR-PLN-006) ou escalier d'issue temporaire modulaire incombustible (AR-DEV-311, 195), portes hors service repérées (AR-PLN-007), renvoi à la feuille 002 pour le maintien des issues (AR-PLN-039). Sous-phases qui touchent des issues repérées sur 001/002 [lecture] : porte d'issue de l'urgence et escalier no 1 (ME-146) en 3.S ; portes du laboratoire, du bloc opératoire, de la salle du personnel, escaliers 3, 4, 6 et quai des ambulances (lecteurs de carte déposés, ME-104) selon la face ; issue no 3 vers la toiture 2 (CI-TAB-026).


Ce que l'ordre implique

- Les deux basiliares (phases 1 et 3) sont achevés avant la tour : bandes de toiture périmétriques refaites (AR-PLN-063) avant que l'échafaudage de la tour s'y appuie [lecture] ; voies protégées (AR-PLN-036), entreposage restreint (AR-DEV-102 ; ST-024).
- Prototype en phase 1 (AR-PLN-050).
- Les installations temporaires de la façade ouest (air médical, autoclaves) précèdent le bloc opératoire si celui-ci est sur la tour (ME-045 « façade ouest (tour) ») : quatre systèmes 24/7 sur la même face, à échelonner (K2).
- Aucun texte ne lie la tour aux basiliares : ordre [choix].

Configurations des accès portées par 3.S (feuille 002) : ambulances, deux configurations (AR-PLN-018) ; entrée principale, trois (AR-PLN-019) ; « phase 1/2/3 » = numéros propres à la 002 (C-34)

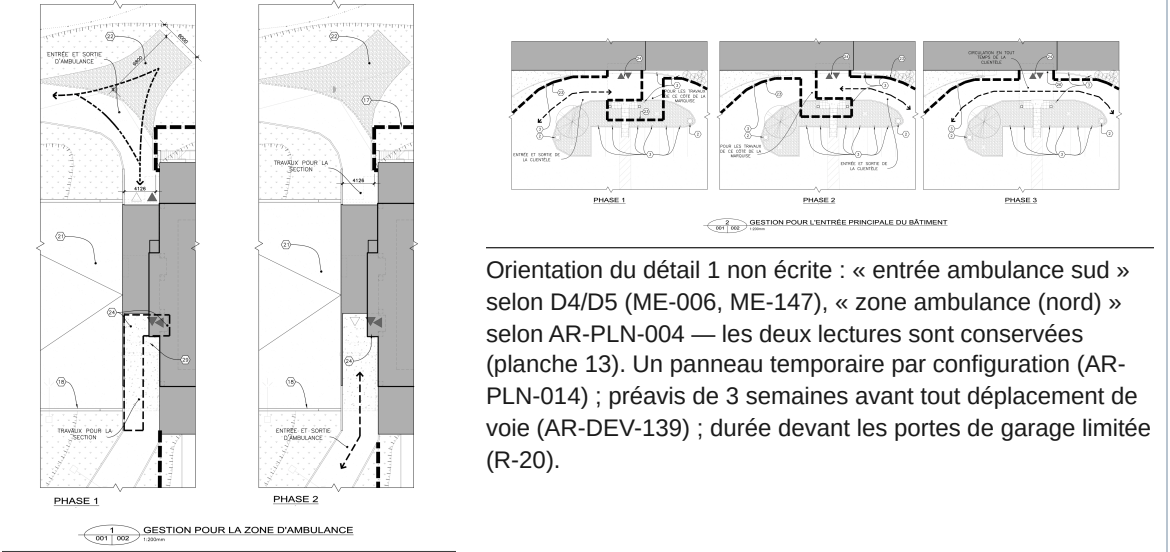

Orientation du détail 1 non écrite : « entrée ambulance sud » selon D4/D5 (ME-006, ME-147), « zone ambulance (nord) » selon AR-PLN-004 — les deux lectures sont conservées (planche 13). Un panneau temporaire par configuration (AR-PLN-014) ; préavis de 3 semaines avant tout déplacement de voie (AR-DEV-139) ; durée devant les portes de garage limitée (R-20).

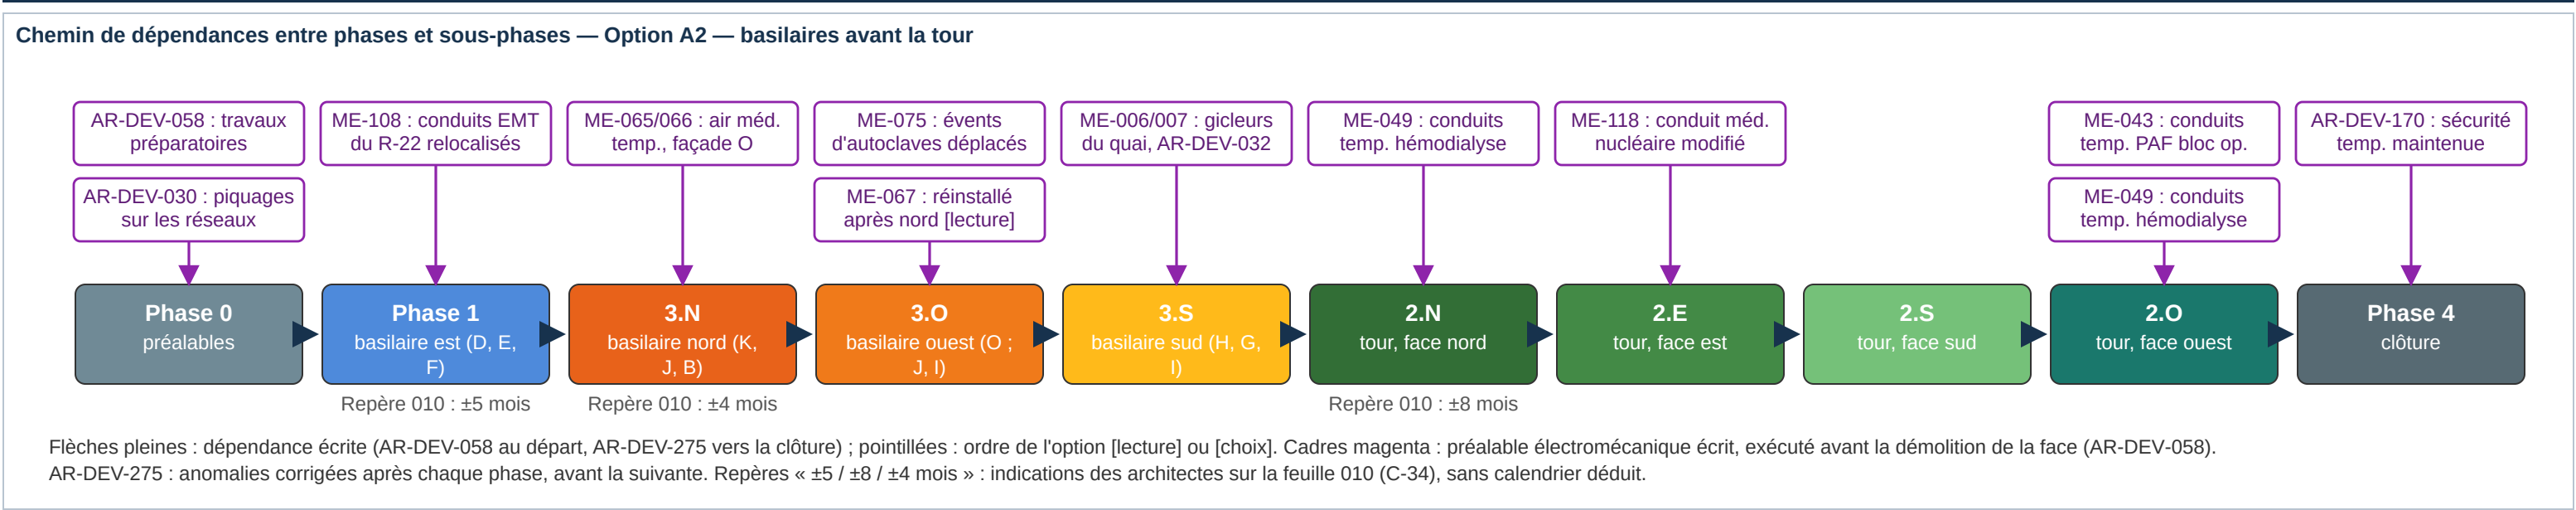


Couche K3 — fenêtres saisonnières applicables			
Fenêtre	Contrainte	Registre	Sous-phases concernées
Novembre à avril	Bâti isolé au lieu du plexiglas pendant les travaux par l'extérieur	AR-PLN-042	toutes les étapes de fenêtres
Hors période estivale	Coupures de l'unité hémodialyse / labo : dimanche seulement	ME-051	2.N, 2.O
Hors période estivale	Bi-bloc traitement d'eau 203 : arrêt court, semaine	ME-087	2 (face ?)
Hors période estivale	Bi-bloc salle des serveurs RC : arrêt court, semaine	ME-088	1
Hors période hivernale	Réinstallation des câbles chauffants des événements	ME-082	3.O (2.O ?)
Béton ≥ 10 °C ; mortiers ≥ 10 °C ; maçonnerie 5 à 50 °C	Réparations de béton, maçonnerie par temps froid (préchauffage, enceintes)	ST-034, 035 ; AR-DEV-304, 309	chaque façade
Couverture ≥ 18 °C (bitume) ou 10 °C (soudé) ; solins > 2 °C	Bandes de toiture périmétriques	AR-DEV-320, 329	chaque toiture
Pare-air > −10 °C ; membrane d'hiver 5 à 40 °C	Pose du pare-air	AR-DEV-316, 317	chaque façade
10 °C dans les zones de travaux ; vitrage : minimum prescrit 24 h	Chauffage temporaire surveillé hors heures	AR-DEV-144, 343, 112	toutes
Contrat : 31 août 2026 – 31 décembre 2027 (CI-CTR-001 ; dates jugées inapplicables en l'état, C-14), soit deux périodes novembre–avril. « Période estivale » non définie (Z-10). K3 : coupures des unités critiques interdites l'été, enveloppe contrainte l'hiver ; sans durée, la répartition n'est pas tranchée.			

Couche K4 — nouvelle issue et issues condamnées	
Nouvelle issue en amont (K4). Le jalon « construction d'une nouvelle issue et protection des issues » (AR-DEV-058) ne dit pas si la nouvelle issue précède la mise hors service d'une issue existante (Z-12). Deux issues minimum et capacité maintenue (AR-DEV-198). V-K4a — nouvelle issue et escalier no 7 exécutés dès la phase 0, avant toute façade : classe IV « J » (CI-TAB-019), câblage souterrain protégé (AR-PLN-013), percements hors heures d'occupation (ME-020). V-K4b — nouvelle issue en séquence dans 3.N ; admissible si aucune issue existante n'est condamnée avant. V-K4c — escalier d'issue temporaire modulaire (AR-DEV-311, 195) à chaque issue condamnée, indépendamment du nouvel escalier. Risque non sourcé : AR-DEV-170 interdit de passer des installations temporaires de sécurité aux permanentes avant l'achèvement substantiel ; le registre ne dit pas si un escalier d'issue temporaire en est une — à confirmer par les professionnels.	

Points de validation CISSS (registre consolidé de 03 §5)		
Point de validation du CISSS	Moment	Registre
Calendrier d'exécution et calendrier d'arrêt des installations approuvés ; tout changement d'horaire	Phase 0, puis à chaque mise à jour	AR-DEV-026, 032, 286 ; CI-CTR-003, 004
Préavis 48 h et approbation avant toute coupure ; calendrier hebdomadaire du jeudi	Avant chaque coupure	AR-DEV-024, 031, 032, 062
Plan de sécurité incendie approuvé (CISSSGA, Établissement, service incendie) ; mise hors service de gicleurs couverte	Avant le démarrage ; quai des ambulances	AR-DEV-197 ; ME-006, 007 ; Z-08
Méthodologie PCI, cloisons par phase, classification et fiche synthèse (classes III-IV), équipe pluridisciplinaire	Phase 0 ; avant chaque enceinte	AR-DEV-124, 148, 203 ; CI-PCI-001 à 003, 005
Approbation de la préparation des lieux avant de débiter ; du nettoyage avant démantèlement ; réouverture	Début et fin de chaque zone	AR-DEV-204, 245 ; CI-PCI-023, 024
Travaux bruyants et vibrations : coordination par secteur ; seuils à établir	Avant les travaux des secteurs listés	CI-TAB-011, 012, 022, 025, 028 ; Z-04
Horaires « J », « S », « J/S » des activités classées ; délai de 2 jours ouvrables	Chaque activité du tableau CISSS	CI-TAB-001, 005 à 010, 019 à 021, 024, 027, 029
Configurations des accès : entrée principale, ambulances, cliniques externes, marchandises, roulotte IRM ; préavis 3 semaines par voie déplacée	Avant chaque changement de configuration	AR-PLN-008, 018, 019 ; CI-TAB-013 à 018 ; AR-DEV-139
Fenêtres des unités critiques (hémodialyse, UT-2, autoclaves, médecine nucléaire, PAF BO, bi-blocs, chambre 315) ; inoccupation des chambres 307 et 216 ; gaz médicaux : attestation, présence, deux certifications	Avant chaque coupure ; avant les faces nord et sud de la tour	ME-048, 050, 051, 055, 056, 058, 068, 069, 072, 073, 077, 087, 088, 119

Planche 7 — Option A3 — tour d'abord — ordre des phases

Plan clé recoloré par phase et sous-phase, numéros d'ordre, configurations des accès, issues

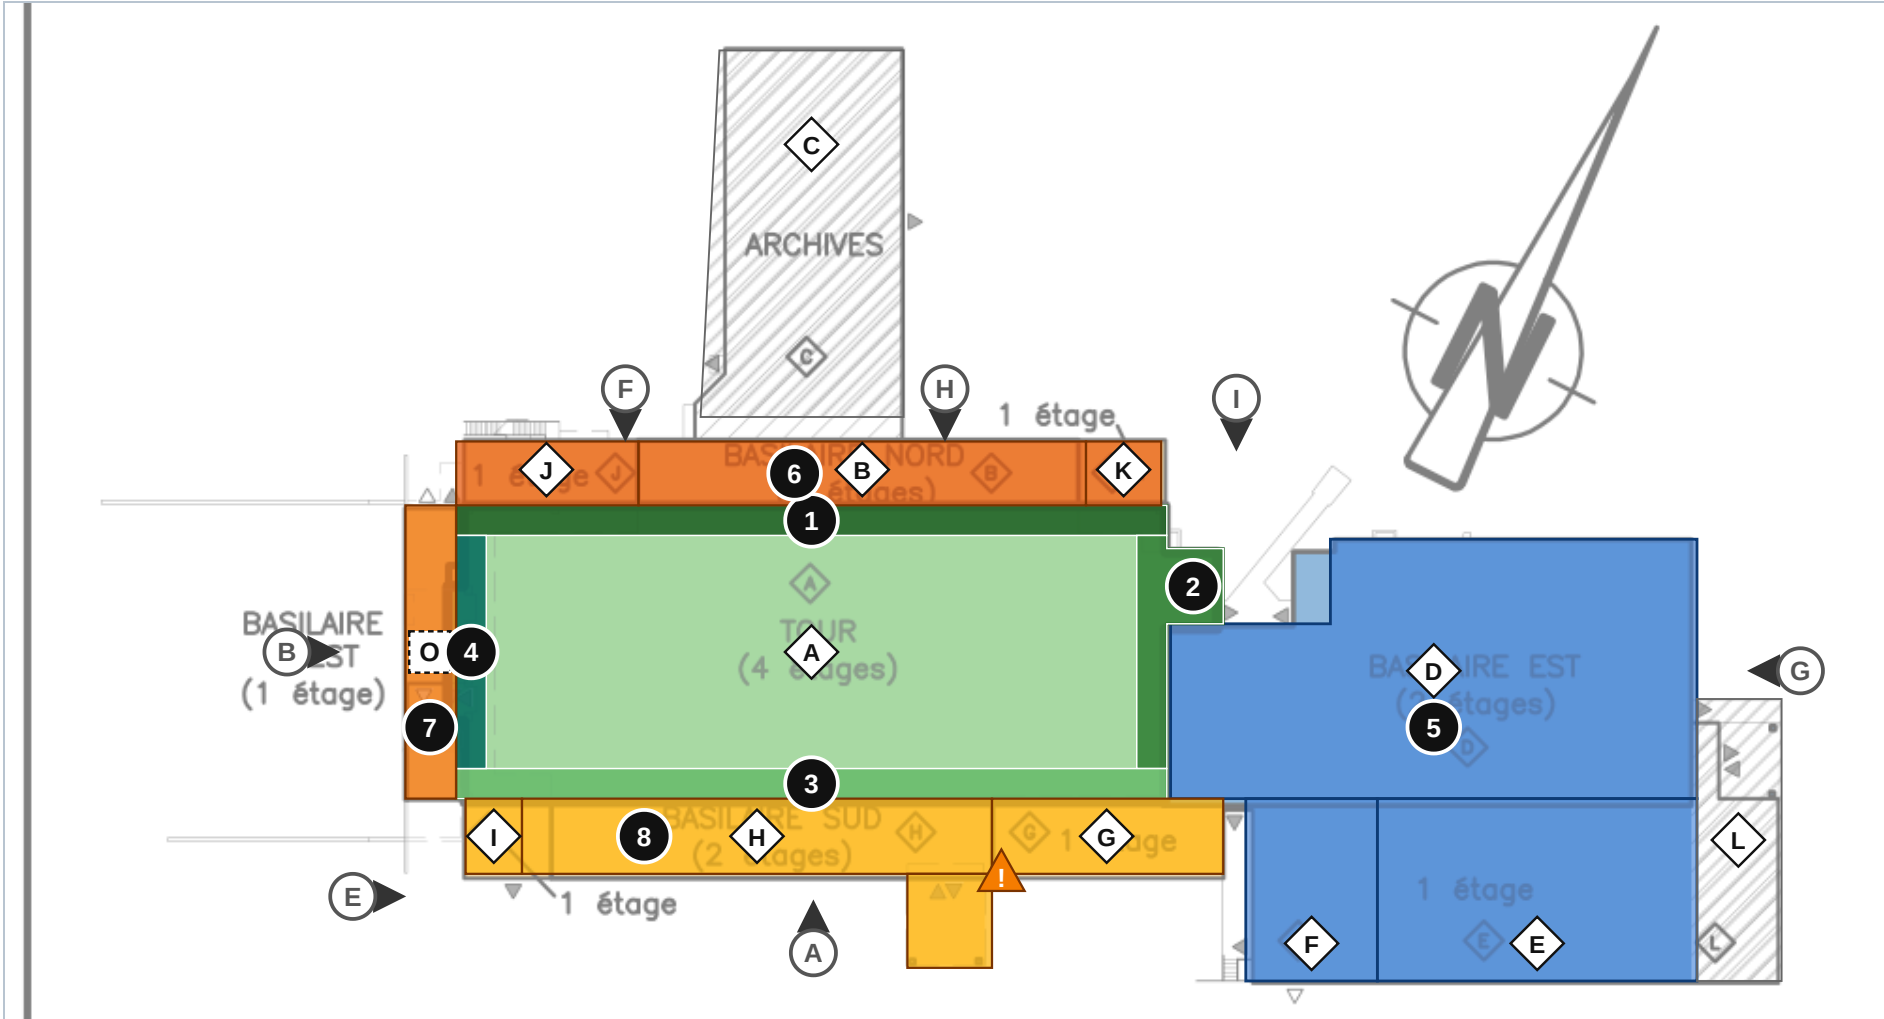

Bleu = phase 1 ; vert clair = tour, ses faces 2.N, 2.E, 2.S, 2.O en bandes vertes ; oranges = 3.N, 3.O, 3.S ; gris hachuré = secteur non touché. Numéros noirs = ordre des phases et sous-phases de cette option. Pictogramme orange : localisation divergente (zone d'ambulance « sud » selon D4/D5, « nord » selon D2).

0 Préalables → 2 Tour : N → E → S → O → 1 Basilaire est → 3 Basilaires : nord → ouest ; sud → 4 Clôture

Fondement : Tour d'abord [choix] ; prototype de fenêtre et de mur-rideau alors dans la tour (AR-PLN-050) ; échafaudage de la tour sur des toitures non refaites [lecture]. Correction des anomalies après chaque phase, avant la suivante (AR-DEV-275). Repères des architectes sur la feuille 010 : phase 1 « ±5 mois », phase 2 « ±8 mois », phase 3 « ±4 mois » (C-34) — aucun calendrier n'en est déduit.

Issues : nouvelle issue, issues touchées et compensation


Nouvelle issue permanente au laboratoire (zone B, niveau 100) : jalon du calendrier (AR-DEV-058), classe IV horaire « J » (CI-TAB-019), percements hors des heures d'occupation (ME-020). Escalier no 7 des plans de structure présumé être cette issue [à confirmer] (Z-12 ; ST-039 : « basilaire nord-ouest »). Ordre nouvelle issue / condamnation d'une issue existante : non écrit (Z-12, K4) ; variantes sur la planche de séquence.

Issues touchées. Deux issues minimum et capacité d'évacuation maintenue dans les secteurs occupés (AR-DEV-198). Aucune issue condamnée n'est écrite : à chaque issue touchée par une sous-phase, plan d'action préalable (AR-PLN-011), chemin d'évacuation maintenu à 1650 mm (AR-PLN-006) ou escalier d'issue temporaire modulaire incombustible (AR-DEV-311, 195), portes hors service repérées (AR-PLN-007), renvoi à la feuille 002 pour le maintien des issues (AR-PLN-039). Sous-phases qui touchent des issues repérées sur 001/002 [lecture] : porte d'issue de l'urgence et escalier no 1 (ME-146) en 3.S ; portes du laboratoire, du bloc opératoire, de la salle du personnel, escaliers 3, 4, 6 et quai des ambulances (lecteurs de carte déposés, ME-104) selon la face ; issue no 3 vers la toiture 2 (CI-TAB-026).


Ce que l'ordre implique

- Prototype dans la tour (AR-PLN-050 : « première fenêtre et premier mur-rideau »).
- Échafaudage de la tour sur des toitures non refaites [lecture] : garde-corps maintenus (AR-DEV-100), voies protégées (AR-PLN-036), capacités et attestation (ST-023 à 026).
- Coupures de l'hémodialyse dès le début du projet, un dimanche hors période estivale (ME-051) : voir la couche saisons de la planche de séquence.
- Aucun texte n'impose la tour en premier : ordre [choix].

Configurations des accès portées par 3.S (feuille 002) : ambulances, deux configurations (AR-PLN-018) ; entrée principale, trois (AR-PLN-019) ; « phase 1/2/3 » = numéros propres à la 002 (C-34)

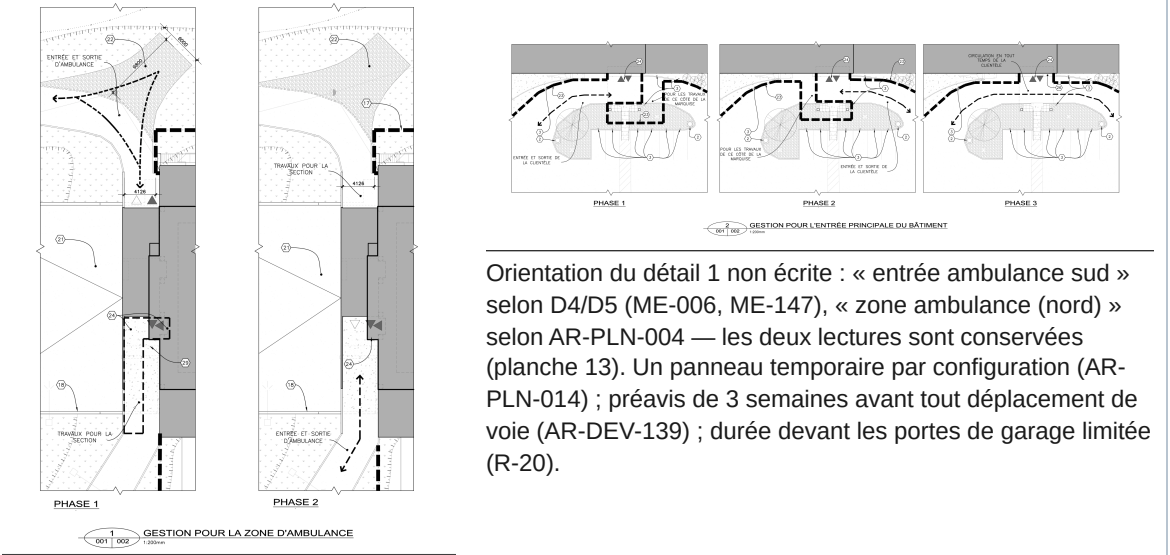

Orientation du détail 1 non écrite : « entrée ambulance sud » selon D4/D5 (ME-006, ME-147), « zone ambulance (nord) » selon AR-PLN-004 — les deux lectures sont conservées (planche 13). Un panneau temporaire par configuration (AR-PLN-014) ; préavis de 3 semaines avant tout déplacement de voie (AR-DEV-139) ; durée devant les portes de garage limitée (R-20).

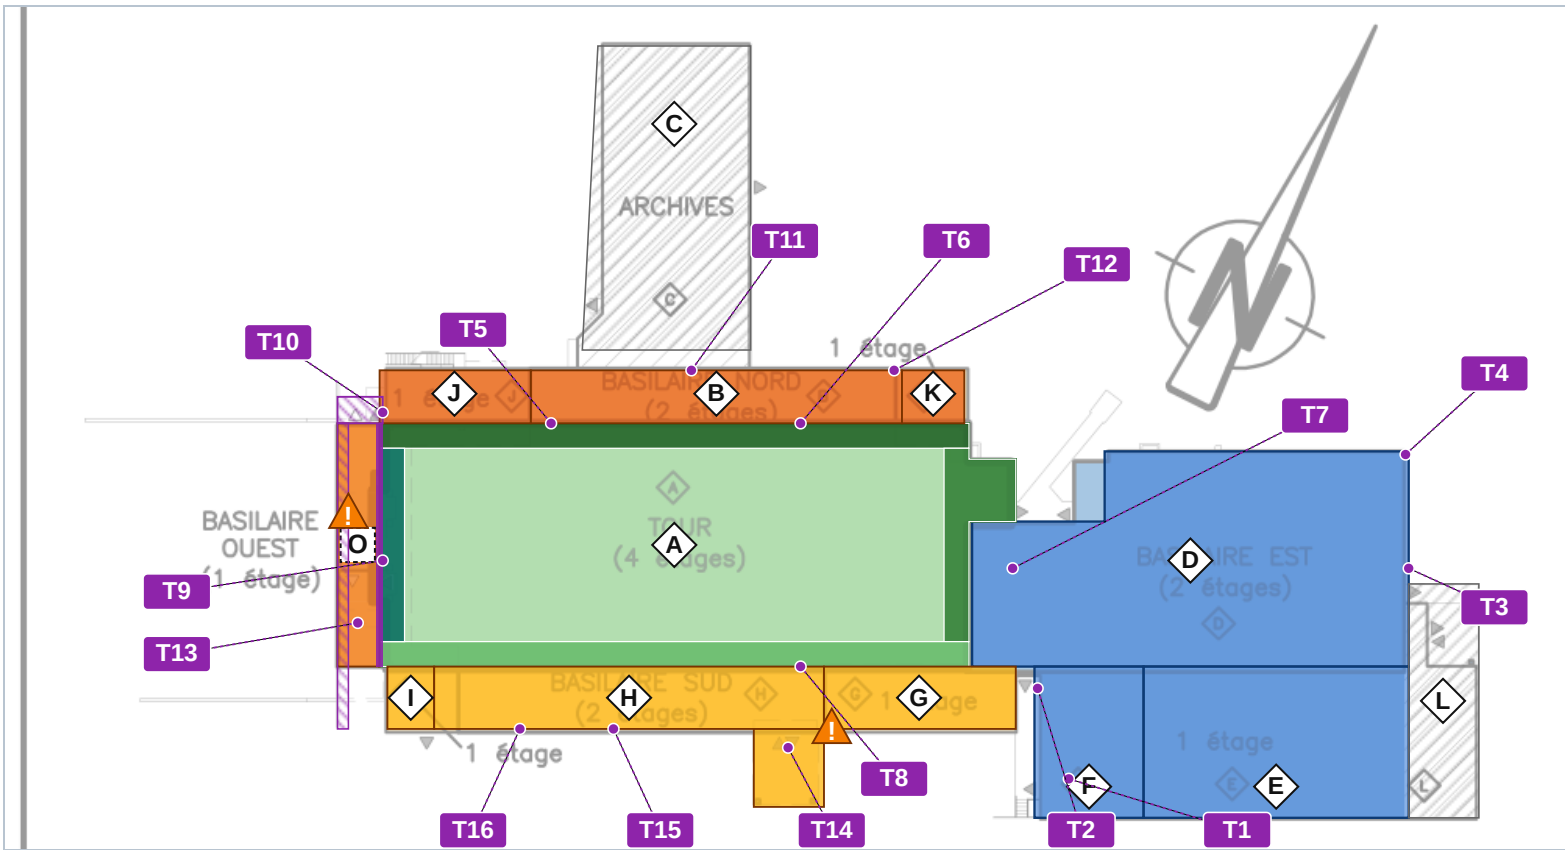

Étiquettes T1 à T16 (magenta) : installations et mesures temporaires ; le point marque la face écrite au registre ; identifiants au tableau de droite. Hachures magenta : façade ouest, où le registre place l'air médical temporaire (ME-065), les conduits du bloc opératoire (ME-047) et les événements d'autoclaves (ME-075). Pictogramme près de T9 : tour ou basilaire non écrit.

Installations temporaires électromécaniques et mesures propres aux sous-phases (fiches de 03 §2.2 à §2.4 ou §3.2 à §3.4)


Code	Sous-phase	Installation ou mesure temporaire	Registre
T1	1	IRM : volets coupe-feu de fenêtre, gicleur R-34 remplacé ; métal interdit quand l'IRM est en service	ME-010, 109, 110 ; AR-PLN-009 ; CI-TAB-009
T2	1	Local R-22 : conduits EMT relocalisés avant les renforts A4-A6 (classe IV, J/S)	ME-108, 111 ; CI-TAB-010
T3	1	Salle des serveurs RC : arrêt court, semaine, hors été ; bi-bloc LG remis en marche	ME-088, 086
T4	1	IRM mobile : sorties d'arrosage protégées, alcôve dans le revêtement	ME-116
T5	2.N	Hémodialyse / labo niv. 200 : conduits temporaires AVANT démolition ; coupures dimanche hors été	ME-049 à 051
T6	2.N	Chambre 216 : conduit RAV prolongé hors échafaudages	ME-057
T7	2.E	Hotte de médecine nucléaire : conduit modifié sur toute la hauteur ; arrêt vendredi-dimanche	ME-118, 119
T8	2.S	Chambre 307 : démantèlement si inoccupée, conduit prolongé, grillage ; sectionneurs de thermopompes déposés	ME-056, 107
T9	2.O	PAF bloc opératoire : 2 conduits temporaires AVANT démantèlement ; nouveau conduit APRÈS revêtement ; glycol déposé	ME-042 à 048, 084
T10	3.N	Air médical : prise et HEPA temporaires SUR LA FAÇADE OUEST pendant la façade nord ; bonbonnes ; 1re certification	ME-064 à 069, 072, 073
T11	3.N	Nouvelle issue du laboratoire, escalier no 7 : jalon ; classe IV « J » ; deux issues minimum maintenues	AR-DEV-058, 198 ; AR-PLN-064 ; ST-039 ; CI-TAB-019
T12	3.N	Laboratoire : sortie d'air par conduit temporaire hors échafaudages ; filtration V-53	ME-059 à 061
T13	3.O	Événements d'autoclaves relocalisés AVANT la façade ouest, temporaires en toiture jusqu'au coin sud-ouest ; nuit ou avant 10 h	ME-075 à 083
T14	3.S	Quai des ambulances : gicleurs hors service 2 x 2 h, glycol ; enseigne ; caméra	ME-006 à 008, 145 à 147
T15	3.S	Entrée principale : trois configurations autour de la marquise ; plan d'action d'évacuation	AR-PLN-008, 019 ; CI-TAB-014
T16	3.S	Persienne UT-2 : coupure rapide nuit ou fin de semaine ; bi-bloc GREE de l'urgence	ME-055, 085, 090

Les sous-phases du découpage B sont celles de l'affectation de 03 (annexe A) ; « B » et « C » sans numéro : niveau écrit, sous-phase non écrite.

Matrice phase × système électromécanique — colonnes dans l'ordre de l'option

Système (registre)	0	2.N	2.E	2.S	2.O	1	3.N	3.O	3.S	4
Gicleurs du quai des ambulances (ME-006 à 008)	M	M	M	M	M	M	M	M	C 2×2 h	M
Gicleurs des zones de plafond (ME-009 à 012)	M	M	M	M	M	I R-34	M	M	P	M
Alarme incendie (ME-091 à 095, 097)	M	M	M	M	M	M	M+issue	M	P détect.	cert.
PAF bloc opératoire, glycol (ME-042 à 048, 084)	M	M	M	M	P? C nuit	M	M	P?	M	mise en serv.
Événements d'autoclaves, câbles chauffants (ME-075 à 083)	M	M	M	M	P?	M	M	C → P → M	M	M
Air médical (ME-064 à 074)	M	M?	M	M	M?	M	P+cert.	P → M	M	cert.
Hémodialyse / labo niv. 200 (ME-049 à 054)	M	P ; C dim.	M	M	P ; C dim.	M	M	M	M	M
Chambres 216 et 307 (ME-057, 056)	M	P (216)	M	C → P (307)	M	M	M	M	M	M
Tour, face non écrite : bi-bloc 203 (ME-087), chambre 315 (ME-058), service alimentaire SS (CI-TAB-005)	M	C? I?	C? I?	C? I?	C? I?	M	M	M	M	M
Hotte de médecine nucléaire (ME-117 à 119)	M	M	C → P	M	M	M	M	M	M	M
UT-2 et bi-bloc GREE de l'urgence (ME-055, 085, 090)	M	M	M	M	M	M	M	M	C → P	M
Évacuations du laboratoire, V-53 (ME-059 à 061)	M	M	M	M	M	M	P	M	M	M
Bi-blocs est : serveurs RC, LG (ME-086, 088)	M	M	M?	M	M	C ; C → P	M	M	M	M
Caméra, détecteur, contrôle d'accès, enseigne (ME-099, 145 à 147)	M	M	M	M	M	M	M+KT-1	M	P ; C	M
Lecteurs, luminaires, persiennes non touchées (ME-063, 104 à 106)	M	P → M	P → M	P → M	P → M	P → M	P → M	P → M	P → M	M



C coupure (fenêtre : tableau de droite) · P provisoire · I intervention classée · M maintenu · ? localisation non écrite · → états successifs · cert. certification. Source : 03 §2.8 (A) ou §3.6 (B).

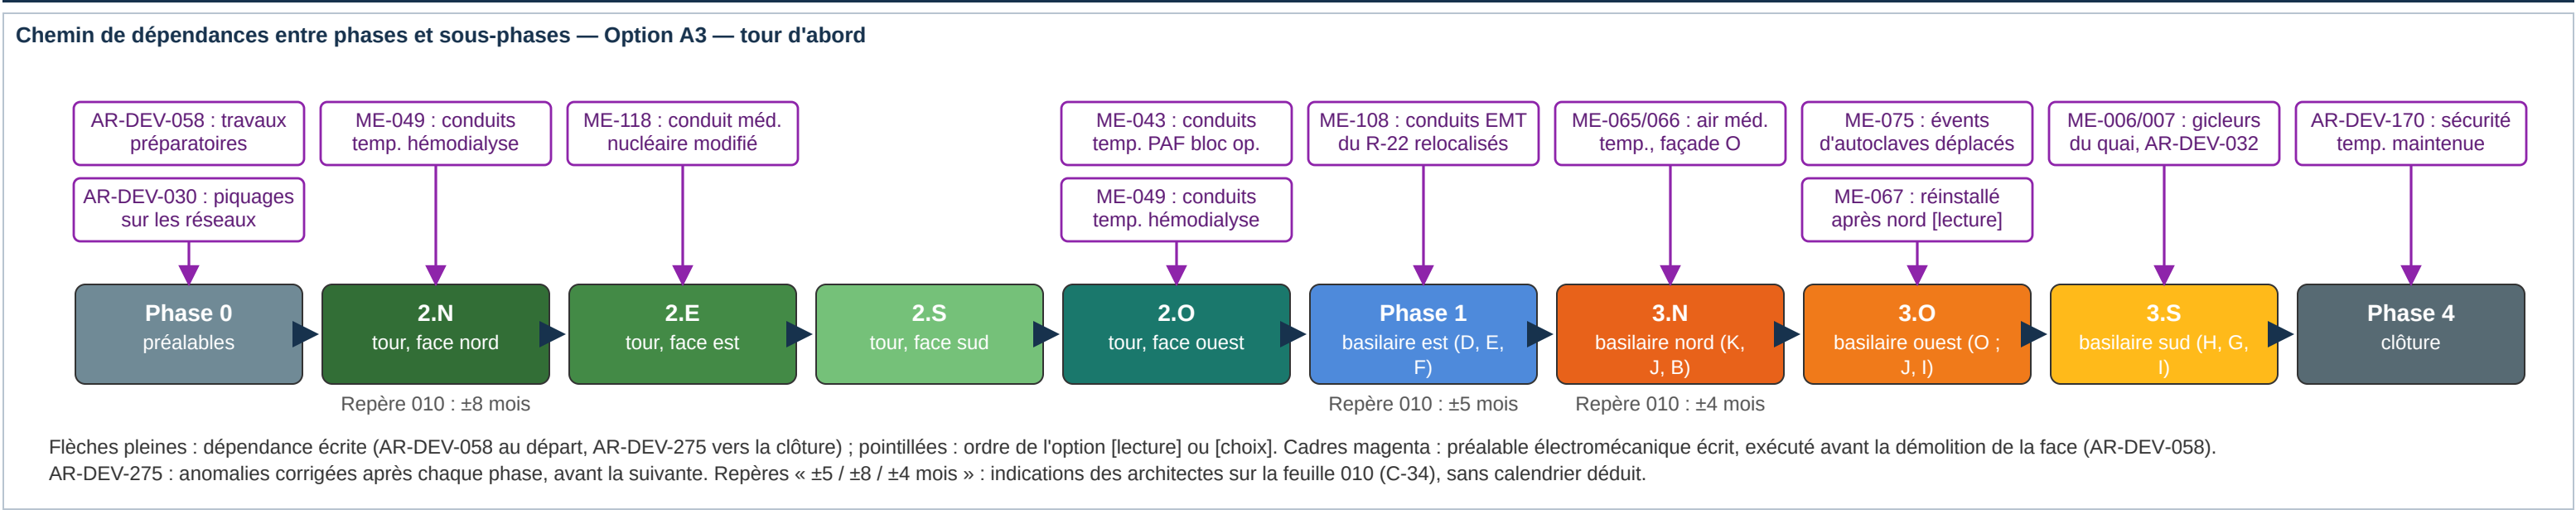


Couche K3 — fenêtres saisonnières applicables			
Fenêtre	Contrainte	Registre	Sous-phases concernées
Novembre à avril	Bâti isolé au lieu du plexiglas pendant les travaux par l'extérieur	AR-PLN-042	toutes les étapes de fenêtres
Hors période estivale	Coupures de l'unité hémodialyse / labo : dimanche seulement	ME-051	2.N, 2.O
Hors période estivale	Bi-bloc traitement d'eau 203 : arrêt court, semaine	ME-087	2 (face ?)
Hors période estivale	Bi-bloc salle des serveurs RC : arrêt court, semaine	ME-088	1
Hors période hivernale	Réinstallation des câbles chauffants des événements	ME-082	3.O (2.O ?)
Béton ≥ 10 °C ; mortiers ≥ 10 °C ; maçonnerie 5 à 50 °C	Réparations de béton, maçonnerie par temps froid (préchauffage, enceintes)	ST-034, 035 ; AR-DEV-304, 309	chaque façade
Couverture ≥ 18 °C (bitume) ou 10 °C (soudé) ; solins > 2 °C	Bandes de toiture périmétriques	AR-DEV-320, 329	chaque toiture
Pare-air > −10 °C ; membrane d'hiver 5 à 40 °C	Pose du pare-air	AR-DEV-316, 317	chaque façade
10 °C dans les zones de travaux ; vitrage : minimum prescrit 24 h	Chauffage temporaire surveillé hors heures	AR-DEV-144, 343, 112	toutes
Contrat : 31 août 2026 – 31 décembre 2027 (CI-CTR-001 ; dates jugées inapplicables en l'état, C-14), soit deux périodes novembre–avril. « Période estivale » non définie (Z-10). K3 : coupures des unités critiques interdites l'été, enveloppe contrainte l'hiver ; sans durée, la répartition n'est pas tranchée.			


Couche K4 — nouvelle issue et issues condamnées	
Nouvelle issue en amont (K4). Le jalon « construction d'une nouvelle issue et protection des issues » (AR-DEV-058) ne dit pas si la nouvelle issue précède la mise hors service d'une issue existante (Z-12). Deux issues minimum et capacité maintenue (AR-DEV-198).	
V-K4a — nouvelle issue et escalier no 7 exécutés dès la phase 0, avant toute façade : classe IV « J » (CI-TAB-019), câblage souterrain protégé (AR-PLN-013), percements hors heures d'occupation (ME-020).	
V-K4b — nouvelle issue en séquence dans 3.N ; admissible si aucune issue existante n'est condamnée avant.	
V-K4c — escalier d'issue temporaire modulaire (AR-DEV-311, 195) à chaque issue condamnée, indépendamment du nouvel escalier.	
Risque non sourcé : AR-DEV-170 interdit de passer des installations temporaires de sécurité aux permanentes avant l'achèvement substantiel ; le registre ne dit pas si un escalier d'issue temporaire en est une — à confirmer par les professionnels.	

Points de validation CISSS (registre consolidé de 03 §5)		
Point de validation du CISSS	Moment	Registre
Calendrier d'exécution et calendrier d'arrêt des installations approuvés ; tout changement d'horaire	Phase 0, puis à chaque mise à jour	AR-DEV-026, 032, 286 ; CI-CTR-003, 004
Préavis 48 h et approbation avant toute coupure ; calendrier hebdomadaire du jeudi	Avant chaque coupure	AR-DEV-024, 031, 032, 062
Plan de sécurité incendie approuvé (CISSSGA, Établissement, service incendie) ; mise hors service de gicleurs couverte	Avant le démarrage ; quai des ambulances	AR-DEV-197 ; ME-006, 007 ; Z-08
Méthodologie PCI, cloisons par phase, classification et fiche synthèse (classes III-IV), équipe pluridisciplinaire	Phase 0 ; avant chaque enceinte	AR-DEV-124, 148, 203 ; CI-PCI-001 à 003, 005
Approbation de la préparation des lieux avant de débiter ; du nettoyage avant démantèlement ; réouverture	Début et fin de chaque zone	AR-DEV-204, 245 ; CI-PCI-023, 024
Travaux bruyants et vibrations : coordination par secteur ; seuils à établir	Avant les travaux des secteurs listés	CI-TAB-011, 012, 022, 025, 028 ; Z-04
Horaires « J », « S », « J/S » des activités classées ; délai de 2 jours ouvrables	Chaque activité du tableau CISSS	CI-TAB-001, 005 à 010, 019 à 021, 024, 027, 029
Configurations des accès : entrée principale, ambulances, cliniques externes, marchandises, roulotte IRM ; préavis 3 semaines par voie déplacée	Avant chaque changement de configuration	AR-PLN-008, 018, 019 ; CI-TAB-013 à 018 ; AR-DEV-139
Fenêtres des unités critiques (hémodialyse, UT-2, autoclaves, médecine nucléaire, PAF BO, bi-blocs, chambre 315) ; inoccupation des chambres 307 et 216 ; gaz médicaux : attestation, présence, deux certifications	Avant chaque coupure ; avant les faces nord et sud de la tour	ME-048, 050, 051, 055, 056, 058, 068, 069, 072, 073, 077, 087, 088, 119

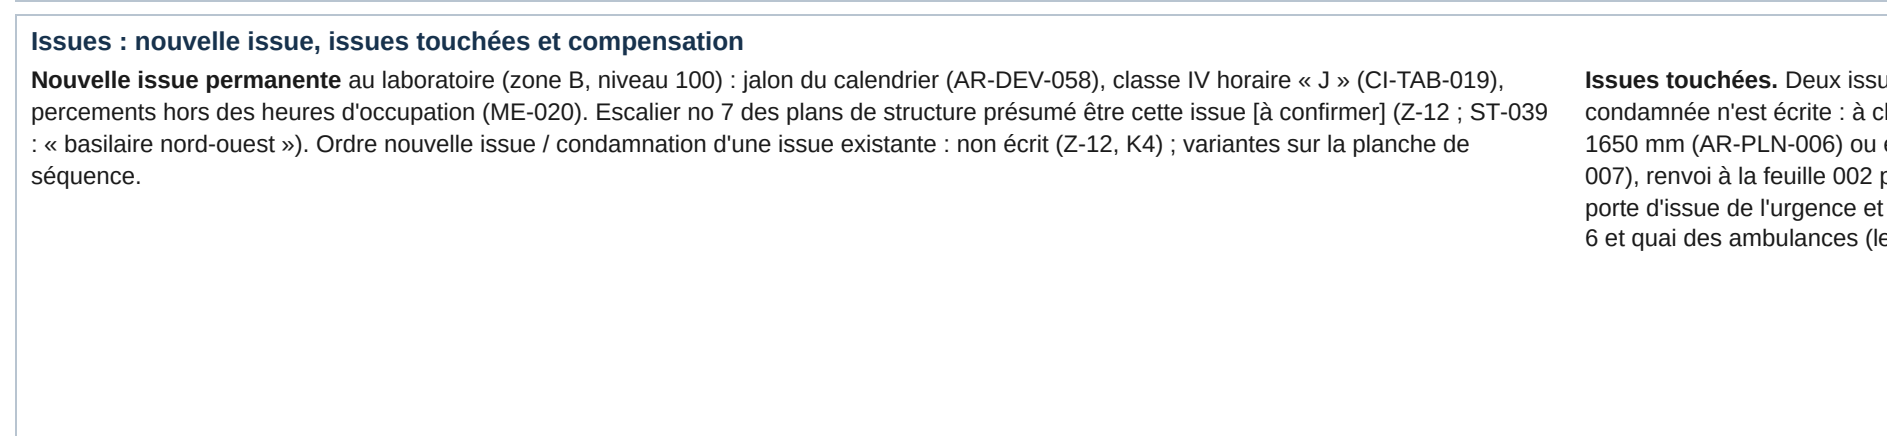

Configurations des accès portées par A.1 (RC, extérieur) (feuille 002) : ambulances, deux configurations (AR-PLN-018) ; entrée principale, trois (AR-PLN-019) ; « phase 1/2/3 » = numéros propres à la 002 (C-34)



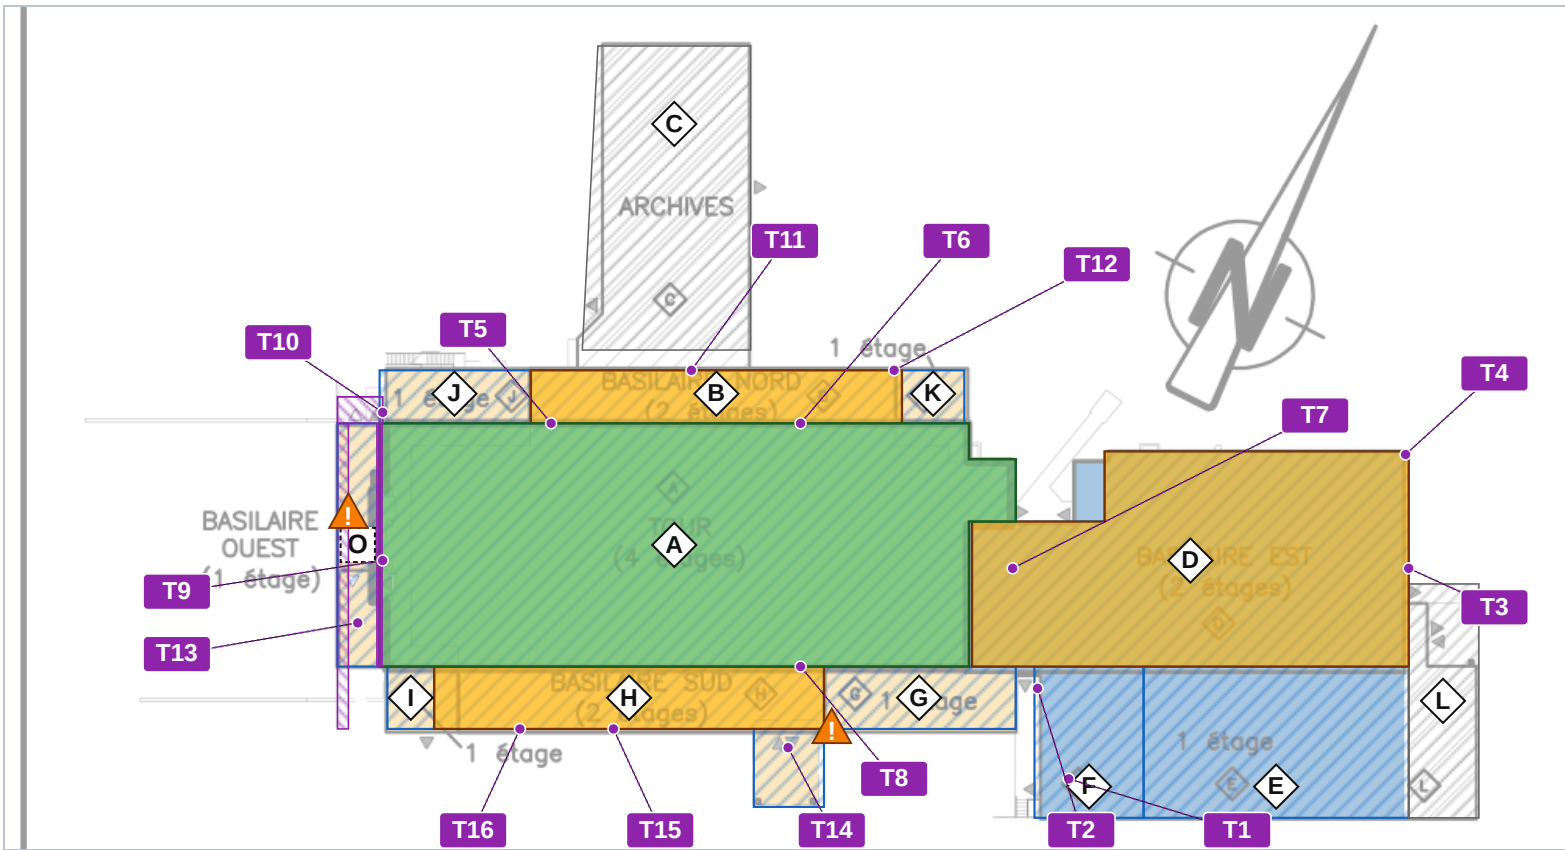

Étiquettes T1 à T16 (magenta) : installations et mesures temporaires ; le point marque la face écrite au registre ; identifiants au tableau de droite. Hachures magenta : façade ouest, où le registre place l'air médical temporaire (ME-065), les conduits du bloc opératoire (ME-047) et les événements d'autoclaves (ME-075). Pictogramme près de T9 : tour ou basilaire non écrit.

Installations temporaires électromécaniques et mesures propres aux sous-phases (fiches de 03 §2.2 à §2.4 ou §3.2 à §3.4)


Code	Sous-phase	Installation ou mesure temporaire	Registre
T1	A.6	IRM : volets coupe-feu de fenêtre, gicleur R-34 remplacé ; métal interdit quand l'IRM est en service	ME-010, 109, 110 ; AR-PLN-009 ; CI-TAB-009
T2	A.6	Local R-22 : conduits EMT relocalisés avant les renforts A4-A6 (classe IV, J/S)	ME-108, 111 ; CI-TAB-010
T3	A	Salle des serveurs RC : arrêt court, semaine, hors été ; bi-bloc LG remis en marche	ME-088, 086
T4	A.1	IRM mobile : sorties d'arrosage protégées, alcôve dans le revêtement	ME-116
T5	C.2	Hémodialyse / labo niv. 200 : conduits temporaires AVANT démolition ; coupures dimanche hors été	ME-049 à 051
T6	C.2	Chambre 216 : conduit RAV prolongé hors échafaudages	ME-057
T7	C	Hotte de médecine nucléaire : conduit modifié sur toute la hauteur ; arrêt vendredi-dimanche	ME-118, 119
T8	C.4	Chambre 307 : démantèlement si inoccupée, conduit prolongé, grillage ; sectionneurs de thermopompes déposés	ME-056, 107
T9	B-C	PAF bloc opératoire : 2 conduits temporaires AVANT démantèlement ; nouveau conduit APRÈS revêtement ; glycol déposé	ME-042 à 048, 084
T10	B	Air médical : prise et HEPA temporaires SUR LA FAÇADE OUEST pendant la façade nord ; bonbonnes ; 1re certification	ME-064 à 069, 072, 073
T11	B.1.2	Nouvelle issue du laboratoire, escalier no 7 : jalon ; classe IV « J » ; deux issues minimum maintenues	AR-DEV-058, 198 ; AR-PLN-064 ; ST-039 ; CI-TAB-019
T12	B	Laboratoire : sortie d'air par conduit temporaire hors échafaudages ; filtration V-53	ME-059 à 061
T13	B	Événements d'autoclaves relocalisés AVANT la façade ouest, temporaires en toiture jusqu'au coin sud-ouest ; nuit ou avant 10 h	ME-075 à 083
T14	A.1	Quai des ambulances : gicleurs hors service 2 x 2 h, glycol ; enseigne ; caméra	ME-006 à 008, 145 à 147
T15	A.1	Entrée principale : trois configurations autour de la marquise ; plan d'action d'évacuation	AR-PLN-008, 019 ; CI-TAB-014
T16	B	Persienne UT-2 : coupure rapide nuit ou fin de semaine ; bi-bloc GREE de l'urgence	ME-055, 085, 090

Les sous-phases du découpage B sont celles de l'affectation de 03 (annexe A) ; « B » et « C » sans numéro : niveau écrit, sous-phase non écrite.

Matrice phase × système électromécanique — colonnes dans l'ordre de l'option

Système (registre)	0	B-A	B-B	B-C	4
Gicleurs du quai des ambulances (ME-006 à 008)	M	C 2×2 h (A.1)	M	M	M
Alarme incendie (ME-091 à 095, 097)	M	M	M+issue ; P détect.	M	cert.
PAF bloc opératoire, glycol (ME-042 à 048, 084)	M	P?	P?	P (« tour »)	mise en serv.
Événements d'autoclaves, câbles chauffants (ME-075 à 083)	M	P?	P ; C nuit ; hors hiver	M	M
Air médical (ME-064 à 074)	M	M	P+cert. (tour ?)	M?	cert.
Hémodialyse / labo niv. 200 (ME-049 à 054)	M	M	M	P ; C dim. (C.2)	M
Chambres 216 et 307 (ME-057, 056)	M	M	M	P (C.2) ; C → P (C.4)	M
Tour : bi-bloc 203 (ME-087), chambre 315 (ME-058)	M	M	M	C semaine (C.2) ; I (C.4)	M
Hotte de médecine nucléaire (ME-117 à 119)	M	M	M	C → P	M
UT-2 chirurgie d'un jour (ME-055)	M	M	C → P	M	M
Évacuations du laboratoire, V-53 (ME-059 à 061)	M	M	P	M	M
Sous-sol : service alimentaire (CI-TAB-005 ; ME-025, 029), atelier S17 (ME-062)	M	M	I (B.1.2) ; C durée du secteur	M	M
Bi-blocs est : serveurs RC, LG (ME-086, 088)	M	C ; C → P	M	M	M
Bi-bloc GREE de l'urgence (ME-085, 090)	M	C → P → M	M	M	M
Caméra, détecteur, contrôle d'accès, enseigne (ME-099, 145 à 147)	M	P ; C (A.1)	M+KT-1	M	M
Volets coupe-feu (AR-PLN-056, 057) ; lecteurs, luminaires, persiennes non touchées (ME-063, 104 à 106)	M	I (A.6) ; P → M	I ; P → M	I ; P → M	M

C coupure (fenêtre : tableau de droite) · P provisoire · I intervention classée · M maintenu · ? localisation non écrite · → états successifs · cert. certification. Source : 03 §2.8 (A) ou §3.6 (B).

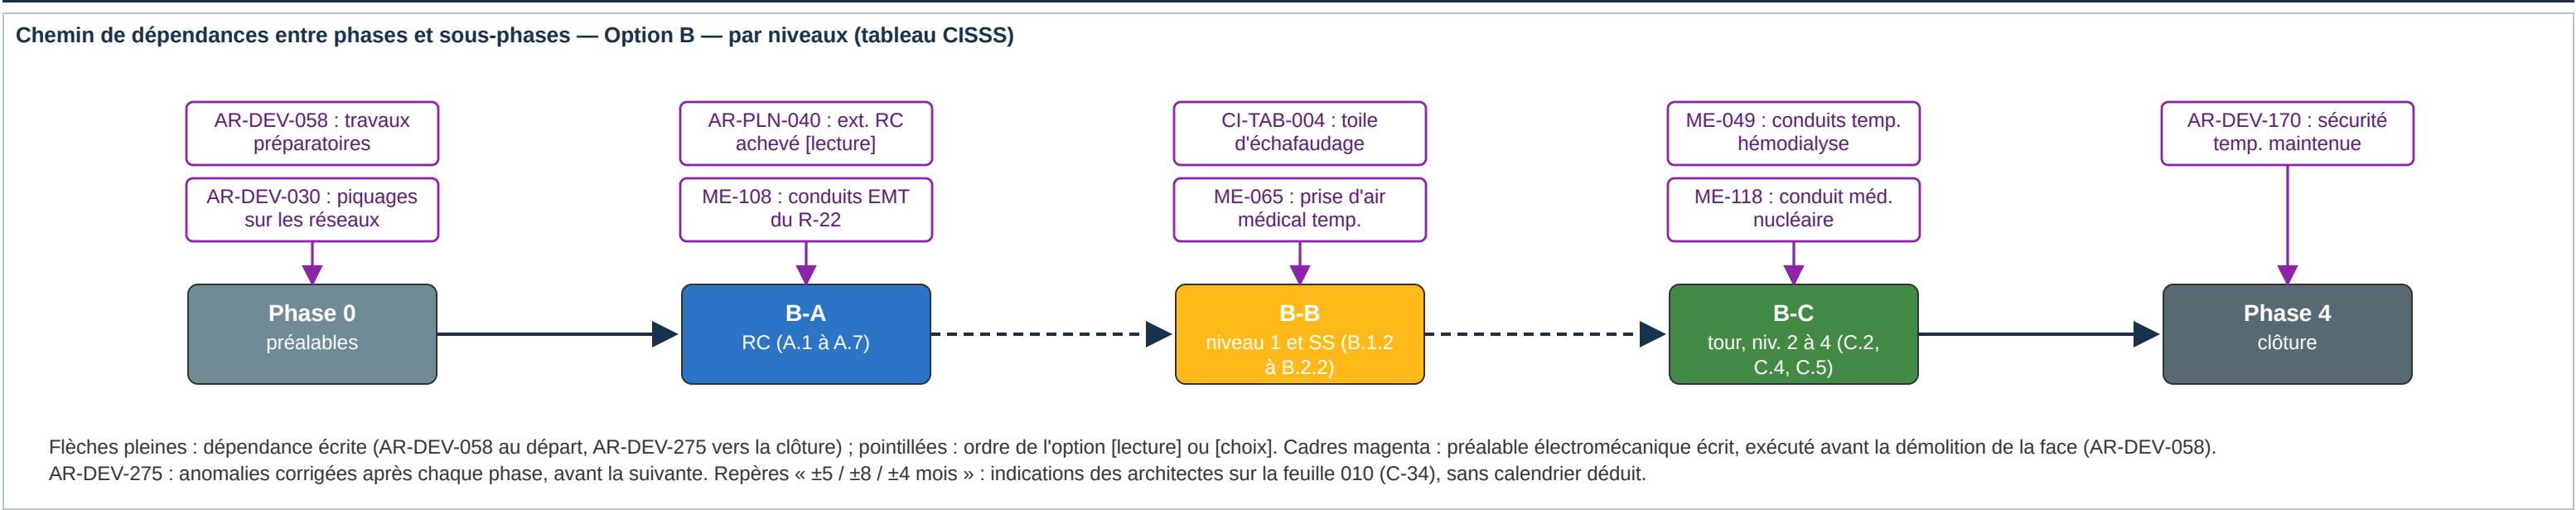

Couche K3 — fenêtres saisonnières applicables			
Fenêtre	Contrainte	Registre	Sous-phases concernées
Novembre à avril	Bâti isolé au lieu du plexiglas pendant les travaux par l'extérieur	AR-PLN-042	A.2 à A.6, B.1.x, B.2.x, C.x
Hors période estivale	Coupures de l'unité hémodialyse / labo : dimanche seulement	ME-051	C.2
Hors période estivale	Bi-bloc traitement d'eau 203 : arrêt court, semaine	ME-087	C.2
Hors période estivale	Bi-bloc salle des serveurs RC : arrêt court, semaine	ME-088	B-A
Hors période hivernale	Réinstallation des câbles chauffants des événements	ME-082	B-B
Béton ≥ 10 °C ; mortiers ≥ 10 °C ; maçonnerie 5 à 50 °C	Réparations de béton, maçonnerie par temps froid (préchauffage, enceintes)	ST-034, 035 ; AR-DEV-304, 309	toutes
Couverture ≥ 18 °C (bitume) ou 10 °C (soudé) ; solins > 2 °C	Bandes de toiture périmétriques	AR-DEV-320, 329	toutes
Pare-air > -10 °C ; membrane d'hiver 5 à 40 °C	Pose du pare-air	AR-DEV-316, 317	toutes
10 °C dans les zones de travaux ; vitrage : minimum prescrit 24 h	Chauffage temporaire surveillé hors heures	AR-DEV-144, 343, 112	toutes
Contrat : 31 août 2026 – 31 décembre 2027 (CI-CTR-001 ; dates jugées inapplicables en l'état, C-14), soit deux périodes novembre–avril. « Période estivale » non définie (Z-10). K3 : coupures des unités critiques interdites l'été, enveloppe contrainte l'hiver ; sans durée, la répartition n'est pas tranchée.			

Couche K4 — nouvelle issue et issues condamnées	
Nouvelle issue en amont (K4). Le jalon « construction d'une nouvelle issue et protection des issues » (AR-DEV-058) ne dit pas si la nouvelle issue précède la mise hors service d'une issue existante (Z-12). Deux issues minimum et capacité maintenue (AR-DEV-198). V-K4a — nouvelle issue et escalier no 7 exécutés dès la phase 0, avant toute façade : classe IV « J » (CI-TAB-019), câblage souterrain protégé (AR-PLN-013), percements hors heures d'occupation (ME-020). V-K4b — nouvelle issue en séquence dans B.1.2 ; admissible si aucune issue existante n'est condamnée avant. V-K4c — escalier d'issue temporaire modulaire (AR-DEV-311, 195) à chaque issue condamnée, indépendamment du nouvel escalier. Risque non sourcé : AR-DEV-170 interdit de passer des installations temporaires de sécurité aux permanentes avant l'achèvement substantiel ; le registre ne dit pas si un escalier d'issue temporaire en est une — à confirmer par les professionnels.	

Points de validation CISSS (registre consolidé de 03 §5)		
Point de validation du CISSS	Moment	Registre
Calendrier d'exécution et calendrier d'arrêt des installations approuvés ; tout changement d'horaire	Phase 0, puis à chaque mise à jour	AR-DEV-026, 032, 286 ; CI-CTR-003, 004
Préavis 48 h et approbation avant toute coupure ; calendrier hebdomadaire du jeudi	Avant chaque coupure	AR-DEV-024, 031, 032, 062
Plan de sécurité incendie approuvé (CISSSGA, Établissement, service incendie) ; mise hors service de gicleurs couverte	Avant le démarrage ; quai des ambulances	AR-DEV-197 ; ME-006, 007 ; Z-08
Méthodologie PCI, cloisons par phase, classification et fiche synthèse (classes III-IV), équipe pluridisciplinaire	Phase 0 ; avant chaque enceinte	AR-DEV-124, 148, 203 ; CI-PCI-001 à 003, 005
Approbation de la préparation des lieux avant de débiter ; du nettoyage avant démantèlement ; réouverture	Début et fin de chaque zone	AR-DEV-204, 245 ; CI-PCI-023, 024
Travaux bruyants et vibrations : coordination par secteur ; seuils à établir	Avant les travaux des secteurs listés	CI-TAB-011, 012, 022, 025, 028 ; Z-04
Horaires « J », « S », « J/S » des activités classées ; délai de 2 jours ouvrables	Chaque activité du tableau CISSS	CI-TAB-001, 005 à 010, 019 à 021, 024, 027, 029
Configurations des accès : entrée principale, ambulances, cliniques externes, marchandises, roulotte IRM ; préavis 3 semaines par voie déplacée	Avant chaque changement de configuration	AR-PLN-008, 018, 019 ; CI-TAB-013 à 018 ; AR-DEV-139
Fenêtres des unités critiques (hémodialyse, UT-2, autoclaves, médecine nucléaire, PAF BO, bi-blocs, chambre 315) ; inoccupation des chambres 307 et 216 ; gaz médicaux : attestation, présence, deux certifications	Avant chaque coupure ; avant les faces nord et sud de la tour	ME-048, 050, 051, 055, 056, 058, 068, 069, 072, 073, 077, 087, 088, 119

Comparaison des options				
Option	Ordre	Conflits levés	Conflits résiduels	Décisions à obtenir — de qui
R — référence	0 → 1 → 2 (N, E, S, O) → 3 (N → O ; S) → 4	K2 : la prise d'air médical temporaire est sur la façade ouest pendant la façade nord (ME-065) et réinstallée après le revêtement nord (ME-067). K4 traitable par V-K4b ou V-K4c. Numérotation du plan clé respectée (C-34).	K1 (tableau CISSS par niveaux) ; K3 (saisons) ; K5 (régime PCI) ; K6 (zones C et L) ; ordre des faces de la tour [choix].	WSP : tour ou basilaire pour l'air médical, le bloc opératoire, les autoclaves ; simultanéité nord/ouest. Architectes : portée d'AR-PLN-040. CISSS : K1, K5, horaires J/S.
A2 — basilaires avant la tour	0 → 1 → 3 (N → O ; S) → 2 → 4	K2 comme R. Toitures périmétriques des basilaires refaites avant l'échafaudage de la tour [lecture].	Comme R ; ajoute la lecture de l'appui de l'échafaudage de la tour sur les toitures du basilaire (ST-023 à 026 ne le disent pas ; Z-27) ; quatre systèmes 24/7 sur la façade ouest à échelonner si le BO est sur la tour.	Comme R ; plus structure : appui et capacités des toitures pour l'échafaudage de la tour.
A3 — tour d'abord	0 → 2 (N, E, S, O) → 1 → 3 → 4	K2 comme R ; prototype dans la tour (AR-PLN-050).	Comme R ; échafaudage de la tour sur des toitures non refaites [lecture] (AR-DEV-100, AR-PLN-036) ; coupures de l'hémodialyse (dimanche hors été, ME-051) dès le début.	Comme R ; plus CISSS : fenêtres de coupure de l'hémodialyse et des chambres 216/307 dès la première phase.
B — par niveaux (tableau CISSS)	0 → B-A (RC) → B-B (niveau 1, SS) → B-C (tour) → 4	Applique le tableau du CISSS tel qu'écrit (classes PCI, horaires, secteurs de locaux) ; K1 n'existe plus si V-K1b (façades des deux basilaires avant les fenêtres du RC) ou V-K1a (tableau scindé par secteur).	K1 tant que V-K1a/b/d n'est pas décidé ; l'extérieur reste à ordonner par façade (échafaudage, démolition, structure : ST-030, ST-011, CI-TAB-004) ; K2, K3, K5, K6 comme R.	CISSS : scinder le tableau par secteur (R-31) ou accepter V-K1b. Architectes : portée de « travaux par l'extérieur » (C-36, Z-07). WSP : comme R.

Recommandation motivée

Option R recommandée. Elle suit la numérotation du plan clé des architectes, respecte l'emplacement écrit de la prise d'air médical temporaire (ME-065/067) et ne repose sur aucune lecture supplémentaire par rapport à A2 et A3. A2 et A3 restent admissibles, mais chacune ajoute une hypothèse non écrite sur l'échafaudage de la tour (toitures refaites ou non) et, pour A3, place les coupures de l'hémodialyse en tout début de projet. B ne devient exécutable qu'après une décision du CISSS sur K1 (tableau scindé par secteur ou façades des deux basilaires avant les fenêtres du RC) ; elle est à conserver comme lecture de contrôle des classes PCI et des horaires, pas comme ordre d'exécution.

Portée et conventions du cahier

Ce que le cahier ne fait pas. Aucune durée ni calendrier : les repères « ±5 / ±8 / ±4 mois » de la feuille 010 sont des indications des architectes (C-34). Aucune contrainte ajoutée au registre : chaque élément dessiné cite sa ligne. Les contours des zones, les repères d'élévation et les points fixes sont des superpositions [lecture] sur les rendus des feuilles 010, 011, 001 et 002 ; toute localisation que les documents ne fixent pas est marquée [à confirmer].

Lecture des planches. Planche 0 : site, commune à toutes les options. Pour chaque option : ordre des phases (plan recoloré), installations temporaires et coupures (étiquettes T, matrice), séquence (dépendances, saisons, nouvelle issue, validations CISSS). Registre complet : analyse/02-contraintes.md ; plan de phasage : analyse/03-phasage.md ; vérification : analyse/04-verification.md.

Décisions à obtenir, communes à toutes les options

Décision	Portée	De qui	Renvoi
Élévations C (ouest partielle) et D (est partielle) : faces et sous-phases concernées	Planche 0 et planches d'ordre : « ? »	Architectes	Z-24 ; 03 §2.1
Zone d'ambulance : « sud » (D4, D5 : ME-006, ME-147) contre « nord » (D2 : AR-PLN-004) ; orientation du détail 1 de la 002	Sous-phase des configurations d'accès ; T14	Architectes et WSP	03 §6, §2.4.3 ; 04 §6
Tour ou basilaire : centrale d'air médical (ME-064), prise d'air du bloc opératoire (ME-045 « (tour) »), événements d'autoclaves (ME-075)	Faces 2.O/3.O, 3.N/2.N ; ordre nord/ouest	WSP	03 §6, K2
Portée de « travaux par l'extérieur » dans la note de la 505 (AR-PLN-040)	Articulation façades / fenêtres ; K1	Architectes	C-36, Z-07 ; 03 K1
Escalier no 7 = nouvelle issue ; ordre nouvelle issue / condamnation	K4 ; T11	Architectes, structure	Z-12 ; 03 K4
Régime PCI applicable (procédure du CISSS de la Gaspésie absente), classes attribuées, sens de « J », « S », « J/S », « période estivale »	Toutes les activités classées ; K3, K5	CISSS	C-01, C-02, Z-01, Z-05, Z-10
Secteurs « non touchés » C (local R-22) et L (fenêtres) présents dans les activités du tableau	Phase 1 ; A.6	Architectes et CISSS	C-40 ; 03 K6
Caméra d'urgence : « aucun arrêt » (D5) contre dépose temporaire (D4, ME-145)	T14 ; 3.S ou A.1	WSP	Z-06 ; 03 §2.8
Sous-phases absentes du tableau CISSS (C.1, C.3, B.1.1) et lignes sans sous-phase (échelles, issue no 3)	Option B	CISSS	CI-TAB-023, 026 ; C-30
