

Planche 0 — Lecture du site


Zones A à L, repères d'élévation A à I, points fixes 24/7 et accès à maintenir — planche commune à toutes les options



Fond : feuille 010 (D2), plan clé « Zones des travaux », couleurs des architectes (bleu phase 1, vert phase 2, orange phase 3, hachures « secteur non touché »), nord en haut à droite. Contours des zones, repères d'élévation A à I (feuille 011) et points fixes 1 à 16 : superposés [lecture]. Le numéro pointe l'emplacement écrit ou lu ; la colonne « Marque » du tableau dit ce qui reste à confirmer.

Zones A à L et parties de bâtiment		
Zone	Fonction (légende 010, via 01 §8.5)	Phase du plan clé [lecture]
A	Tour des chambres (niveaux 200, 300, 400 ; 1974), 4 étages	Phase 2 — tour
B	Laboratoire (niveau 100, 1990) — basilaire nord 2 étages	Phase 3 — basilaires nord, ouest, sud
C	Archives (RC, 2001)	Secteur non touché
D	Administration (niveau 100, 2005) et cliniques externes (RC, 1974) — basilaire est 2 étages	Phase 1 — basilaire est
E	Oncologie (RC, 1974)	Phase 1 — basilaire est
F	IRM (RC, 2007)	Phase 1 — basilaire est
G	Basilaire sud-est (1974), 1 étage	Phase 3 — basilaires nord, ouest, sud
H	Chirurgie d'un jour (niveau 100, 2005) et urgence (RC) — basilaire sud 2 étages	Phase 3 — basilaires nord, ouest, sud
I	Basilaire sud-ouest (1974), 1 étage	Phase 3 — basilaires nord, ouest, sud
J	Basilaire nord-ouest (1974), 1 étage	Phase 3 — basilaires nord, ouest, sud
K	Basilaire nord-est (1974), 1 étage	Phase 3 — basilaires nord, ouest, sud
L	Oncologie (RC, 2023)	Secteur non touché
—	Basilaire ouest (1 étage) : aucune lettre sur le plan clé ; angles J et I	Phase 3 [lecture]
—	Saillie sud avec portes de garage (▲ ▼) : quai des ambulances	Phase 3 [lecture] ; C-34, §6 de 03

Implantation existante (feuille 001) : issues et accès repérés par les architectes

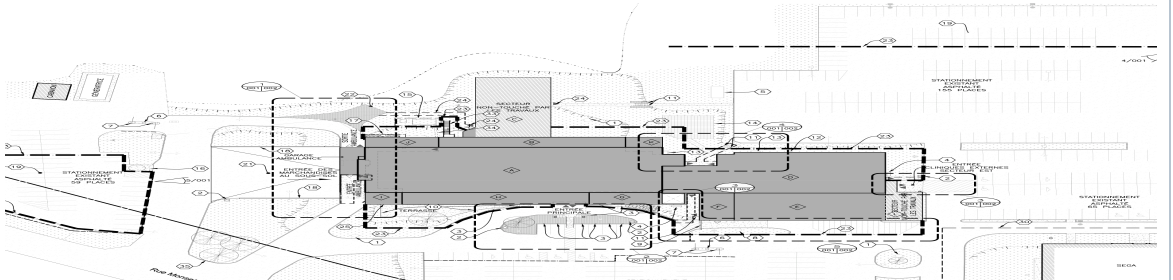

Légende 001/002 : ▲ issue ou accès au bâtiment (protection durant le chantier, AR-PLN-016) ; △ porte de garage ; borne-fontaine accessible en tout temps (AR-PLN-001) ; issues et chemins d'évacuation maintenus, 1650 mm (AR-PLN-006) ; portes mises hors service repérées au plan (AR-PLN-007) ; plan d'action avant tout travail près d'une issue (AR-PLN-011).

Repères d'élévation A à I (plan clé de la feuille 011)


Élev.	Titre (feuille 011)	Face vue [lecture]
A	Élévation sud	sud (basilaire sud et tour)
B	Élévation ouest	ouest (basilaire ouest et tour)
C	Élévation ouest partielle	ouest, partielle — jonction basilaire est / saillie
D	Élévation est partielle	est, partielle — saillie sud (G)
E	Élévation ouest partielle	ouest, partielle — angle sud-ouest (I)
F	Élévation nord	nord (basilaire nord, tour, archives)
G	Élévation est	est (basilaire est et tour)
H	Élévation nord partielle	nord, partielle — près des archives / K
I	Élévation ouest partielle	ouest, partielle — près des archives / K

Points fixes 24/7, unités critiques et accès (registre 02)

No	Point fixe ou accès à maintenir	Localisation écrite	Registre	Marque
1	Prise d'air frais du bloc opératoire — 24/7, conduits temporaires	« Façade ouest (tour) », « toiture ouest »	ME-042 à 048	[à confirmer] tour ou basilaire
2	Évents de vapeur des autoclaves (sous-sol) — 24/7, relocalisés avant la façade ouest ; temporaires jusqu'au coin sud-ouest	« Façade ouest », toiture	ME-075 à 079	
3	Centrale d'air médical — 24/7 ; prise temporaire sur la façade ouest pendant la façade nord	« Toiture nord-ouest » ; façades nord et ouest	ME-064 à 068	[à confirmer] tour ou basilaire
4	Unité de ventilation hémodialyse / laboratoire, niveau 200 — conduits temporaires avant démolition ; coupures dimanche hors été	« Façades nord/ouest » de la tour	ME-049 à 054	[à confirmer] locaux 202-237
5	IRM — interdiction de métal quand l'IRM est en service ; volets coupe-feu R16/R34/R36	Zone F (RC)	AR-PLN-009, 010 ; ME-010, 109, 110	
6	Urgence (RC, zone H) et quai des ambulances — gicleurs 2 × 2 h ; enseigne ; caméra	« Entrée ambulance sud » (D4, D5) ; « Zone ambulance (nord) » (AR-PLN-004)	ME-006 à 008, 145 à 147 ; AR-PLN-004, 014, 018 ; CI-TAB-016	[lecture] garage ▲ ▼, saillie sud
7	Entrée principale et marquise — accès maintenu en trois configurations	Zone H ; détail 2 de la feuille 002	AR-PLN-008, 019 ; CI-TAB-014	[lecture] marquise au sud (002)
8	Nouvelle issue permanente du laboratoire (niveau 100) — jalon obligatoire ; escalier no 7 des plans de structure	Zone B ; « basilaire nord-ouest » (ST-039)	AR-DEV-058, 198 ; AR-PLN-064 ; ST-039 ; CI-TAB-019	[à confirmer] escalier no 7 = issue (Z-12)
9	Chambres à pression négative 216 (nord) et 307 (sud) ; soins intensifs 315	Façade nord ; façade sud ; ligne D5 N-F-V-009	ME-056 à 058	
10	Hotte de médecine nucléaire — conduit modifié sur toute la hauteur ; arrêt vendredi-dimanche	« Tour est »	ME-117 à 119	
11	Prises d'air et registres du service alimentaire, sous-sol — classe IV, horaire « S »	Niveau SS, locaux S41/S42/S44M, « zone A »	CI-TAB-005 ; ME-025, 029	[à confirmer] SS non zoné
12	Local R-22 — renforts des colonnes A4, A5, A6 en entreplafond (classe IV, J/S)	« Secteur IRM / local R-22 (RC) » ; zone C au tableau CISSS	ME-108, 111 ; CI-TAB-010 ; C-40 ; Z-25	[à confirmer]
13	Salle des serveurs RC (arrêt court, semaine, hors été) ; bi-bloc LG 18 MBH	« Façade est »	ME-086, 088	
14	Persienne UT-2 (chirurgie d'un jour) — coupure rapide nuit ou fin de semaine	« Façade sud »	ME-055	
15	Stationnement de l'IRM mobile — sorties d'arrosage à conserver, alcôve dans le revêtement	« Coin nord-est » (D4) ; lignes D5 sud et nord	ME-116 ; CI-TAB-017	[à confirmer]
16	Évents de la chaufferie (porte-à-faux) — 24/7 ; soffite et toiture du coin nord-ouest	« Porte-à-faux », « coin nord-ouest »	ME-080, 096, 120 à 123	[à confirmer] face (C-28)

Planche 1 — Option R (référence) — plan

Découpage A par secteurs du plan clé ; ordre 0 → 1 → 2 (N, E, S, O) → 3 (N → O ; S) → 4 ; installations temporaires au bon endroit et au bon moment

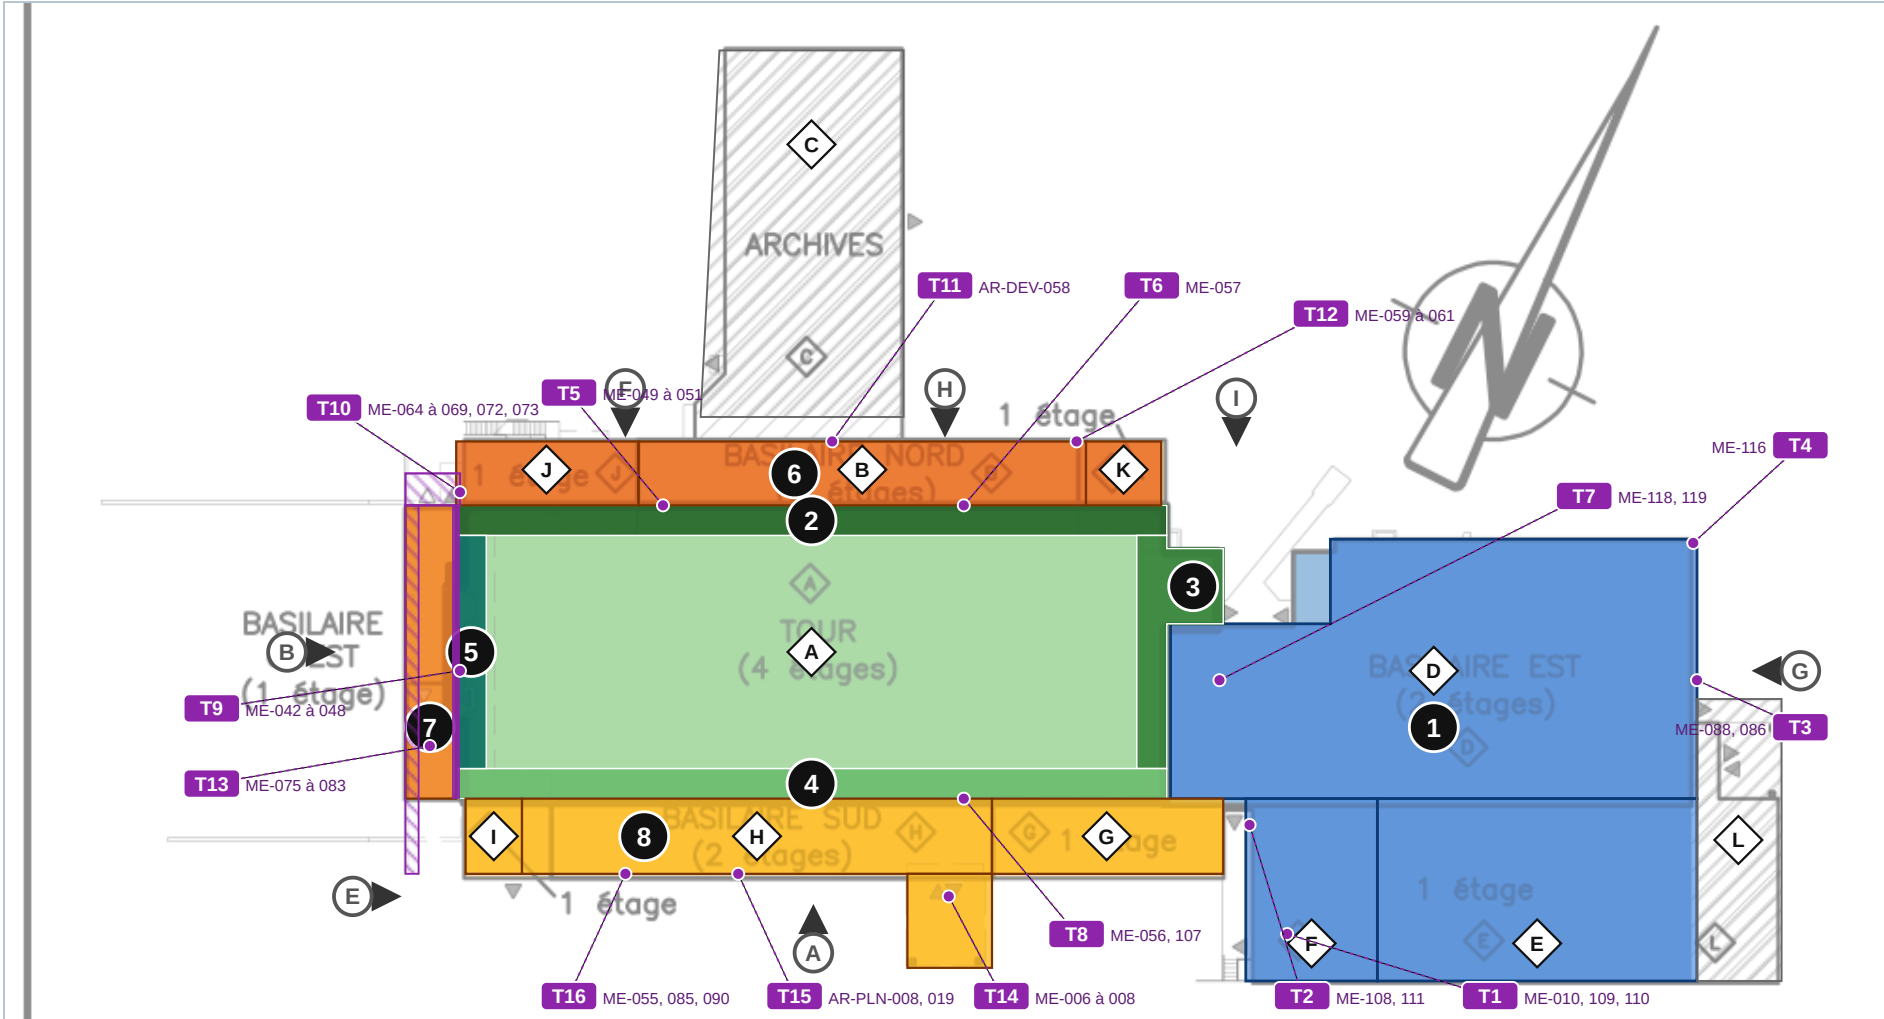

Aplats : phase 1 en bleu ; tour en vert clair avec ses faces 2.N, 2.E, 2.S, 2.O en bandes vertes ; 3.N, 3.O, 3.S en oranges ; hachures grises = secteur non touché. Numéros noirs = ordre de référence [choix]. Étiquettes T1 à T16 (magenta) = installations et mesures temporaires, listées à droite avec leurs identifiants ; hachures magenta = emplacement écrit des installations temporaires de la façade ouest (T9, T10, T13).


0 Préalables et mobilisation → 1 Basilaire est → 2 Tour : N → E → S → O → 3 Basilaires : nord → ouest ; sud en parallèle → 4 Clôture

Ordre 1 → 2 → 3 : numérotation du plan clé [lecture], aucun texte ne l'impose (Z-23). Nord avant ouest : lecture de ME-065/067 (prise d'air médical temporaire sur la façade ouest pendant la façade nord). Ordre des faces de la tour : [choix], seules règles écrites ME-049 (conduits temporaires avant démolition nord/ouest) et ME-118 (conduit de médecine nucléaire modifié pour permettre les façades). Correction des anomalies avant chaque phase suivante (AR-DEV-275). Repères des architectes, feuille 010 : phase 1 « ±5 mois », phase 2 « ±8 mois », phase 3 « ±4 mois » (C-34) — aucun calendrier n'en est déduit.

Élévations par sous-phase (correspondance zones ↔ élévations non écrite, Z-24)

Sous-phase	Élévations de la feuille 011 concernées [lecture]
1	G (est) ; C (ouest partielle, jonction) ; D (est partielle) ?
2.N	F (nord), partie haute
2.E	G (est), partie haute
2.S	A (sud), partie haute
2.O	B (ouest), partie haute
3.N	F (nord) partie basse ; H, I (partielles)
3.O	B (ouest) partie basse ; E (ouest partielle)
3.S	A (sud) partie basse ; D (est partielle) ; C ?


Élévations A à I (feuille 011, rendus)

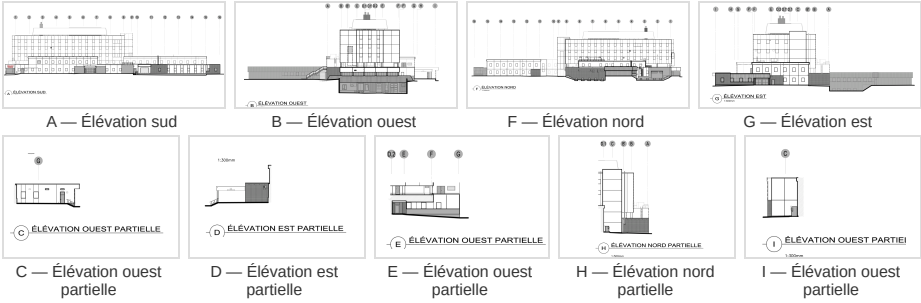

Installations temporaires électromécaniques et mesures propres à chaque sous-phase (registre 02, fiches de 03 \$2.2 à \$2.4)

Code	Sous-phase	Installation ou mesure temporaire dessinée	Registre
T1	1	IRM : volets coupe-feu de fenêtre, gicleur R-34 remplacé, entreplafond libéré ; métal interdit quand l'IRM est en service	ME-010, 109, 110 ; AR-PLN-009, 058 ; CI-TAB-009
T2	1	Local R-22 : conduits EMT relocalisés avant les renforts A4-A6 (classe IV, J/S)	ME-108, 111 ; CI-TAB-010
T3	1	Salle des serveurs RC : arrêt court, semaine, hors été ; bi-bloc LG : récupération du réfrigérant, remise en marche	ME-088, 086
T4	1	IRM mobile : sorties d'arrosage protégées, alcôve dans le revêtement	ME-116
T5	2.N	Conduits temporaires d'alimentation et de retour hémodialyse / labo niv. 200 AVANT démolition ; coupures un conduit à la fois, dimanche hors été	ME-049 à 051
T6	2.N	Chambre 216 : conduit RAV prolongé hors échafaudages	ME-057
T7	2.E	Hotte de médecine nucléaire : conduit modifié sur toute la hauteur, supports temporaires, arrêt vendredi-dimanche	ME-118, 119
T8	2.S	Chambre 307 : démantèlement si inoccupée, conduit prolongé, grillage aviaire ; sectionneurs de thermopompes déposés	ME-056, 107
T9	2.O	PAF bloc opératoire : 2 conduits temporaires 900 x 900 sous le soffite AVANT démantèlement ; nouveau conduit APRES revêtement ; glycol déposé	ME-042 à 048 ; ME-084 ; [à confirmer] tour/basilaire
T10	3.N	Prise d'air médical et boîtier HEPA temporaires SUR LA FAÇADE OUEST pendant 3.N ; bonbonnes ; 1re certification ; réinstallation après revêtement nord	ME-064 à 069, 072, 073
T11	3.N	Nouvelle issue du laboratoire et escalier no 7 : jalon ; classe IV « J » ; câbles souterrains protégés ; deux issues minimum maintenues	AR-DEV-058 ; AR-DEV-198 ; AR-PLN-013, 064 ; ST-039 ; CI-TAB-019
T12	3.N	Laboratoire : sortie d'air par conduit temporaire hors échafaudages ; filtration V-53 ; échelle de toiture	ME-059 à 061 ; CI-TAB-023
T13	3.O	Événements d'autoclaves relocalisés AVANT 3.O, tuyauteries temporaires en toiture jusqu'au coin sud-ouest ; fenêtre nuit / avant 10 h ; câbles chauffants hors hiver	ME-075 à 083
T14	3.S	Quai des ambulances : gicleurs hors service 2 x 2 h, glycol ; enseigne ; caméra ; deux configurations d'accès (détail 1, 002)	ME-006 à 008 ; ME-145 à 147 ; AR-PLN-014, 018
T15	3.S	Entrée principale : trois configurations autour de la marquise (détail 2, 002) ; plan d'action d'évacuation	AR-PLN-008, 019 ; CI-TAB-014
T16	3.S	Persienne UT-2 : coupure rapide nuit ou fin de semaine, filtration et grillage temporaires ; bi-bloc GREE de l'urgence	ME-055, 085, 090

3.S — configurations successives des accès (feuille 002) : ambulances en deux configurations (AR-PLN-018), entrée principale en trois (AR-PLN-019) ; les chiffres « phase 1/2/3 » sont propres à la feuille 002 (C-34)

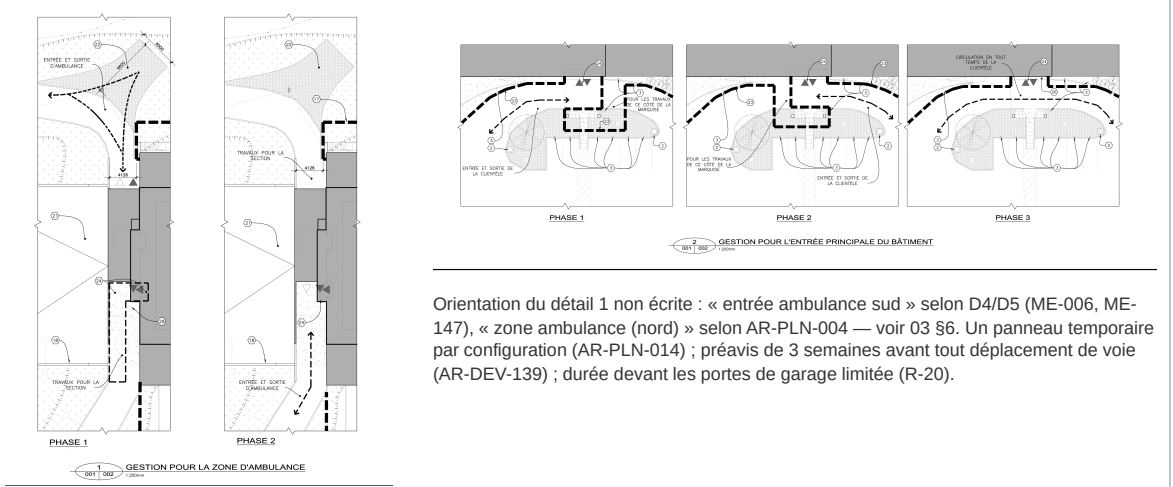

Orientation du détail 1 non écrite : « entrée ambulance sud » selon D4/D5 (ME-006, ME-147), « zone ambulance (nord) » selon AR-PLN-004 — voir 03 \$6. Un panneau temporaire par configuration (AR-PLN-014) ; préavis de 3 semaines avant tout déplacement de voie (AR-DEV-139) ; durée devant les portes de garage limitée (R-20).

Issues : nouvelle issue, issues touchées et compensation

Nouvelle issue permanente au laboratoire (zone B, niveau 100) : jalon du calendrier (AR-DEV-058), classe IV horaire « J » (CI-TAB-019), percements hors heures d'occupation (ME-020). Deux issues minimum et capacité d'évacuation maintenue dans les secteurs occupés (AR-DEV-198). **Aucune issue condamnée n'est écrite** : à chaque issue touchée par une sous-phase, plan d'action préalable (AR-PLN-011), maintien du chemin d'évacuation à 1650 mm (AR-PLN-006) ou escalier d'issue temporaire modulaire incombustible (AR-DEV-311, 195), repérage des portes hors service (AR-PLN-007). Ordre nouvelle issue / condamnation : non écrit (Z-12, K4 ; variantes V-K4a/b/c).
