

Planche 1 / 5 — Méthode et correspondance élévation ↔ façade

Les onze repères A à K, la façade de chacun, et ce que la lecture en élévation corrige au cahier en plan

Correspondance repère d'élévation ↔ façade — établie sur les titres des dessins et le codage du tableau ME						
Repère	Titre du dessin (feuilles 201 à 204)	Démo.	Constr.	Façade au tableau ME	Lignes	Cahier en plan (2026-09-15)
A	Élévation sud	201	203	Sud	30	sud — confirmé
B	Élévation ouest	201	203	Ouest	14	ouest — confirmé
C	Élévation ouest partielle	201-A	203	Ouest	5	« ? » — tranché : ouest
D	Élévation est partielle	201-A	203	Est	1	« ? » — tranché : est
E	Élévation ouest partielle	201-A	203	Ouest	4	ouest — confirmé
F	Élévation nord	202	204	Nord	23	nord — confirmé
G	Élévation est	202	204	Est	10	est — confirmé
H	Élévation est partielle	201-A	204	Est	4	lue « nord partielle » — corrigé : est
I	Élévation ouest partielle	201-A	204	Ouest	2	ouest — confirmé
J	Élévation sud partielle	201-A	203	—	—	absente du cahier en plan
K	Élévation ouest partielle	201-A	204	—	—	absente du cahier en plan

Les onze repères A à K sont les titres des dessins eux-mêmes : « Élévation nord », « Élévation est partielle »… La façade est donc **écrite**, elle n'est plus lue sur le plan clé. Les repères J et K ne portent aucune ligne au tableau ME.

Ce que change la lecture en élévation

Pourquoi repartir des élévations. Le cahier de phasage en plan (14 planches, feuille 010) montre où sont les zones et dans quel ordre elles sont traitées. Il ne montre pas ce que l'entrepreneur doit décrocher d'un mur avant de le démolir. Or les documents électromécaniques sont organisés par façade et par élévation, pas par zone : le tableau de coordination de WSP et les élévations ME001 à ME003 se lisent en regard des élévations d'architecture 201 à 204, axe par axe.

Trois corrections que la lecture en élévation apporte au cahier en plan.

- Les repères C et D portaient un « ? » (correspondance non tranchée, reportée en décision à obtenir des architectes). Les titres des dessins les tranchent : **C = élévation ouest partielle**, **D = élévation est partielle**. La décision tombe.
- Le repère H était lu « nord partielle » sur le plan clé de la feuille 011. Le dessin s'intitule « **Élévation est partielle** » et le tableau ME code ses quatre lignes en « E » (est) — dont la hotte de médecine nucléaire, déjà rattachée à la face est. La lecture du plan clé était fausse.
- Deux repères, **J** (élévation sud partielle) et **K** (élévation ouest partielle), n'apparaissaient pas du tout dans le cahier en plan.

Ce que le présent cahier ajoute. Pour chaque façade : l'inventaire des appareils avec leur état et leur fenêtre d'interruption, la séquence d'architecture, et le **verrou** entre les deux — quel appareil bloque quelle étape. Plus une planche sur les zones de chantier et les clôtures, qui bougent au fil des phases.

Le tableau ME est déjà indexé par élévation — c'est le pivot de ce cahier

Légende du tableau de coordination des équipements électromécaniques (D5, révision du 11 mai 2026), notes générales 1 et 2 :

« *1. Orientation façade : Nord, Sud, Est, Ouest* »

« *2. Numérotation élévation : Se référer aux bulles d'élévations en architecture et ingénierie (A à I)* »

Chaque ligne du tableau porte donc déjà sa façade et son élévation. Les 93 lignes se répartissent ainsi :

Façade	Lignes	Élévations
Sud	30	A
Ouest	25	B (14), C (5), E (4), I (2)
Nord	23	F
Est	15	G (10), H (4), D (1)

Discipline	Lignes
Électricité	56
Ventilation	30
Plomberie	5
Gaz médicaux	1
Protection incendie	1

Le codage couleur ajoute trois états : gris « non touché » (11 lignes), orange « à démanteler, non utilisé » (2), jaune « à valider avec le propriétaire » (3).


Méthode

Méthode et calage géométrique. Les élévations sont rendues depuis les feuilles d'architecture à 200 points par pouce ; le calque des appareils est superposé en coordonnées de la feuille.

La position horizontale de chaque appareil est donnée par la **chaîne d'axes** de la feuille 202 (entraxes écrits : ±7247, ±7113, ±7010… entre les axes 16 et 1, total ±105 927 mm), la position verticale par la **chaîne de niveaux** (R00 à 10 000, niveau 100 à 13 952, 200 à 17 901, 300 à 21 559, 400 à 25 202, 500 à 28 882, dessus de parapet à 29 820). Les deux chaînes donnent la même échelle, 1:200, ce qui vérifie le calage.

L'axe 1 est à l'ouest et l'axe 16 à l'est : l'élévation nord se lit donc de l'est (à gauche) vers l'ouest (à droite). Vérification : la sortie d'arrosage écrite « coin nord-est » tombe vers l'axe 14, et les appareils du quai des ambulances écrits « porte nord du quai » tombent vers l'axe 1, du côté où le plan clé place la sortie d'ambulance.

Ce qui reste une lecture. La position de chaque appareil le long de l'élévation est relevée sur les repères de la feuille ME001(D) : elle est marquée ``[lecture]``. Les appareils que le tableau ME place sur une façade sans qu'aucun repère ne les montre sur l'élévation sont signalés comme tels plutôt que positionnés.

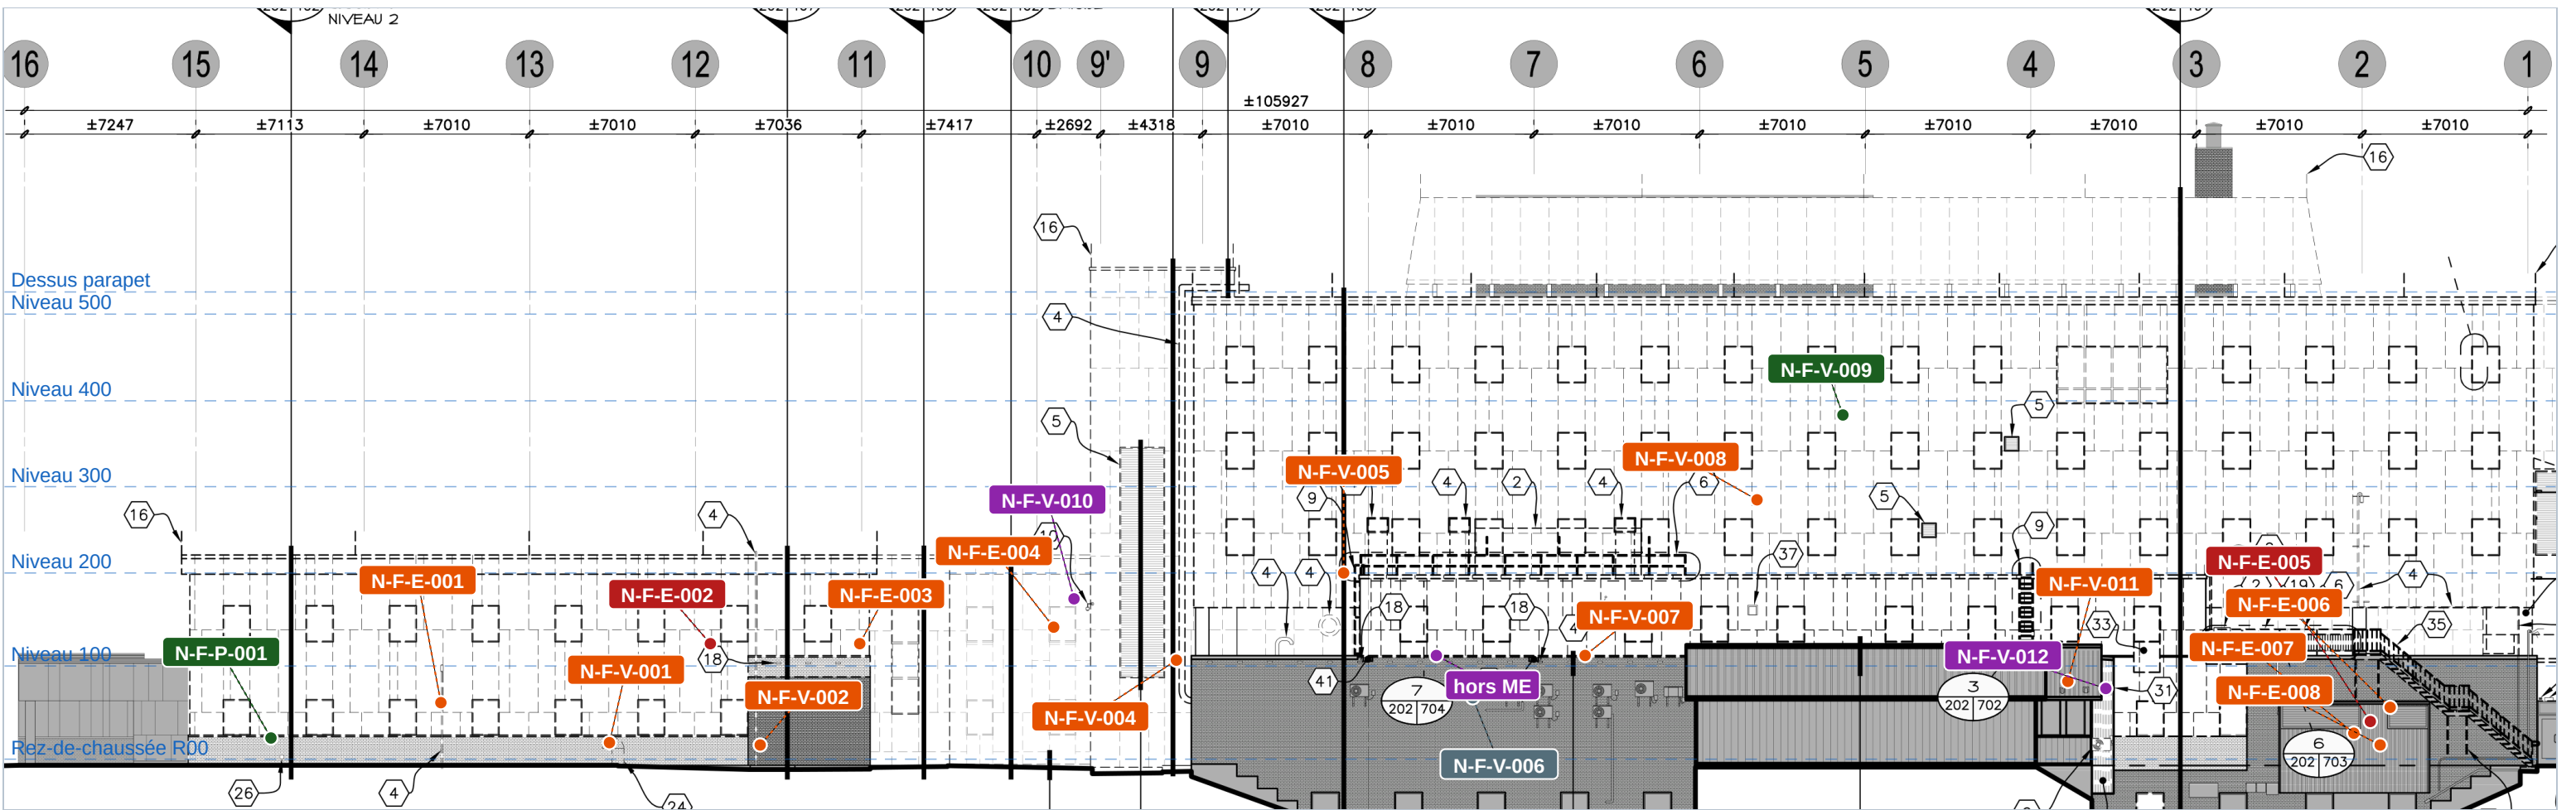

États : Retiré définitivement Déplacé temporairement puis réinstallé Maintenu avec interruption convenue Maintenu en fonction sans interruption Non touché par les travaux
 Chaque pastille porte le code de la ligne du tableau ME. Position le long de l'élévation relevée sur les repères des feuilles ME — [lecture]. Traits bleus : niveaux de la feuille. Le est est à gauche, le ouest à droite. Lignes du tableau que le dessin ne montre nulle part, donc non positionnées ici : N-F-P-002, N-F-V-003, N-F-GM-001.

Ligne ME	Appareil	Repère de la feuille ME	Fenêtre écrite
N-F-P-002	Déshumidification, coude	non repéré sur ME001(D)	Toute
N-F-P-001	Sortie d'arrosage	D3 plomberie	Toute la durée des travaux
N-F-E-001	Conduit PVC, lampadaires	D6 électricité	REMETTRE EN FONCTION TOUS LES SOIRS
N-F-V-001	Col de cygne, atelier GBM	D4 ventilation	Toute
N-F-E-002	Antenne au toit et conduit PVC	D7 électricité	À enlever
N-F-E-003	Câblage de paratonnerre	D11 électricité	Toute la durée des travaux
N-F-V-002	Persienne RAV, saut-de-loup S17	D2 ventilation	Toute
N-F-E-004	Caméra, coin escalier no 3	D8 électricité	Temps minimum
N-F-V-010	Persienne PAF P-05	D5 ventilation	?
N-F-V-005	Unité hémodialyse : 3 conduits + passerelle	D7 ventilation	Dimanche seulement, en dehors de la période es
N-F-V-004	Ventilateur cloche, stérilisation	D6 ventilation	Toute
N-F-V-006	Bi-blocs (8x) non touchés	D13 ventilation	non touché

Ligne ME	Appareil	Repère de la feuille ME	Fenêtre écrite
—	Sortie d'évent murale de laboratoire	D4 plomberie — aucune ligne D5	—
N-F-V-007	Sortie d'air murale, secteur labo	D8 ventilation	?
N-F-V-008	Persienne RAV P-06, chambre 216	D15 ventilation	Toute
N-F-V-009	Persienne PAF P-07, soins intensifs 315	D9 ventilation	Nuit/Jour si aucune chambre occupée
N-F-V-003	Évacuation V-53, toilette du labo	non repéré séparément	Toute
N-F-V-011	Trappes d'accès pour mécanique	D11 ventilation	Toute la durée des travaux
N-F-V-012	Persienne sous porte-à-faux P-08	D12 ventilation	?
N-F-E-005	Prise extérieure, porte nord du quai	D9 électricité	À enlever
N-F-E-006	Luminaire mural, porte piéton nord	D3 électricité	Toute la durée des travaux Toute la durée des
N-F-E-007	Lecteur de carte, porte piéton nord	D2 électricité	Toute la durée des travaux
N-F-E-008	Clavier, porte de garage nord	D10 électricité	En période estivale
N-F-GM-001	Prise d'air de la centrale d'air médical	non repéré sur ME001(D)	Toute

Verrous entre les appareils et les travaux d'architecture — façade nord				
#	Appareil et position	À faire avant	Étape d'architecture bloquée	Sources
V1	Unité de ventilation de l'hémodialyse et du laboratoire (N-F-V-005), axes 8 à 6, niveau 200	Conduits temporaires d'alimentation et de retour en place ; passerelle d'aluminium enlevée par l'entrepreneur général	E2 démolition de l'enveloppe entre les axes 8 et 6 ; modification des brides un conduit à la fois	D5 N-F-V-005 ; ME001(D) note D7 ventilation ; ME014 D1 à D4 ; Z-29
V2	Prise d'air de la centrale de production d'air médical (N-F-GM-001)	Conduit temporaire installé hors de la zone de travaux ; bonbonnes commandées	E2 sur la portion concernée — position non repérée sur ME001(D) [à confirmer]	D5 N-F-GM-001 ; ME-064 à 068 ; 03 §6
V3	Persienne de prise d'air frais des soins intensifs, chambre 315 (N-F-V-009), axe 4, niveau 400	Prolongation temporaire du conduit hors des échafaudages ; persienne à relocaliser	E2 et E4 : l'échafaudage ne peut couvrir la prise d'air sans prolongation préalable	D5 N-F-V-009 ; ME-058 ; ME001(D) note D9 ventilation
V4	Persienne de renvoi d'air de la chambre à pression négative 216 (N-F-V-008), axe 4,6, niveau 300	Prolongation temporaire du conduit RAV hors des échafaudages	E2 ; E4 modifie le plénum selon l'épaisseur du revêtement	D5 N-F-V-008 ; ME-057 ; ME001(D) note D15 ventilation
V5	Sortie d'air murale du secteur du laboratoire (N-F-V-007), axe 5,7	Conduit d'évacuation temporaire prolongé hors des échafaudages	E2 ; la sortie est remplacée en E4	D5 N-F-V-007 ; ME-059 à 061 ; ME001(D) note D8 ventilation
V6	Évacuation V-53 de la toilette du laboratoire (N-F-V-003)	Filtration temporaire en place	E2 ; persienne relocalisée dans le nouveau revêtement en E4	D5 N-F-V-003 ; ME-061
V7	Ventilateur d'évacuation mural en cloche, salle de mécanique de stérilisation (N-F-V-004), axe 8,2	Aucun préalable écrit	E2 : ventilateur enlevé ; E6 : réinstallé après le revêtement, conduit prolongé à l'intérieur du mur	D5 N-F-V-004 ; ME001(D) note D6 ventilation
V8	Col de cygne d'évacuation de l'atelier GBM (N-F-V-001), axe 12,5	Conduit temporaire si requis pour la continuité des opérations	E2 ; réinstallation en E6 après la réfection de la façade	D5 N-F-V-001 ; ME001(D) note D4 ventilation
V9	Persienne de renvoi d'air du saut-de-loup, atelier de menuiserie S17 (N-F-V-002), axe 11,6	Saut-de-loup et persienne conservés ; conduit temporaire si requis	E2 ; le système d'évacuation de l'atelier est arrêté toute la durée des travaux de ce secteur	D5 N-F-V-002 ; ME-062 ; ME001(D) note D2 ventilation
V10	Conduit PVC des lampadaires de stationnement (N-F-E-001), axe 13,5	Boîte de jonction si les travaux se font de jour seulement	E2 et E4 ; contrainte quotidienne : le lampadaire doit être remis en fonction tous les soirs	D5 N-F-E-001 ; ME001(D) note D6 électricité
V11	Caméra extérieure, coin de l'escalier no 3 (N-F-E-004), axe 9,7	Relocalisation temporaire conservant le même champ, coupure la plus courte possible	E2 ; à coordonner avec le propriétaire	D5 N-F-E-004 ; ME001(D) note D8 électricité
V12	Luminaire mural et lecteur de carte de la porte piéton nord du quai des ambulances (N-F-E-006, N-F-E-007), axe 1	Aucun préalable écrit	E2 ; la porte reste hors d'usage pendant les travaux de ce secteur (note 8 de la légende du tableau D5)	D5 N-F-E-006, N-F-E-007 ; ME001(D) notes D2, D3, D5 électricité
V13	Clavier de la porte de garage nord du quai des ambulances (N-F-E-008), axe 0,9	Travaux à exécuter quand la porte est ouverte : elle se ferme automatiquement	E2 ; période écrite : estivale — voir le conflit saisonnier signalé en bas de planche	D5 N-F-E-008 ; ME001(D) note D10 électricité
V14	Système de déshumidification, coin nord-est (N-F-P-002), axes 15 à 16	Prolongation temporaire de la sortie hors des échafaudages	E2 ; arrêt possible sauf en période estivale	D5 N-F-P-002
V15	Sortie d'arrosage extérieure encastrée, coin nord-est (N-F-P-001), axe 14,6	Verrou inverse : c'est l'architecture qui doit livrer une alcôve dans le nouveau revêtement pour absorber la différence d'épaisseur	E4 ; la plaque de finition est enlevée temporairement en plomberie	D5 N-F-P-001 ; ME-116 (même principe au coin nord-est)
V16	Trappes d'accès pour la mécanique du porte-à-faux (N-F-V-011), axe 2,8	Verrou inverse : nouvelles trappes fournies par l'entrepreneur général, dimensions et position identiques à l'existant	E4 ; sans elles, plus d'accès au ventilateur, aux purgeurs, au détecteur de fumée de gaine et au volet motorisé	D5 N-F-V-011 ; ME-121, ME-122 ; ME001(D) note D11 ventilation

Séquence type d'une façade (analyse/03-phasage.md §1.2 et §1.3) — le verrou se joue presque toujours entre E1 et E2

E1 Préparation

→

E2 Démolition de l'enveloppe

→

E3 Relevé et structure

→

E4 Enveloppe neuve

→

E5 Fenêtres

→

E6 Remise en service

→

E1 Classification PCI, cloisons et SAS, scellement des grilles, approbation de la préparation des lieux, toile sur l'échafaudage, **contournements électromécaniques avant démolition**, plan d'action pour les issues · **E2** Retrait des revêtements, persiennes entreposées, équipements muraux démontés ; fenêtres existantes maintenues ; débris évacués en fin de journée · **E3** Point d'arrêt après retrait des revêtements, relevé complet, validation des dimensions avant fabrication, renforts et réparations de béton (≥ 10 °C) · **E4** Pare-air, compartimentation, isolant, revêtement, solins, couverture des bandes de toiture démolies ; essais in situ · **E5** Retrait après achèvement des travaux par l'extérieur [lecture] ; plexiglas ou bâti isolé de novembre à avril ; thermos et finition le même jour que le retrait du plexiglas · **E6** Réinstallation des équipements, essais et préavis, séquence PCI de fin de travaux, désinfection terminale, correction des anomalies avant la phase suivante

Ce que les verrous de la façade nord révèlent

Un conflit saisonnier interne à la seule façade nord. Trois lignes du tableau se contredisent sur la saison : *N-F-V-005, unité de l'hémodialyse : « Dimanche seulement, **en dehors de la période estivale** »* *N-F-P-002, déshumidification : arrêt possible « sauf en période estivale »* *N-F-E-008, clavier de la porte de garage : « **En période estivale** »*


La même façade porte donc une intervention qui exige l'été et deux qui l'excluent. « Période estivale » n'étant définie nulle part (Z-10), la façade nord ne peut pas être traitée d'un seul tenant sans arbitrage du CISSS.

Deux verrous inverses. V15 et V16 ne sont pas des appareils qui bloquent l'architecture, mais l'architecture qui doit livrer : une alcôve dans le nouveau revêtement pour la sortie d'arrosage encastrée, et de nouvelles trappes d'accès identiques, sans lesquelles la mécanique du porte-à-faux devient inaccessible.

Ce que WSP doit encore écrire. Le tracé et la forme des conduits temporaires de l'unité d'hémodialyse, la séquence de basculement et les fenêtres d'interruption au-delà de « une journée, un conduit à la fois » (Z-29) ; la position de la prise d'air de la centrale d'air médical, placée sur l'élévation F sans qu'aucun repère ne la montre.

Sources : D2 feuille 202 (élévation F) ; D4 ME001(D) ; D5 lignes N-F-... ; analyse/03-phasage.md §1.3 ; analyse/02-contraintes.md.
Conventions : [lecture] = lu sur un plan, non écrit ; [choix] = proposition du présent cahier ; [à confirmer] = non fixé par les documents ; N-F-V-005 = ligne du tableau de coordination des équipements électromécaniques (façade, élévation, discipline, numéro) ; AR-DEV-, AR-PLN-, ME-, ST-, CI-

page 3 / 5



Feuille 002, détails 1 et 2 : les **seuls** endroits où la clôture est dessinée dans plus d'une position — zone d'ambulance (2 configurations), entrée principale (3).

Ce qui est écrit et dessiné	Où	Identifiant
Clôture de chantier neuve, 1830 mm, palissade métallique avec glissières de béton et toile anti-poussière	Légende 001/002 ; devis 01 56 00	AR-PLN-005 ; AR-DEV-189
Zone d'ambulance : deux configurations, entrée et sortie au nord puis au sud	Feuille 002, détail 1	AR-PLN-018
Entrée principale : trois configurations autour de la marquise, la troisième sans clôture sous la marquise	Feuille 002, détail 2	AR-PLN-019
Un panneau indicateur d'ambulance par phase de travaux du secteur	Note 35	AR-PLN-014
Chemin en gravier temporaire vers l'accès ambulance, terrain remis en état	Note 22 ; détail 1	AR-PLN-004
Débarcadère et case de stationnement réservés à l'entrepreneur	Notes 19 et 21	AR-PLN-002, 003
Deux accès de chantier : accès général au sud-est, accès au sud-ouest	Notes 30 et 32	AR-PLN-012
Issue extérieure et chemin d'évacuation libres, 1650 mm jusqu'à la voie publique	Note 24 ; détails 3, 4, 5	AR-PLN-006
Zone IRM : aucun entreposage métallique quand l'IRM est en service	Note 27 ; détail 5	AR-PLN-009
Accès pompier à la borne-fontaine en tout temps	Note 1	AR-PLN-001
Section de clôture plus haute près du nouvel escalier no 7	Note 15 de la 001 seulement	C-38

Ce que le devis exige par phase	Qui le produit	Identifiant
« Barrières d'accès verrouillables selon l'aménagement du site et selon les phasages » pour les camions, plus au moins une porte piétonne	Entrepreneur	AR-DEV-190
Plan de situation : emprise et dimensions de la zone à clôturer, nombre de roulottes, voies d'accès, détails d'installation de la clôture	Entrepreneur	AR-DEV-171
« Emplacements des cloisons servant à lutter contre la poussière durant chaque phase des travaux »	Entrepreneur	AR-DEV-148
Choix du type d'échafaudage tenant compte « du phasage des travaux », conçu et scellé par un ingénieur	Entrepreneur	AR-DEV-172
Déplacement des supports et structures temporaires « selon le phasage des travaux »	Entrepreneur	AR-DEV-155
Préavis de trois semaines avant tout déplacement d'une voie d'accès ou de circulation, avec nouvelle signalisation	Entrepreneur → CISSS	AR-DEV-139
Autorisation 48 h avant l'installation d'une grue ; levages planifiés avec le propriétaire et la municipalité	Entrepreneur → CISSS, ville	AR-DEV-161, 173
Emplacement, pente, largeur et tracé des voies et pistes de chantier soumis à approbation	Entrepreneur → CISSS	AR-DEV-187

L'écart central. Le devis exige des barrières et des cloisons anti-poussière « selon les phasages », et le choix de l'échafaudage doit tenir compte du phasage. Les plans, eux, ne montrent qu'**une seule clôture**, hors phase, plus deux détails d'accès locaux. Le plan de chantier par phase est donc un livrable de l'entrepreneur, pas une donnée des documents (Z-27).

Ce qui n'est dessiné nulle part, vérifié sur les feuilles 001 et 002 : implantation de clôture par phase ; zone ou emprise d'échafaudage ; position de grue et aire de levage ; aire d'entreposage ; roulotte et bureau de chantier ; conteneur à déchets, alors que le devis renvoie aux plans pour le trouver (AR-DEV-225) ; symbole de portail, alors que le devis exige des signaleurs à chaque « barrière d'accès au chantier **identifiée aux plans** » (AR-DEV-137). Aucune cote de la clôture.

Une incohérence à lever. Le devis situe le bureau de chantier « dans le stationnement étagé existant » (AR-DEV-180) ; la feuille 001 ne montre que des stationnements de surface.

Trois numérotations « phase 1/2/3 » coexistent sans lien écrit : les phases du plan clé de la feuille 010, les configurations d'accès de la feuille 002, et les phases du tableau du CISSS (niveaux) : constat C-34. La planche de zones par phase se construit une fois cette correspondance tranchée.

Planche 5 / 5 — Synthèse des quatre façades

Ce que le regroupement des appareils par façade fait apparaître, et les décisions qui commandent la suite

Les 93 lignes du tableau de coordination, réparties par façade						
Façade	Lignes	« Toute la durée des travaux »	Fenêtre nommée	Non touché (gris)	À démanteler (orange)	À valider (jaune)
Sud (A)	30	17	1 — hors période estivale	6	2	0
Ouest (B, C, E, I)	25	14	4 — nuit (3), période estivale (1)	2	0	0
Nord (F)	23	9	5 — dimanche hors été, semaine, soir, période estivale	1	0	2
Est (G, H, D)	15	7	4 — semaine hors été (2), vendredi-dimanche, dimanche	2	0	1
Total	93	47	14	11	2	3

Les six lignes qui nomment la période estivale — sur les quatre façades			
Ligne	Façade	Période écrite	Sens
S-A-V-001	Sud	« En dehors de la période estivale (Quelques jours en été) »	Contradictoire en elle-même
O-B-V-004	Ouest	« Travailler avec persienne en fonction. En période estivale »	Exige l'été
N-F-V-005	Nord	« Dimanche seulement, en dehors de la période estivale »	Exclut l'été
N-F-E-008	Nord	« En période estivale »	Exige l'été
E-G-V-003	Est	« Semaine, en dehors de la période estivale »	Exclut l'été
E-G-E-006	Est	« Semaine, en dehors de la période estivale »	Exclut l'été
Trois lignes exigent l'été, deux l'excluent, une se contredit. « Période estivale » n'est définie nulle part (Z-10) et le contrat n'ouvre que deux périodes de novembre à avril (C-14).			

Ce que l'exercice apporte au phasage

Ce que la lecture en élévation ajoute au phasage. Quarante-sept des quatre-vingt-treize lignes du tableau — la moitié — portent la mention « toute la durée des travaux » : l'appareil est simplement hors service pendant les travaux de son secteur. La note 8 de la légende du tableau le précise : *« signifie que l'équipement sera hors-fonction durant les travaux dans le secteur concerné et non durant la période complète du chantier »*. C'est donc la **taille du secteur traité d'un coup** qui détermine la durée d'indisponibilité, et non le calendrier global. Découper une façade en tronçons plus courts réduit directement l'indisponibilité de chaque porte, de chaque caméra et de chaque évacuation.

La période estivale est contestée sur les quatre façades. Six lignes la nomment : trois l'exigent, deux l'excluent, et une se contredit elle-même (« en dehors de la période estivale (quelques jours en été) », S-A-V-001). Aucun document ne définit « période estivale » (Z-10). Tant que le CISSS ne l'a pas définie, aucune façade ne peut être planifiée d'un seul tenant : c'est la décision qui commande le plus de choses dans tout le projet.

Ce que le tableau commande sur l'ordre des façades. Les seules dépendances écrites entre façades sont électromécaniques : la prise d'air médical temporaire se pose sur la façade ouest pour permettre les travaux de la façade nord (ME-065) et se réinstalle après le revêtement nord (ME-067) ; les conduits temporaires de l'hémodialyse précèdent la démolition des façades nord et ouest du niveau 200 (ME-049) ; les événements des autoclaves sont relocalisés avant le début de la façade ouest (ME-075) ; le conduit de la hotte de médecine nucléaire est modifié pour permettre la façade est (ME-118). Aucune de ces règles ne vient de l'architecture : **c'est l'électromécanique qui ordonne les façades**, ce que la vue en plan ne montrait pas.

Décisions à obtenir, par destinataire

Décision à obtenir	De qui	Ce qu'elle débloque
Définition de « période estivale »	CISSS	La planification saisonnière des quatre façades : six lignes du tableau en dépendent, dont trois qui exigent l'été et deux qui l'excluent
Sens de la ligne S-A-V-001, « en dehors de la période estivale (quelques jours en été) »	CISSS et WSP	La façade sud : la ligne se contredit elle-même
Correspondance entre les trois numérotations « phase 1/2/3 » (feuille 010, feuille 002, tableau du CISSS)	Architectes et CISSS	La planche des zones de chantier par phase, et le rattachement des configurations d'accès au phasage du bâtiment (C-34)
Tracé et forme des conduits temporaires de l'unité d'hémodialyse, séquence de basculement, fenêtres d'interruption	WSP	La façade nord entre les axes 8 et 6 — préalable écrit à la démolition (Z-29)
Position de la prise d'air de la centrale d'air médical, placée sur l'élévation F sans repère sur le dessin	WSP	L'ordre nord / ouest, qui dépend de l'emplacement de la prise temporaire (ME-065, ME-067)
Doublon de code N-F-E-006 (deux lignes consécutives portent le même numéro, page 6)	WSP	La traçabilité du tableau
Longueur des tronçons traités d'un coup sur chaque façade	Entrepreneur, avec le CISSS	La durée d'indisponibilité de chaque appareil marqué « toute la durée des travaux » : 47 lignes sur 93
Plan de situation de la zone clôturée par phase, barrières verrouillables, cloisons anti-poussière	Entrepreneur	Les zones de chantier, que les plans ne montrent que dans une seule configuration (AR-DEV-171, 190, 148)
